Maître d'Ouvrage : **Ministère de la Justice - Département immobilier de Bordeaux**
Opération : **Relogement du Conseil des Prud'Hommes de la Roche /Yon**
53 rue de Verdun 85000 La Roche/Yon

CALENDRIER PREVISIONEL CHANTIER
Dossier n° 21.55
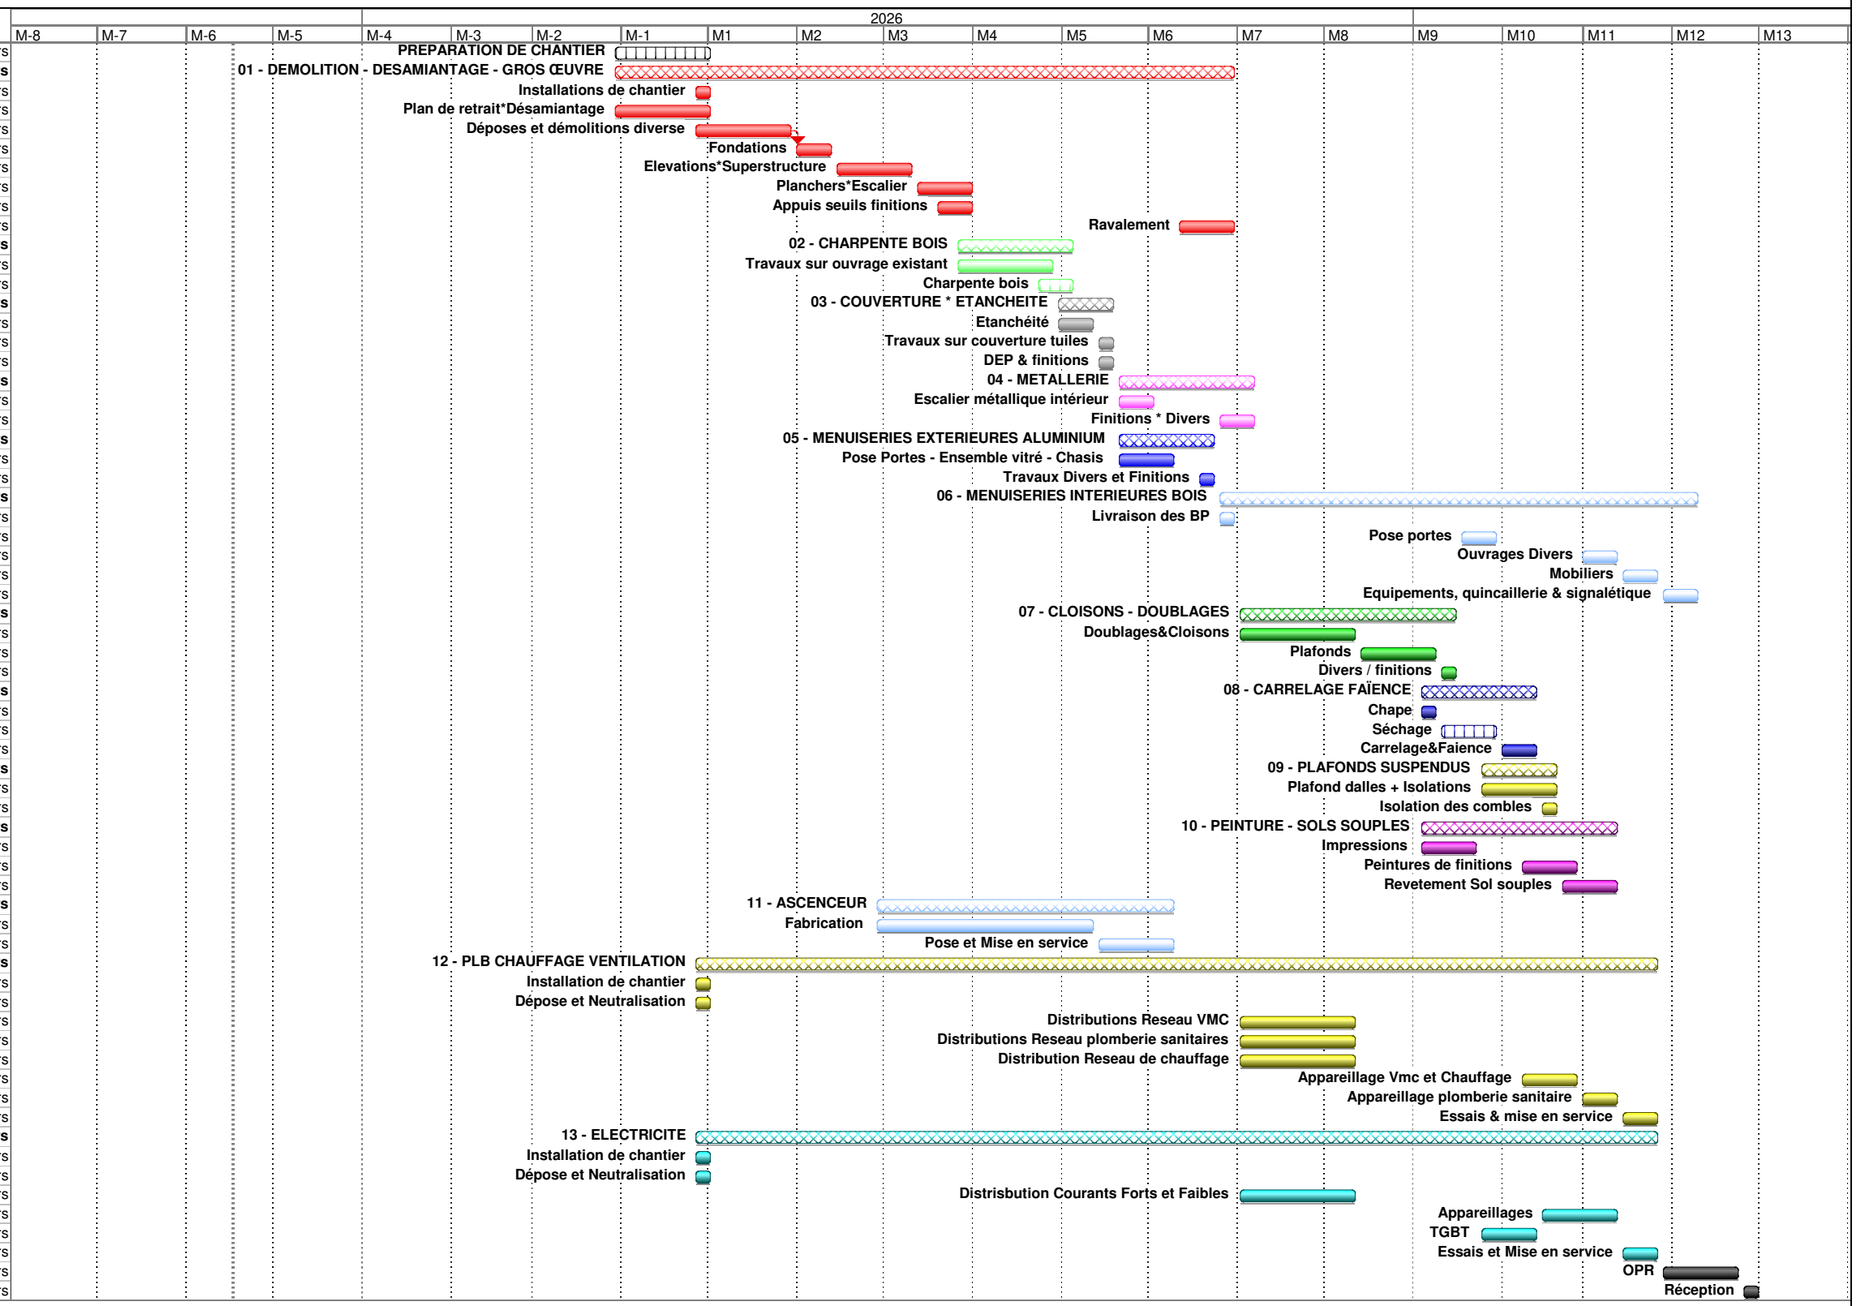
N°	Nom de la tâche	Durée
1	PREPARATION DE CHANTIER	25 jours
2	**01 - DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS ŒUVRE**	**140 jours**
3	Installations de chantier	5 jours
4	Plan de retrait*Désamiantage	25 jours
5	Déposes et démolitions diverse	25 jours
6	Fondations	10 jours
7	Elevations*Superstructure	20 jours
8	Planchers*Escalier	15 jours
9	Appuis seuils finitions	10 jours
10	Ravalement	15 jours
11	**02 - CHARPENTE BOIS**	**15 jours**
12	Travaux sur ouvrage existant	10 jours
13	Charpente bois	10 jours
14	**03 - COUVERTURE * ETANCHEITE**	**15 jours**
15	Etanchéité	10 jours
16	Travaux sur couverture tuiles	5 jours
17	DEP & finitions	5 jours
18	**04 - METALLERIE**	**35 jours**
19	Escalier métallique intérieur	10 jours
20	Finitions * Divers	10 jours
21	**05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM**	**25 jours**
22	Pose Portes - Ensemble vitré - Chasis	15 jours
23	Travaux Divers et Finitions	5 jours
24	**06 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS**	**110 jours**
25	Livraison des BP	5 jours
26	Pose portes	10 jours
27	Ouvrages Divers	10 jours
28	Mobiliers	10 jours
29	Equipements, quincaillerie & signalétique	10 jours
30	**07 - CLOISONS - DOUBLAGES**	**45 jours**
31	Doublages&Cloisons	30 jours
32	Plafonds	10 jours
33	Divers / finitions	5 jours
34	**08 - CARRELAGE FAÏENCE**	**30 jours**
35	Chape	5 jours
36	Séchage	15 jours
37	Carrelage&Faience	10 jours
38	**09 - PLAFONDS SUSPENDUS**	**20 jours**
39	Plafond dalles + Isolations	20 jours
40	Isolation des combles	5 jours
41	**10 - PEINTURE - SOLS SOUPLES**	**50 jours**
42	Impressions	15 jours
43	Peintures de finitions	15 jours
44	Revetement Sol souples	15 jours
45	**11 - ASCENCEUR**	**60 jours**
46	Fabrication	40 jours
47	Pose et Mise en service	20 jours
48	**12 - PLB CHAUFFAGE VENTILATION**	**215 jours**
49	Installation de chantier	5 jours
50	Dépose et Neutralisation	5 jours
51	Distributions Reseau VMC	30 jours
52	Distributions Reseau plomberie sanitaires	30 jours
53	Distribution Reseau de chauffage	30 jours
54	Appareillage Vmc et Chauffage	15 jours
55	Appareillage plomberie sanitaire	10 jours
56	Essais & mise en service	10 jours
57	**13 - ELECTRICITE**	**215 jours**
58	Installation de chantier	5 jours
59	Dépose et Neutralisation	5 jours
60	Distrisbution Courants Forts et Faibles	30 jours
61	Appareillages	20 jours
62	TGBT	15 jours
63	Essais et Mise en service	10 jours
64	OPR	20 jours
65	Réception	5 jours
