Réaménagement du BRIA et déménagement salle SAR :

Calendrier prévisionnel de l’opération :
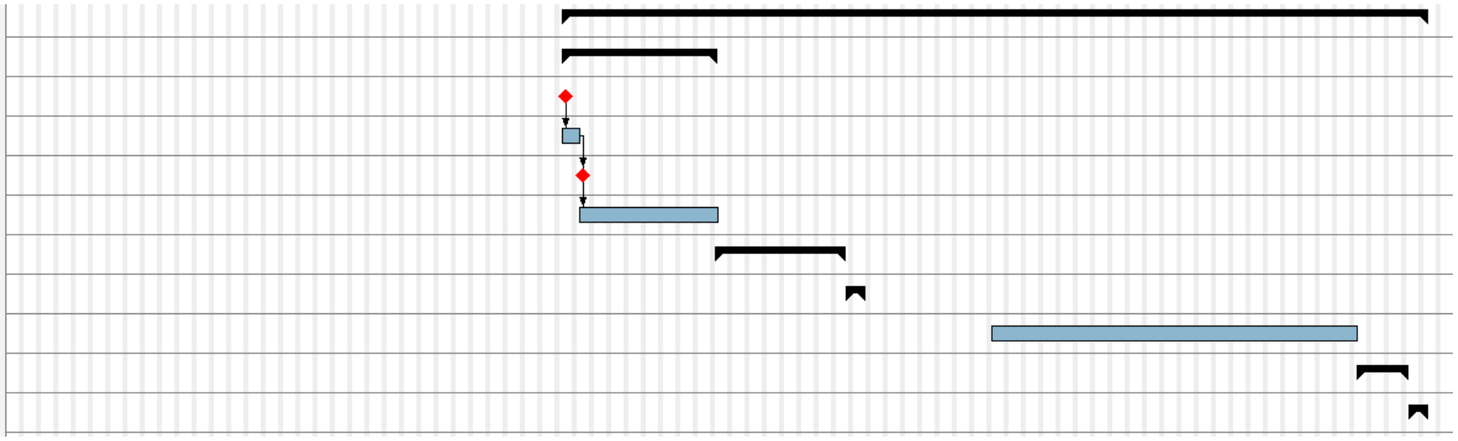
Travaux	14/07/2026	29/06/2027	251
Préparation chantier	14/07/2026	14/09/2026	45
OS 1 Démarrage période préparation	14/07/2026	14/07/2026	0
Plans EXE	14/07/2026	20/07/2026	5
Validation Plan EXE	21/07/2026	21/07/2026	0
Commandes	21/07/2026	14/09/2026	40
Phase 1 : Travaux avant opération meubles DTI	14/09/2026	05/11/2026	39
Phase Réception Partielle phase 1	06/11/2026	13/11/2026	6
Travaux DTI : Meubles techniques	04/01/2027	31/05/2027	106
Phase 2 : Travaux après opération Meubles DTI	01/06/2027	21/06/2027	15
Phase réception Phase 2	22/06/2027	29/06/2027	6
