MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA - DGA SAINT JEAN D'ILLAC

PHASE : DCE
Indice : V0

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		Période de préparation de chantier	60 jours	Lun 16/11/26	Ven 05/02/27
2					
3		Approvisionnement Cellules HTA	24 semaines	Lun 08/02/27	Ven 23/07/27
4		Approvisionnement PDL préfabriqué	22 semaines	Lun 08/02/27	Ven 09/07/27
5		Approvisionnement Générateur Homopolaire	15 semaines	Lun 08/02/27	Ven 21/05/27
6		Approvisionnement Self	15 semaines	Lun 08/02/27	Ven 21/05/27
7		Recette usine	15 jours	Lun 12/07/27	Ven 30/07/27
8					
9		Travaux continuité de service - GE provisoires	20 jours	Lun 26/07/27	Ven 20/08/27
10		Installations de chantier	5 jours	Lun 16/08/27	Ven 20/08/27
11					
12		Travaux de VRD	10 jours	Lun 26/07/27	Ven 06/08/27
13		Travaux de Génie Civil: dalle pour PDL Préfabriqué, etc	10 jours	Lun 09/08/27	Ven 20/08/27
14					
15		Travaux préparatoires ENEDIS - A DEFINIR	1 jour?	Lun 16/11/26	Lun 16/11/26
16					
17		Liaison HTA PDL - EPL4	5 jours	Lun 23/08/27	Ven 27/08/27
18		Installation Poste de Livraison HTA PDL neuf	10 jours	Lun 23/08/27	Ven 03/09/27
19		Raccordement Poste de Livraison HTA PDL neuf	5 jours	Lun 30/08/27	Ven 03/09/27
20		Dépose Poste de Livraison HTA PDL existant	5 jours	Lun 06/09/27	Ven 10/09/27
21					
22		Dépose Poste de Transformation HTA EPL4 existant	5 jours	Lun 13/09/27	Ven 17/09/27
23		Installation Poste de Transformation HTA EPL4 neuf	10 jours	Lun 13/09/27	Ven 24/09/27
24		Raccordement Poste de Transformation HTA EPL4 neuf	5 jours	Lun 20/09/27	Ven 24/09/27
25					
26		Dépose Self existante	5 jours	Lun 27/09/27	Ven 01/10/27
27		Installation Self neuve	5 jours	Lun 27/09/27	Ven 01/10/27
28		Raccordement Self neuve	5 jours	Lun 27/09/27	Ven 01/10/27
29					
30		Dépose Générateur Homopolaire existant	5 jours	Lun 27/09/27	Ven 01/10/27
31		Installation Générateur Homopolaire neuf	5 jours	Lun 27/09/27	Ven 01/10/27
32		Raccordement Générateur Homopolaire neuf	5 jours	Lun 27/09/27	Ven 01/10/27
33					
34		Recâblage partie BT	15 jours	Lun 04/10/27	Ven 22/10/27
35					
36		Essais et mise en Service de l'installation	5 jours	Lun 25/10/27	Ven 29/10/27
37					
38		COUPURE ELECTRIQUE	20 jours	Lun 23/08/27	Ven 17/09/27

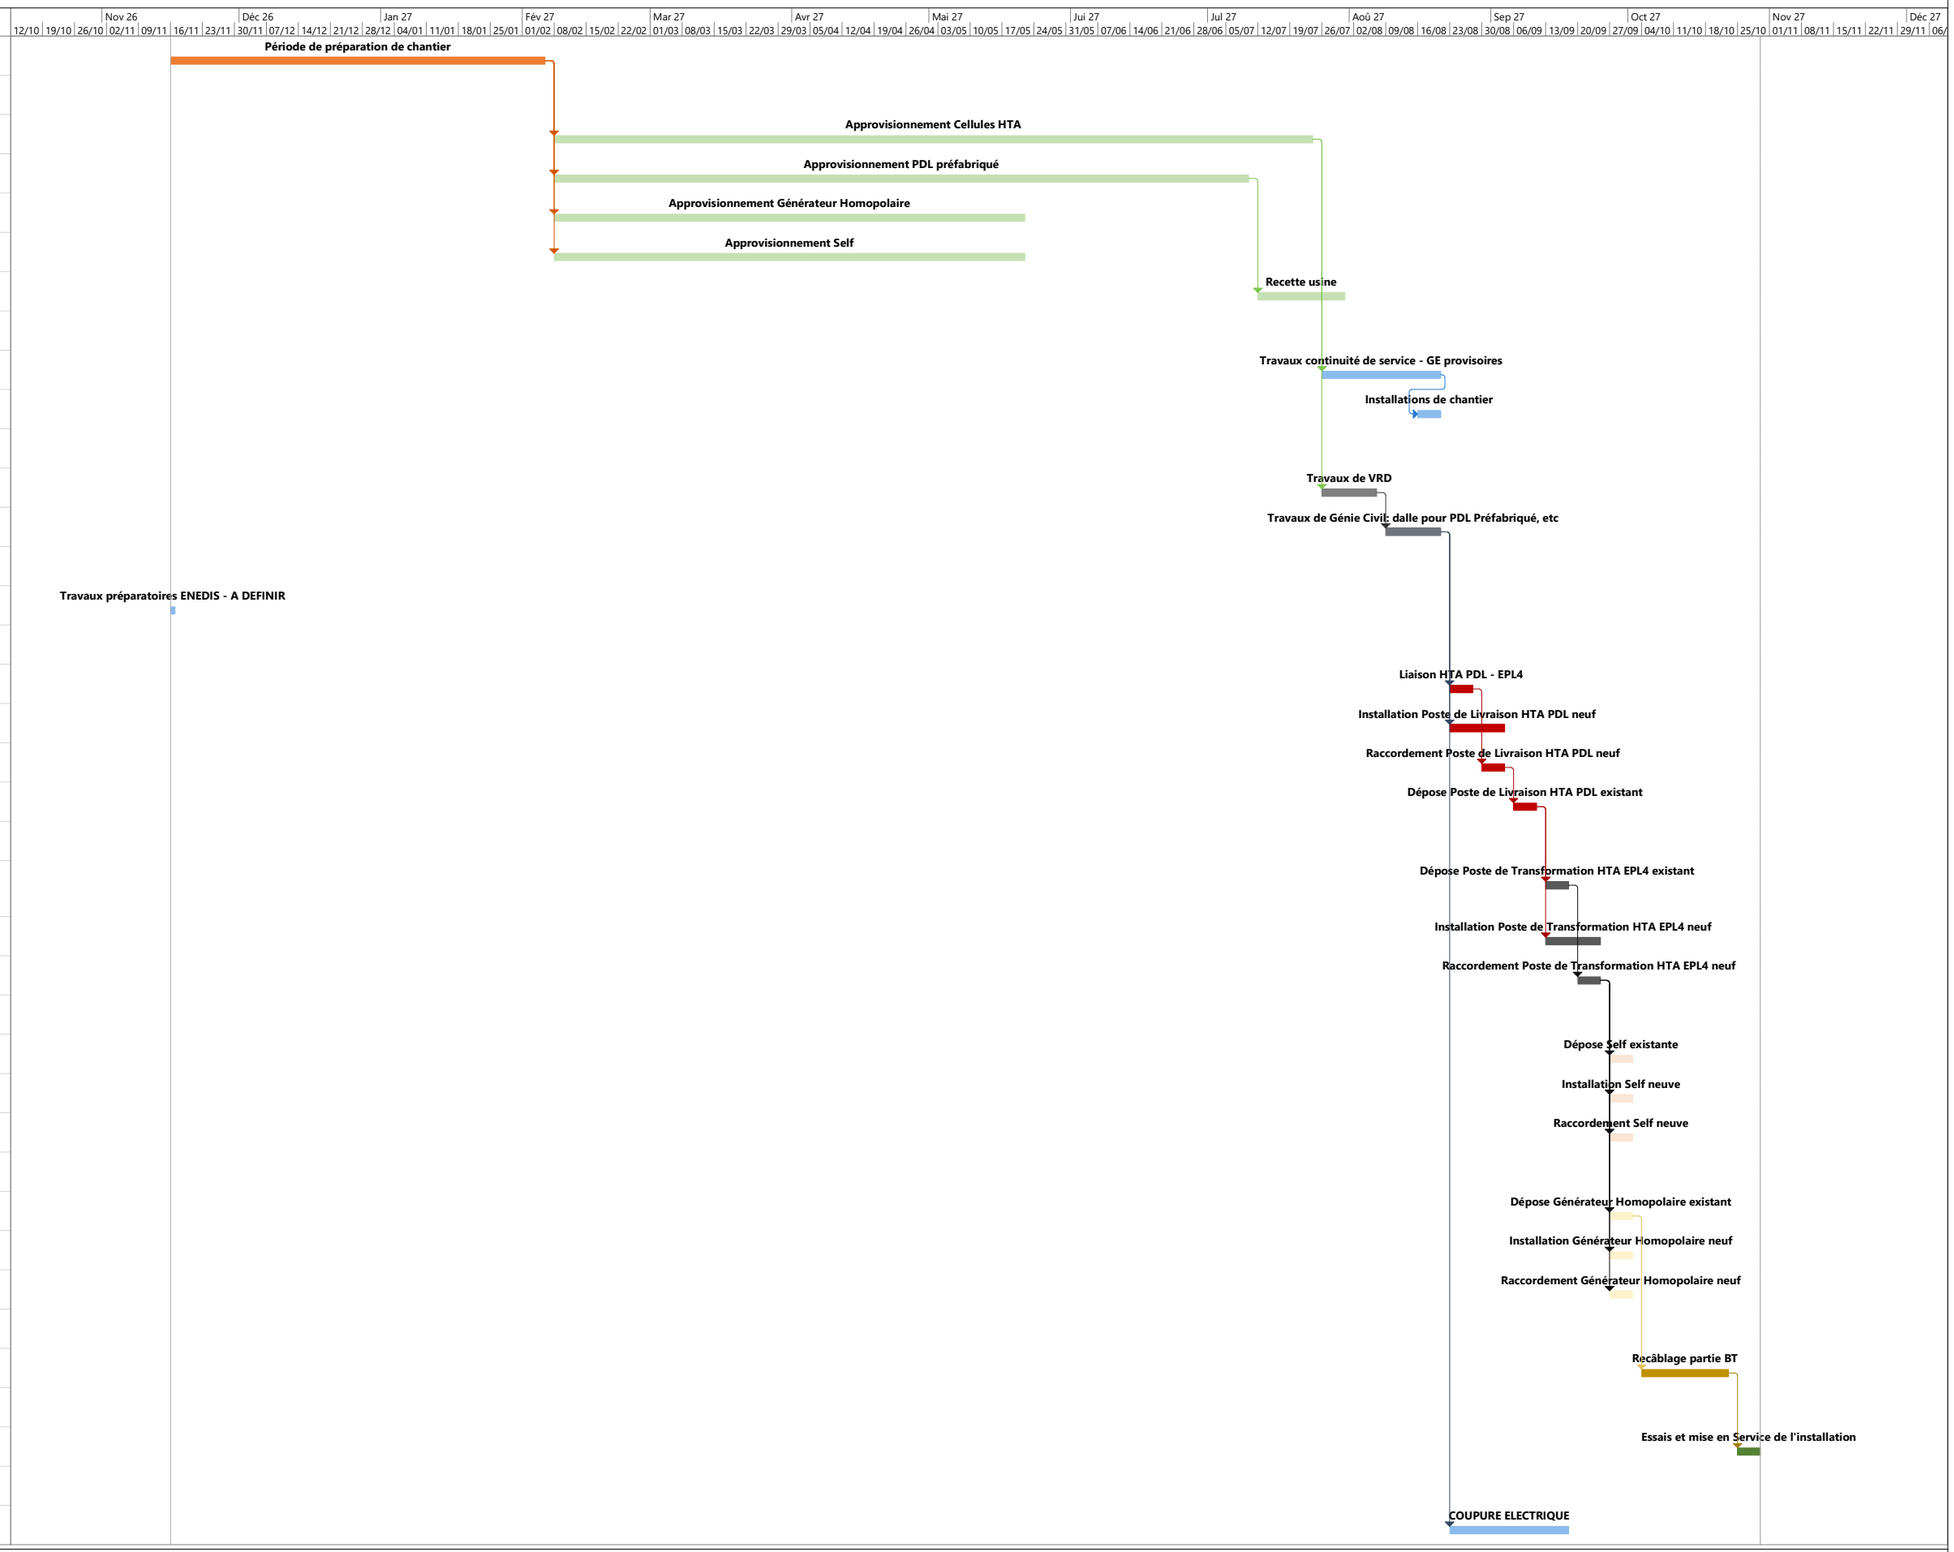

Projet : ST JEAN D'ILLAC - DGA
Date : Jeu 28/05/26

Tâche | Fractionnement | Jalon | Récapitulative | Récapitulatif du projet | Tâche inactive | Jalon inactif | Récapitulatif inactif | Tâche manuelle | Durée uniquement | Report récapitulatif manuel | Récapitulatif manuel | Début uniquement | Fin uniquement | Tâches externes | Jalons externes | Échéance | Avancement | Progression manuelle
