MARCHE 2026-2

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE
SIEGE CPAM DE L'ARTOIS
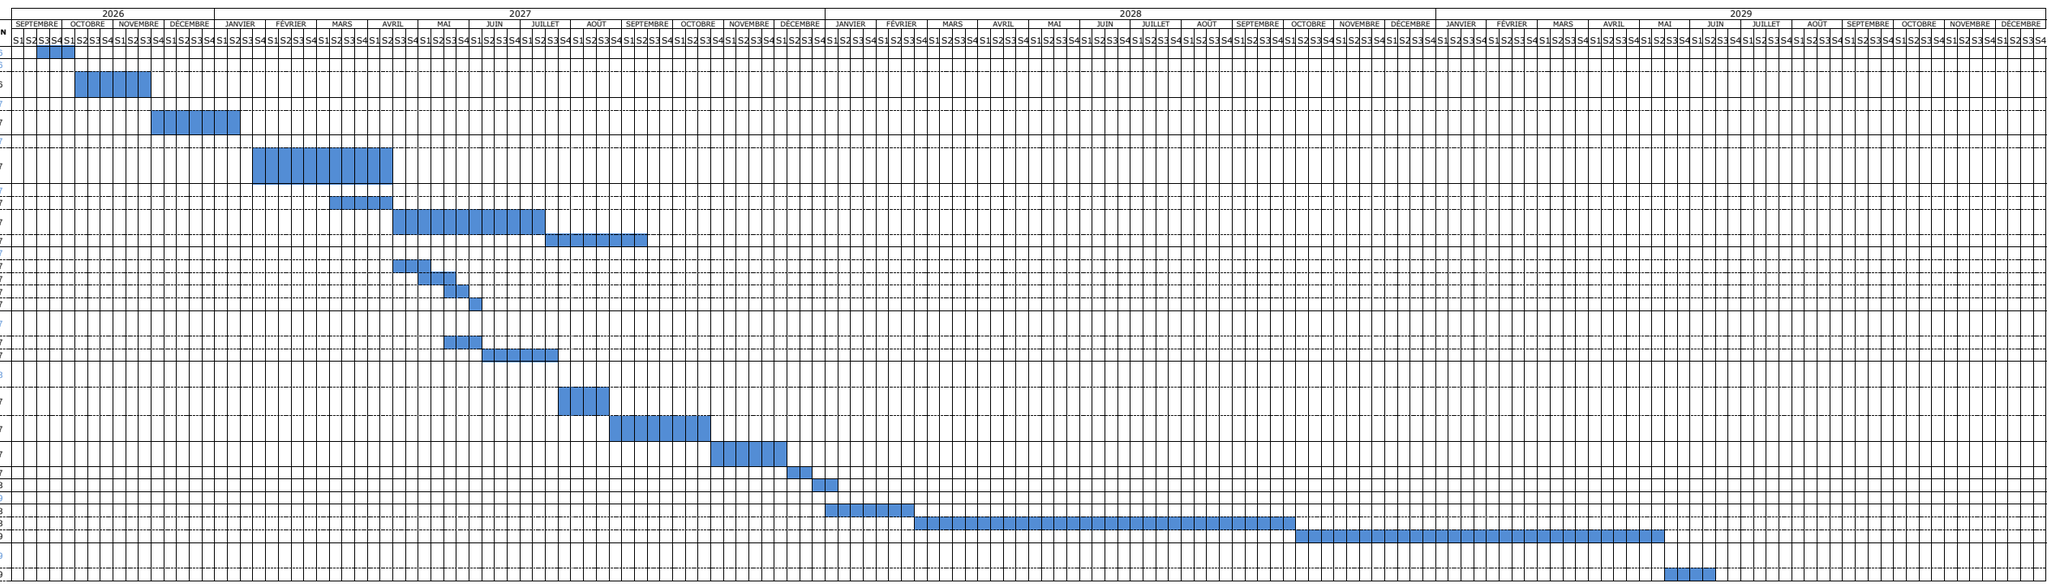
ETAPE	TACHES	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
1	**Notification marché MOE**	15/09/2026	05/10/2026
2	**Phase Diagnostic**	06/10/2026	26/11/2026
	Production par MOE/Avis UCANSS/Validation CPAM	06/10/2026	26/11/2026
3	**APS - Avant Projet Sommaire**	27/11/2026	19/01/2027
	Production par MOE/Avis CT/Avis UCANSS/Validation APS par la CPAM	27/11/2026	19/01/2027
4	**APD - Avant Projet Définitif**	20/01/2027	13/04/2027
	Production par MOE/Avis CT/Avis UCANSS/Validation APS par la CPAM/Validation par la CNAM	20/01/2027	13/04/2027
5	**Urbanisme**	17/03/2027	14/09/2027
	Production dossier par MOE	17/03/2027	13/04/2027
	Type marché à définir Instruction PC sans ERP ni ABF	14/04/2027	13/07/2027
	Recours des tiers	14/07/2027	14/09/2027
6	**PRO - Projet**	14/04/2027	04/06/2027
	Production PRO	14/04/2027	04/05/2027
	RICT par CT et PGC par SPS	05/05/2027	25/05/2027
	Avis UCANSS	12/05/2027	01/06/2027
	Validation PRO par CPAM	02/06/2027	04/06/2027
7	**DCE - Dossier Consultation Entreprises**	17/05/2027	23/07/2027
	Rédaction DCE par CPAM	17/05/2027	04/06/2027
	Avis CCMOSS	07/06/2027	23/07/2027
8	**ACT - Assistance passation Contrats de Travaux**	26/07/2027	07/01/2028
	Publication par CPAM + délais de remise des offres	26/07/2027	20/08/2027
	Ouverture des offres + vérification administrative	23/08/2027	22/10/2027
	Analyse et recalage des offres par la MOE	25/10/2027	10/12/2027
	Avis de l'UCANSS	13/12/2027	24/12/2027
	Notification des marchés par la CPAM	27/12/2027	07/01/2028
9	**EXE DET et OPC**	10/01/2028	18/05/2029
	Préparation chantier	10/01/2028	25/02/2028
	Chantier tranche ferme	28/02/2028	06/10/2028
	Chantier tranche conditionnelle	07/10/2028	18/05/2029
10	**AOR -Assistance aux Opérations de réception**	21/05/2029	15/06/2029
	Réception	21/05/2029	15/06/2029
