
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE	293 jours	Lun 17/08/26	Mer 29/09/27
6	CHANTIER	218 jours	Lun 09/11/26	Mer 08/09/27
7	PHASE PREPARATOIRE	43 jours	Lun 09/11/26	Mer 06/01/27
9	PHASE 01	80 jours	Jeu 07/01/27	Mer 28/04/27
10	EXTERIEURS	50 jours	Jeu 07/01/27	Mer 17/03/27
15	LOT 09 - ASC	10 jours	Jeu 04/03/27	Mer 17/03/27
30	PHASE 02	55 jours	Jeu 29/04/27	Mer 14/07/27
31	EXTERIEURS	35 jours	Jeu 29/04/27	Mer 16/06/27
36	LOT 09 - ASC	5 jours	Jeu 03/06/27	Mer 09/06/27

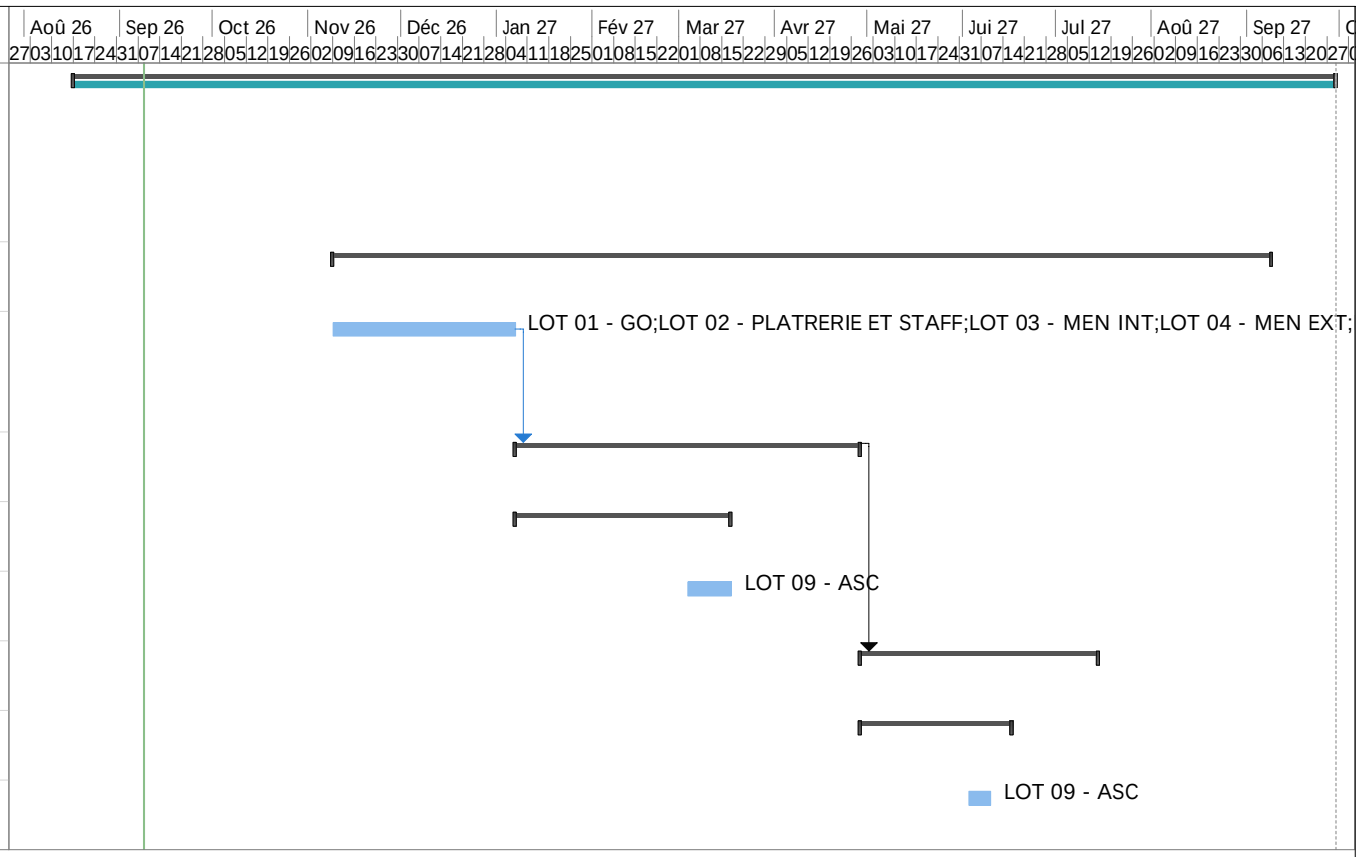

Projet : Tprox-planning-ind0
Date : Mer 09/09/26

Tâche		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Jalons externes	
Fractionnement		Jalon inactif		Récapitulatif manuel		Échéance	
Jalon		Récapitulatif inactif		Début uniquement		Avancement	
Récapitulative		Tâche manuelle		Fin uniquement		Progression manuelle	
Récapitulatif du projet		Durée uniquement		Tâches externes			
