
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE	293 jours	Lun 17/08/26	Mer 29/09/27
2	ACT	60 jours	Lun 17/08/26	Lun 09/11/26
3	Publication	35 jours	Lun 17/08/26	Lun 05/10/26
4	Analyse	15 jours	Lun 05/10/26	Lun 26/10/26
5	Négociation et notification	10 jours	Lun 26/10/26	Lun 09/11/26
6	CHANTIER	218 jours	Lun 09/11/26	Mer 08/09/27
7	PHASE PREPARATOIRE	43 jours	Lun 09/11/26	Mer 06/01/27
8	Déménagement des locaux	15 jours	Jeu 17/12/26	Mer 06/01/27
9	PHASE 01	80 jours	Jeu 07/01/27	Mer 28/04/27
10	EXTERIEURS	50 jours	Jeu 07/01/27	Mer 17/03/27
11	LOT 01 - DEMO/GO	40 jours	Jeu 07/01/27	Mer 03/03/27
12	LOT 05 - SERURERIE	10 jours	Jeu 04/03/27	Mer 17/03/27
13	LOT 06 - PEINTURE FAIENCE, SOLS, SIGNALETIQ ACCESS	5 jours	Jeu 04/03/27	Mer 10/03/27
14	LOT 08 - ELE	10 jours	Jeu 25/02/27	Mer 10/03/27
15	LOT 09 - ASC	10 jours	Jeu 04/03/27	Mer 17/03/27
16	RDC	50 jours	Jeu 07/01/27	Mer 17/03/27
17	LOT 01 - DEMO/GO	15 jours	Jeu 07/01/27	Mer 27/01/27
18	LOT 02 - PLATRERIE & STAFF	10 jours	Lun 08/02/27	Ven 19/02/27
19	LOT 08 - ELEC |	5 jours	Jeu 11/03/27	Mer 17/03/27
20	R+1	50 jours	Jeu 28/01/27	Mer 07/04/27
21	LOT 01 - DEMO/GO	15 jours	Jeu 28/01/27	Mer 17/02/27
22	LOT 02 - PLATRERIE & STAFF	15 jours	Jeu 18/02/27	Mer 10/03/27
23	LOT 04 - MEN EXT	4 jours	Jeu 04/03/27	Mar 09/03/27
24	LOT 07 - CVC/PB | DEMO	5 jours	Jeu 04/03/27	Mer 10/03/27
25	LOT 08 - ELE	15 jours	Jeu 18/03/27	Mer 07/04/27
26	R+2	50 jours	Jeu 18/02/27	Mer 28/04/27
27	LOT 01 - DEMO/GO	10 jours	Jeu 18/02/27	Mer 03/03/27
28	LOT 04 - MEN EXT	5 jours	Mer 10/03/27	Mar 16/03/27
29	LOT 08 - ELE	15 jours	Jeu 08/04/27	Mer 28/04/27
30	PHASE 02	55 jours	Jeu 29/04/27	Mer 14/07/27
31	EXTERIEURS	35 jours	Jeu 29/04/27	Mer 16/06/27
32	LOT 01 - DEMO/GO	25 jours	Jeu 29/04/27	Mer 02/06/27
33	LOT 05 - SERURERIE	15 jours	Jeu 29/04/27	Mer 19/05/27
34	LOT 06 - PEINTURE FAIENCE, SOLS, SIGNALETIQ ACCESS	7 jours	Jeu 29/04/27	Ven 07/05/27
35	LOT 08 - ELE	15 jours	Jeu 27/05/27	Mer 16/06/27
36	LOT 09 - ASC	5 jours	Jeu 03/06/27	Mer 09/06/27
37	RDC	25 jours	Jeu 29/04/27	Mer 02/06/27
38	LOT 01 - DEMO/GO	10 jours	Jeu 29/04/27	Mer 12/05/27
39	LOT 02 - PLATRERIE & STAFF	10 jours	Jeu 29/04/27	Mer 12/05/27
40	LOT 03 - MEN INT	10 jours	Jeu 29/04/27	Mer 12/05/27
41	LOT 04 - MEN EXT	5 jours	Jeu 29/04/27	Mer 05/05/27
42	LOT 05 - SERRURERIE	5 jours	Jeu 27/05/27	Mer 02/06/27
43	LOT 06 - PEINTURE FAIENCE, SOLS, SIGNALETIQ ACCESS	10 jours	Jeu 13/05/27	Mer 26/05/27
44	LOT 08 - ELE	15 jours	Mar 04/05/27	Lun 24/05/27
45	R+1	37 jours	Jeu 29/04/27	Ven 18/06/27
46	LOT 02 - PLATRERIE & STAFF	10 jours	Jeu 29/04/27	Mer 12/05/27
47	LOT 03 - MEN INT	10 jours	Jeu 13/05/27	Mer 26/05/27
48	LOT 04 - MEN EXT	5 jours	Jeu 06/05/27	Mer 12/05/27
49	LOT 05 - SERRURERIE	5 jours	Lun 14/06/27	Ven 18/06/27
50	LOT 06 - PEINTURE FAIENCE, SOLS, SIGNALETIQ ACCESS	12 jours	Jeu 27/05/27	Ven 11/06/27
51	LOT 08 - ELE	15 jours	Mar 04/05/27	Lun 24/05/27
52	R+2	45 jours	Jeu 13/05/27	Mer 14/07/27
53	LOT 01 - DEMO/GO	5 jours	Jeu 13/05/27	Mer 19/05/27
54	LOT 02 - PLATRERIE & STAFF	15 jours	Jeu 13/05/27	Mer 02/06/27
55	LOT 03 - MEN INT	15 jours	Jeu 03/06/27	Mer 23/06/27
56	LOT 04 - MEN EXT	10 jours	Jeu 13/05/27	Mer 26/05/27
57	LOT 06 - PEINTURE FAIENCE, SOLS, SIGNALETIQ ACCESS	15 jours	Jeu 24/06/27	Mer 14/07/27
58	LOT 07 - CVC/PB	10 jours	Jeu 27/05/27	Mer 09/06/27
59	LOT 08 - ELE	10 jours	Mar 25/05/27	Lun 07/06/27
60	Toiture	5 jours	Jeu 10/06/27	Mer 16/06/27
61	LOT 01 - DEMO/GO	5 jours	Jeu 10/06/27	Mer 16/06/27
62	PHASE 03	40 jours	Jeu 15/07/27	Mer 08/09/27
63	EXTERIEURS	20 jours	Jeu 15/07/27	Mer 11/08/27
64	LOT 01 - DEMO/GO	10 jours	Jeu 15/07/27	Mer 28/07/27
65	LOT 05 - SERURERIE	10 jours	Jeu 29/07/27	Mer 11/08/27
66	LOT 06 - PEINTURE FAIENCE, SOLS, SIGNALETIQ ACCESS	10 jours	Jeu 29/07/27	Mer 11/08/27
67	LOT 08 - ELE	10 jours	Jeu 22/07/27	Mer 04/08/27
68	RDC	40 jours	Jeu 15/07/27	Mer 08/09/27
69	LOT 01 - DEMO/GO	5 jours	Jeu 15/07/27	Mer 21/07/27
70	LOT 02 - PLATRERIE & STAFF	7 jours	Lun 26/07/27	Mar 03/08/27
71	LOT 03 - MEN INT	10 jours	Jeu 22/07/27	Mer 04/08/27
72	LOT 04 - MEN EXT	7 jours	Mer 04/08/27	Jeu 12/08/27
73	LOT 05 - SERRURERIE	10 jours	Jeu 26/08/27	Mer 08/09/27
74	LOT 06 - PEINTURE FAIENCE, SOLS, SIGNALETIQ ACCESS	15 jours	Jeu 05/08/27	Mer 25/08/27
75	LOT 07 - CVC/PB	5 jours	Jeu 22/07/27	Mer 28/07/27
76	LOT 08 - ELE	8 jours	Jeu 29/07/27	Lun 09/08/27
77	OPR	15 jours	Jeu 09/09/27	Mer 29/09/27
78	Livraison	0 jour	Mer 29/09/27	Mer 29/09/27

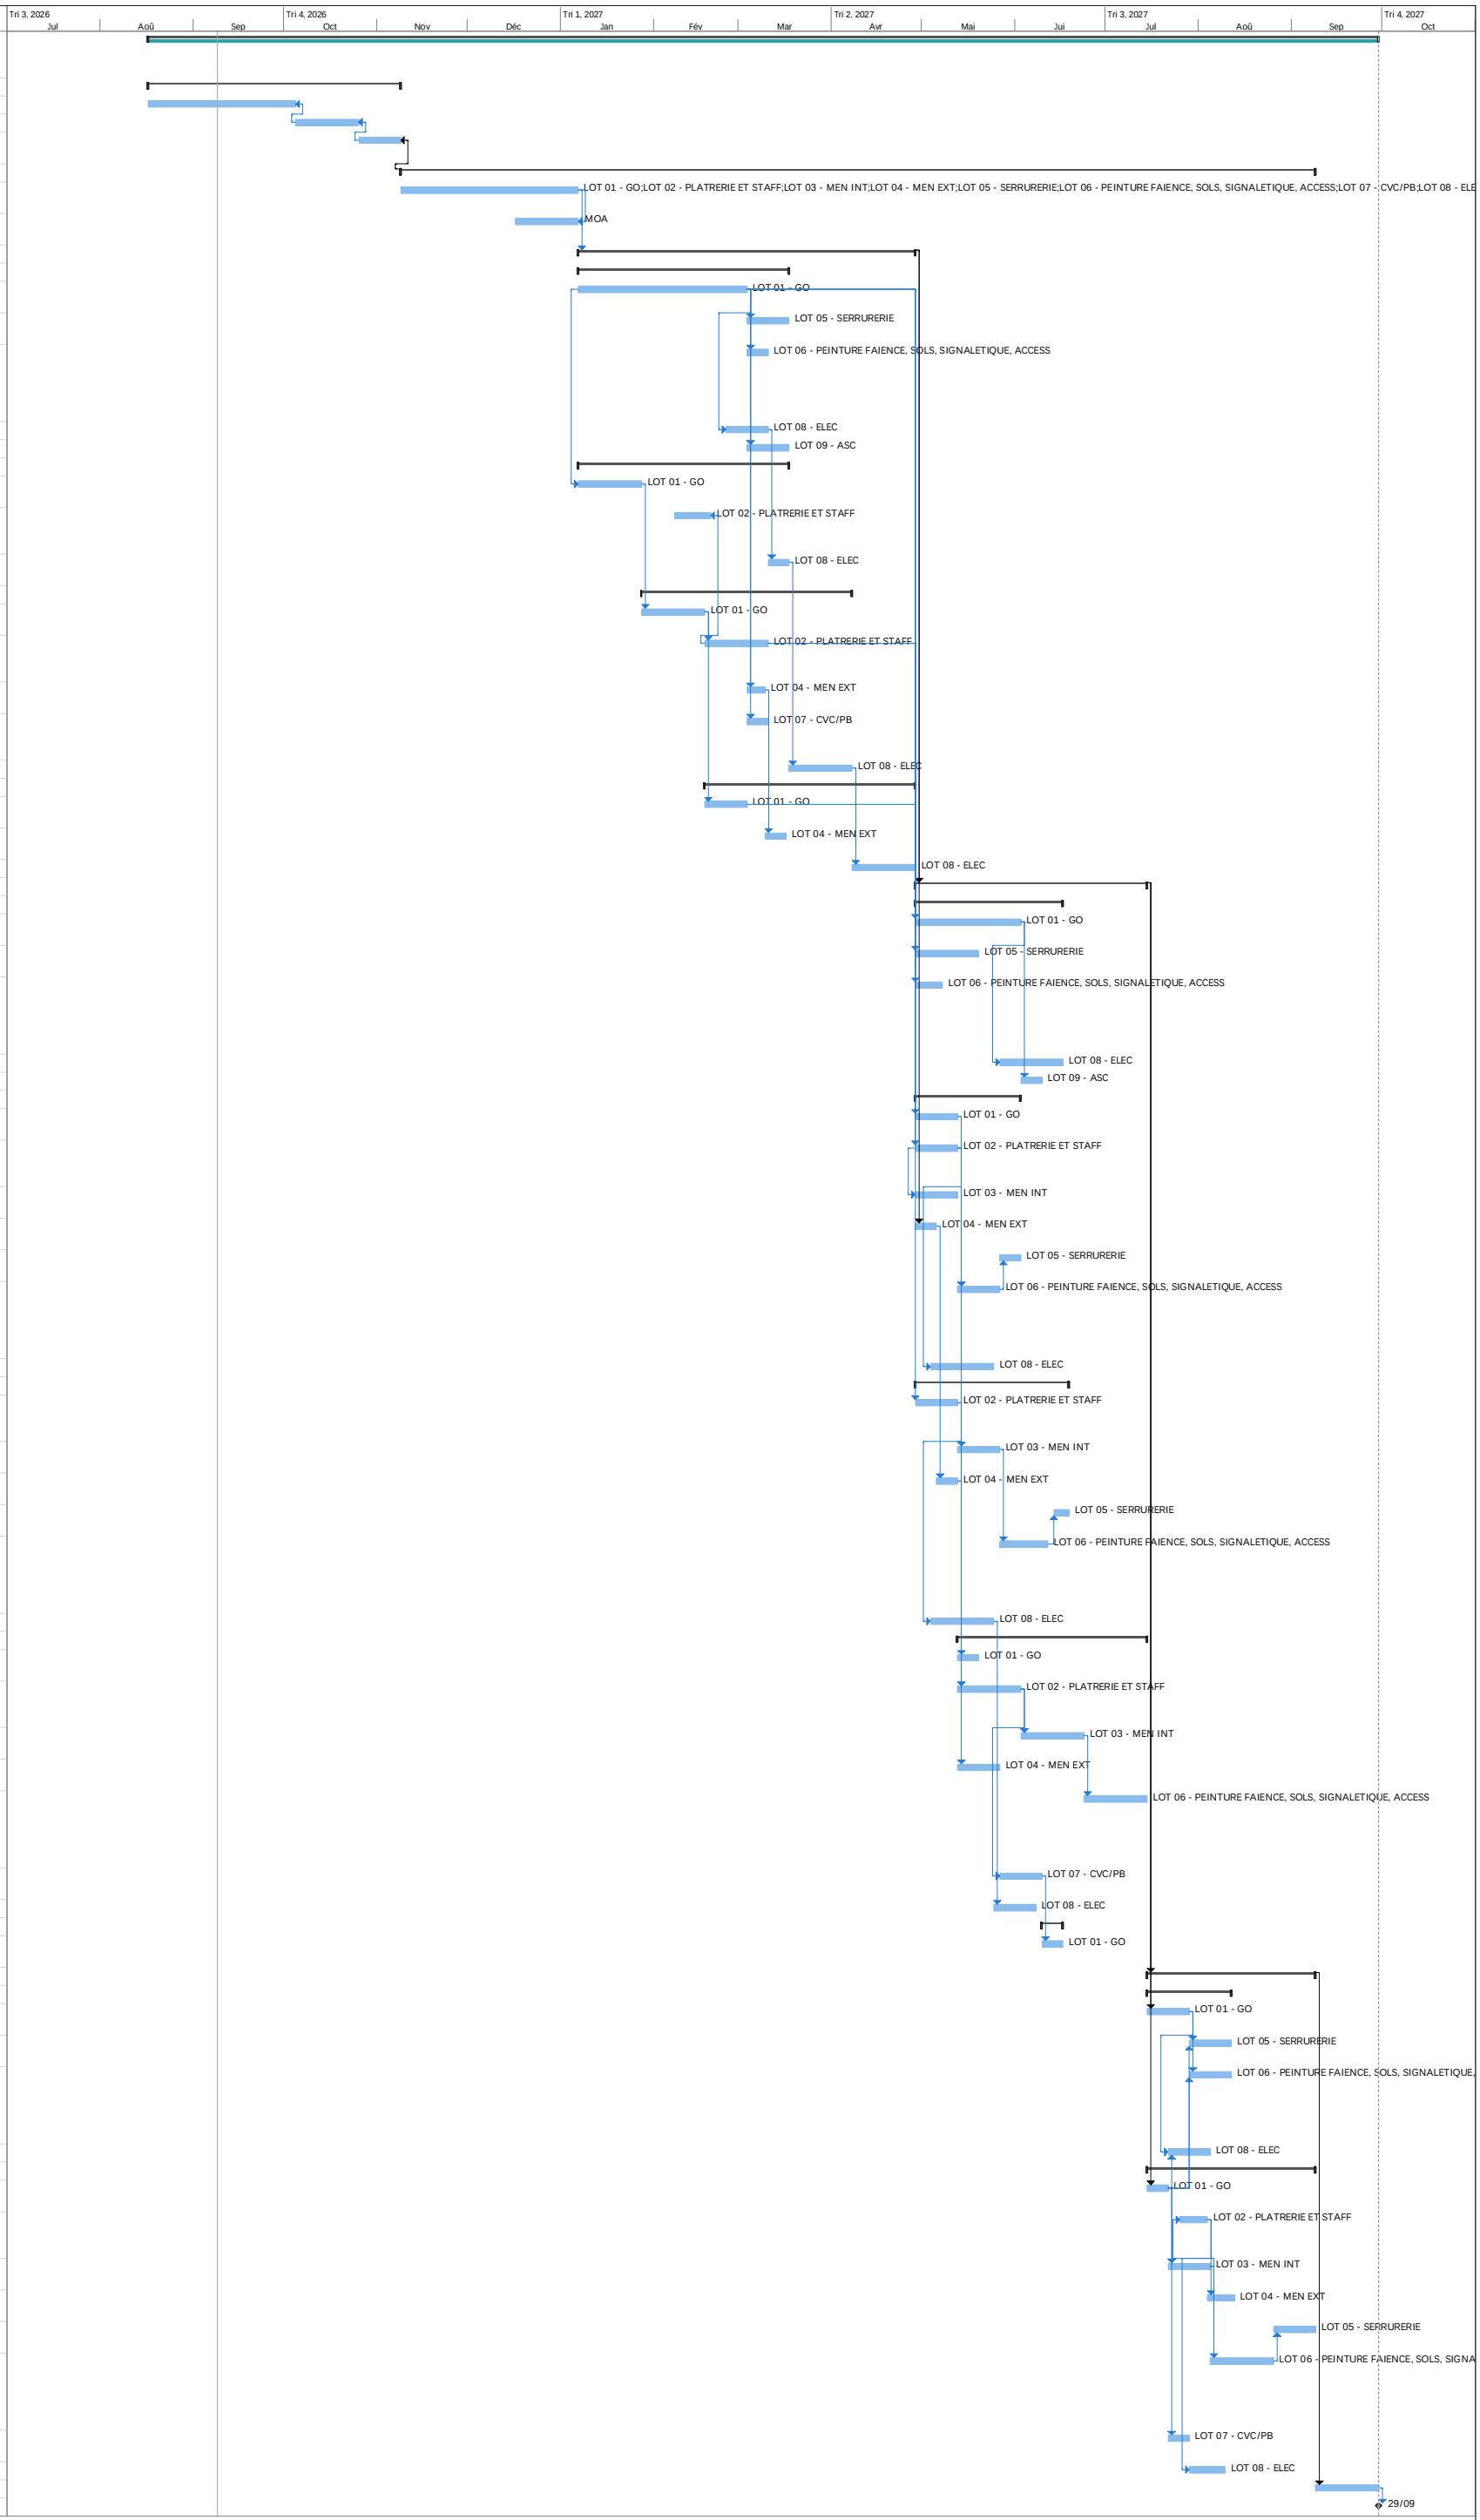

Projet : Tprox-planning-ind0
Date : Mer 09/09/26

Tâche	Récapitulative	Jalon inactif	Durée uniquement	Début uniquement	Jalons externes	Progression manuelle
Fractionnement	Récapitulatif du projet	Récapitulatif inactif	Report récapitulatif manuel	Fin uniquement	Échéance	
Jalon	Tâche inactive	Tâche manuelle	Récapitulatif manuel	Tâches externes	Avancement	
