REAMENAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL AU CDFIP D'AVRANCHES - PLANNING PREVISIONNEL
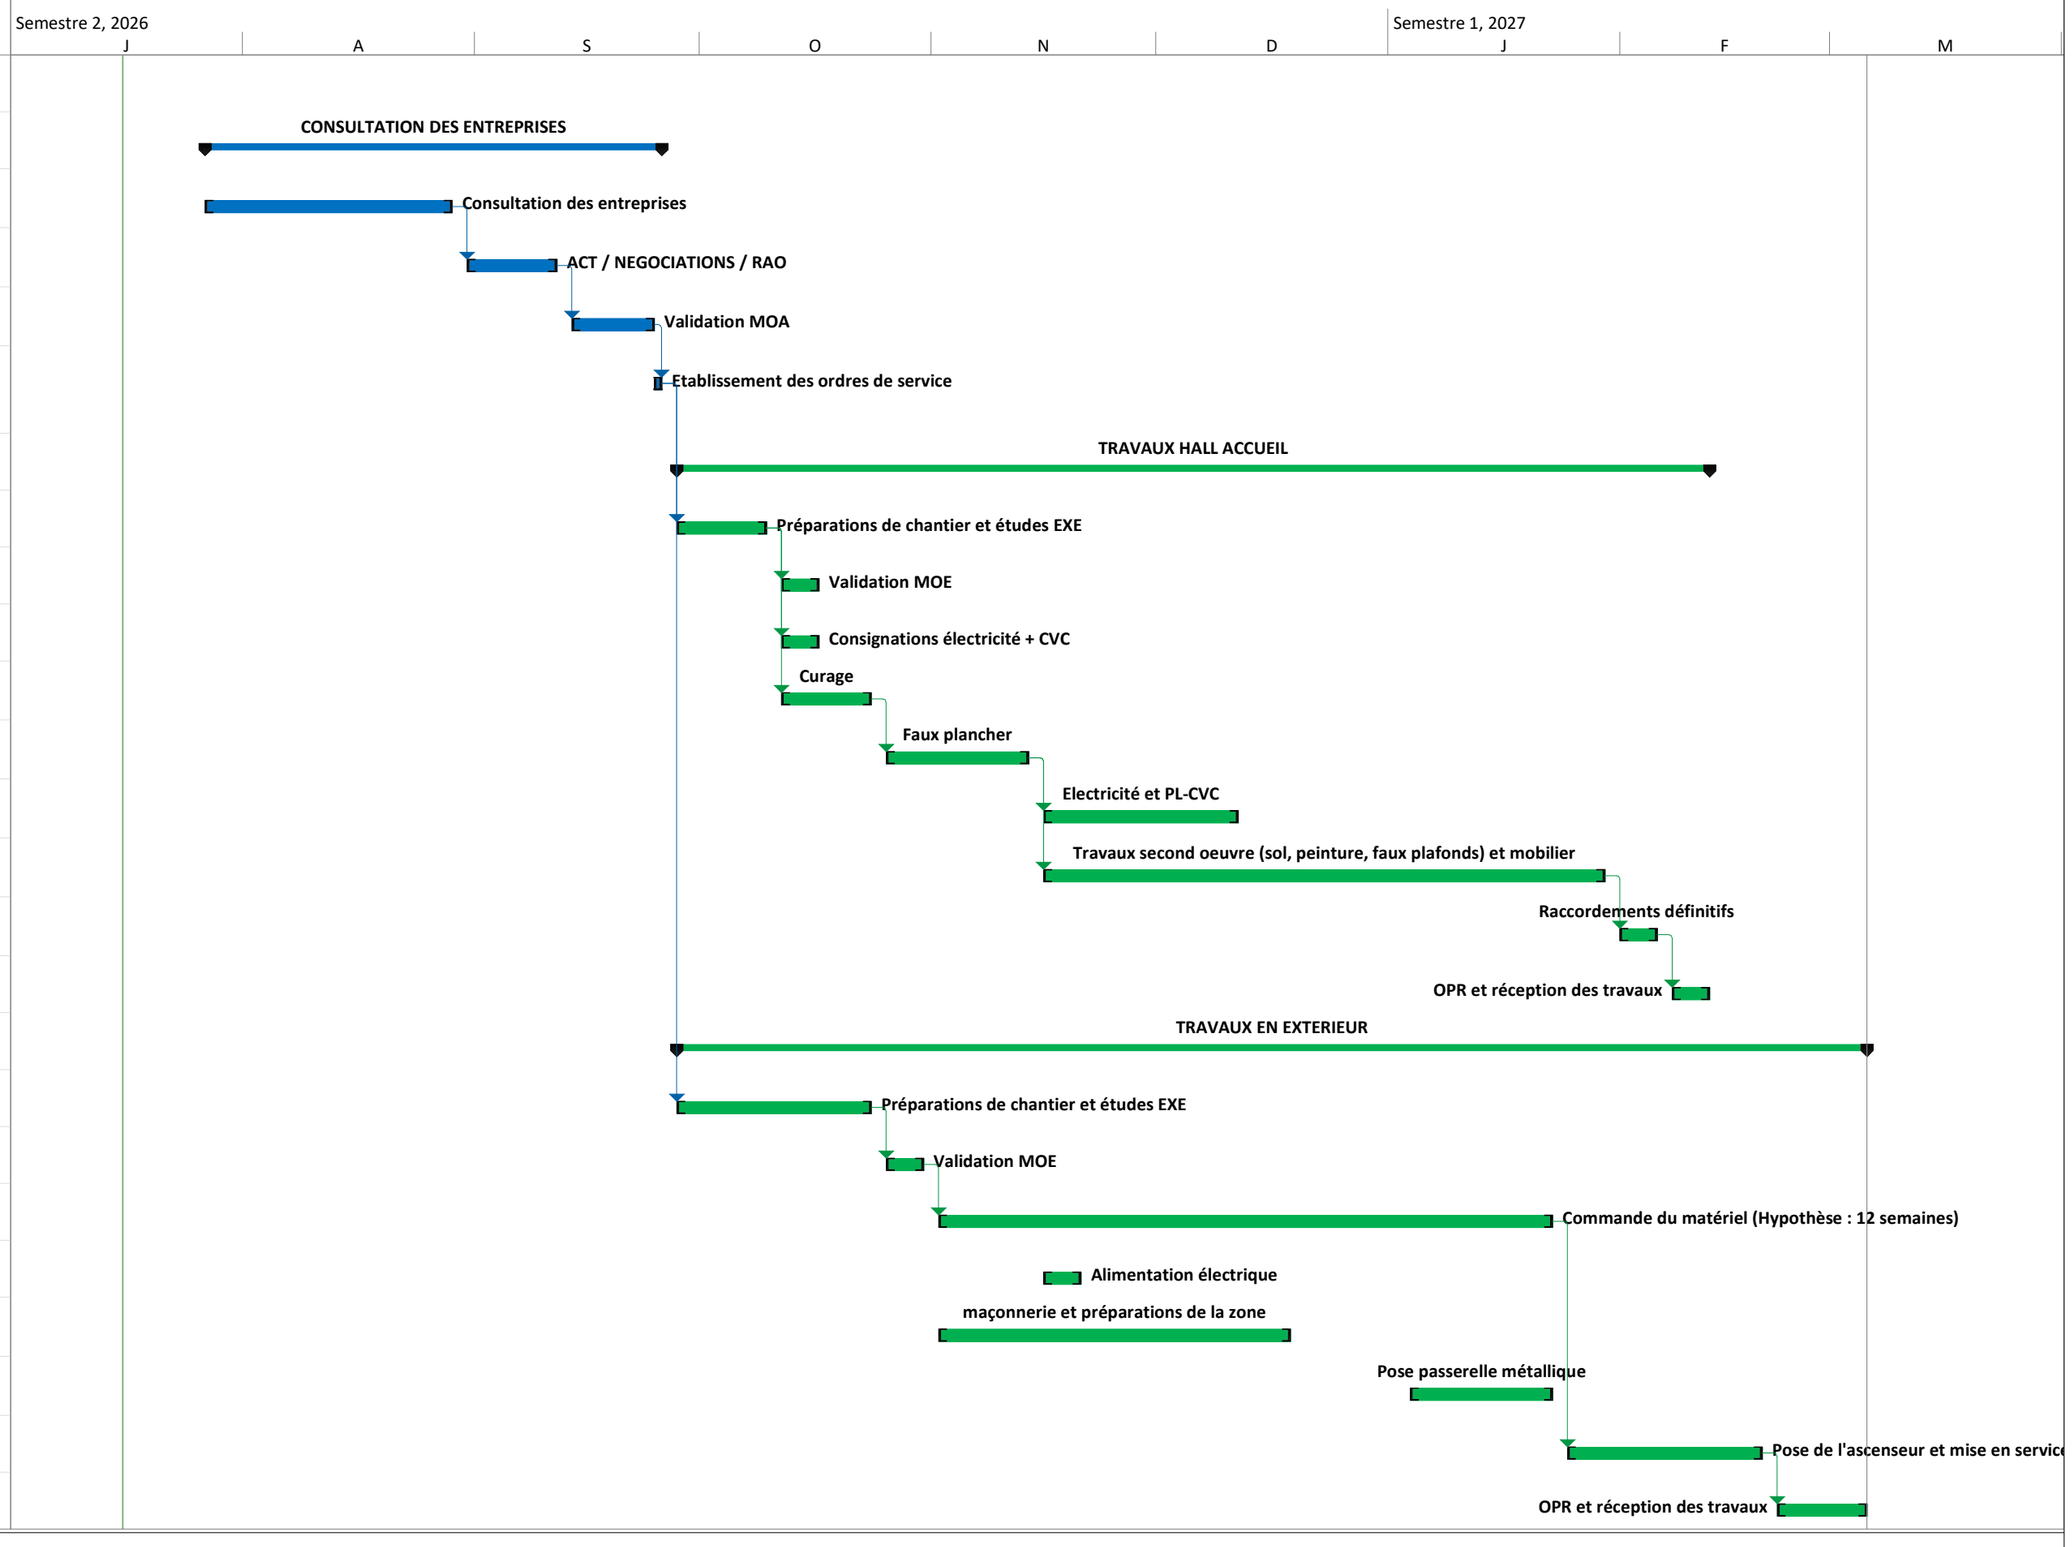
N°	Pr	Début	Fin	Durée
1				
2		**Lun 27/07/26**	**Ven 25/09/26**	**45 jrs**
3		Lun 27/07/26	Ven 28/08/26	25 jrs
4	3	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26	10 jrs
5	4	Lun 14/09/26	Jeu 24/09/26	9 jrs
6	5	Ven 25/09/26	Ven 25/09/26	1 jr
7		**Lun 28/09/26**	**Ven 12/02/27**	**100 jrs**
8	6	Lun 28/09/26	Ven 09/10/26	10 jrs
9	8	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26	5 jrs
10	8	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26	5 jrs
11	8	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26	10 jrs
12	11	Lun 26/10/26	Ven 13/11/26	15 jrs
13	12	Lun 16/11/26	Ven 11/12/26	20 jrs
14	12	Lun 16/11/26	Ven 29/01/27	55 jrs
15	14	Lun 01/02/27	Ven 05/02/27	5 jrs
16	15	Lun 08/02/27	Ven 12/02/27	5 jrs
17		**Lun 28/09/26**	**Ven 05/03/27**	**115 jrs**
18	6	Lun 28/09/26	Ven 23/10/26	20 jrs
19	18	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26	5 jrs
20	19	Lun 02/11/26	Ven 22/01/27	60 jrs
21		Lun 16/11/26	Ven 20/11/26	5 jrs
22		Lun 02/11/26	Ven 18/12/26	35 jrs
23		Lun 04/01/27	Ven 22/01/27	15 jrs
24	20	Lun 25/01/27	Ven 19/02/27	20 jrs
25	24	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27	10 jrs
