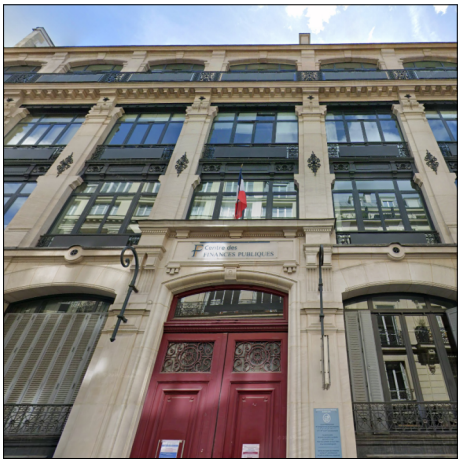


Centre des Finances Publiques - Uzès

Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques

Adresse du projet :
9, rue d'Uzès
75002 Paris

MAITRE D'OUVRAGE

Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris
Tél: + 33 01 44 50 79 49
@: valerie.berrebi@dgfip.finances.gouv.fr

FINANCES PUBLIQUES

MAITRISE D'OEUVRE

Architecte	lemoal 36 Bd de la Bastille - 75012 Paris Tél: 01 42 41 25 72 - @: benoit@lemoal.archi
Fluide, Thermique, Energie, Environnement	LBE Ingénierie 101 bis, avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil Tél: 01 69 48 89 45 - @: accueil@lbei.fr
Contrôleur Technique	Bureau Veritas construction 333 Avenue Georges Clémenceau - 92 000 Nanterre Tél: 06 03 09 19 86 - @: luc.bodjrenou@bureauveritas.com

lemoal


LBE INGENIERIE

BUREAU VERITAS

PRO

Planning prévisionnel études et phasage travaux	Echelle :	Date :	Pièce :
	Indice :	26/10/2026	01
	Format : A3		

Nom	Date de début	Date de fin
Etudes préalable - 7 sem	07/09/2026	30/11/2026
AVP - 2 sem	07/09/2026	18/09/2026
AVP - Validation par la MOA - 1,5 sem	21/09/2026	30/09/2026
PC - Dépot d'une DP, délais d'instructions et recours - 8 sem	01/10/2026	30/11/2026
PRO / DCE - 3 sem	01/10/2026	23/10/2026
PRO / DCE - Validation par la MOA - 2 sem	26/10/2026	06/11/2026
Consultation des entreprises - 10 sem	09/11/2026	11/01/2027
CONSULTATION DES ENTREPRISES - 3 sem.	09/11/2026	27/11/2026
ACT / NEGOCIATIONS / RAO - 3 sem.	30/11/2026	17/12/2026
Validation MOA + Etablissement des ordres de services - 3 sem.	18/12/2026	11/01/2027
Travaux - 8 mois	12/01/2027	29/06/2027
Préparation de chantier - 4 sem.	12/01/2027	05/02/2027
Exécution - 4 mois	08/02/2027	28/05/2027
OPR et Levée des reserves - 4 sem.	31/05/2027	25/06/2027
Remise des ouvrages	28/06/2027	29/06/2027

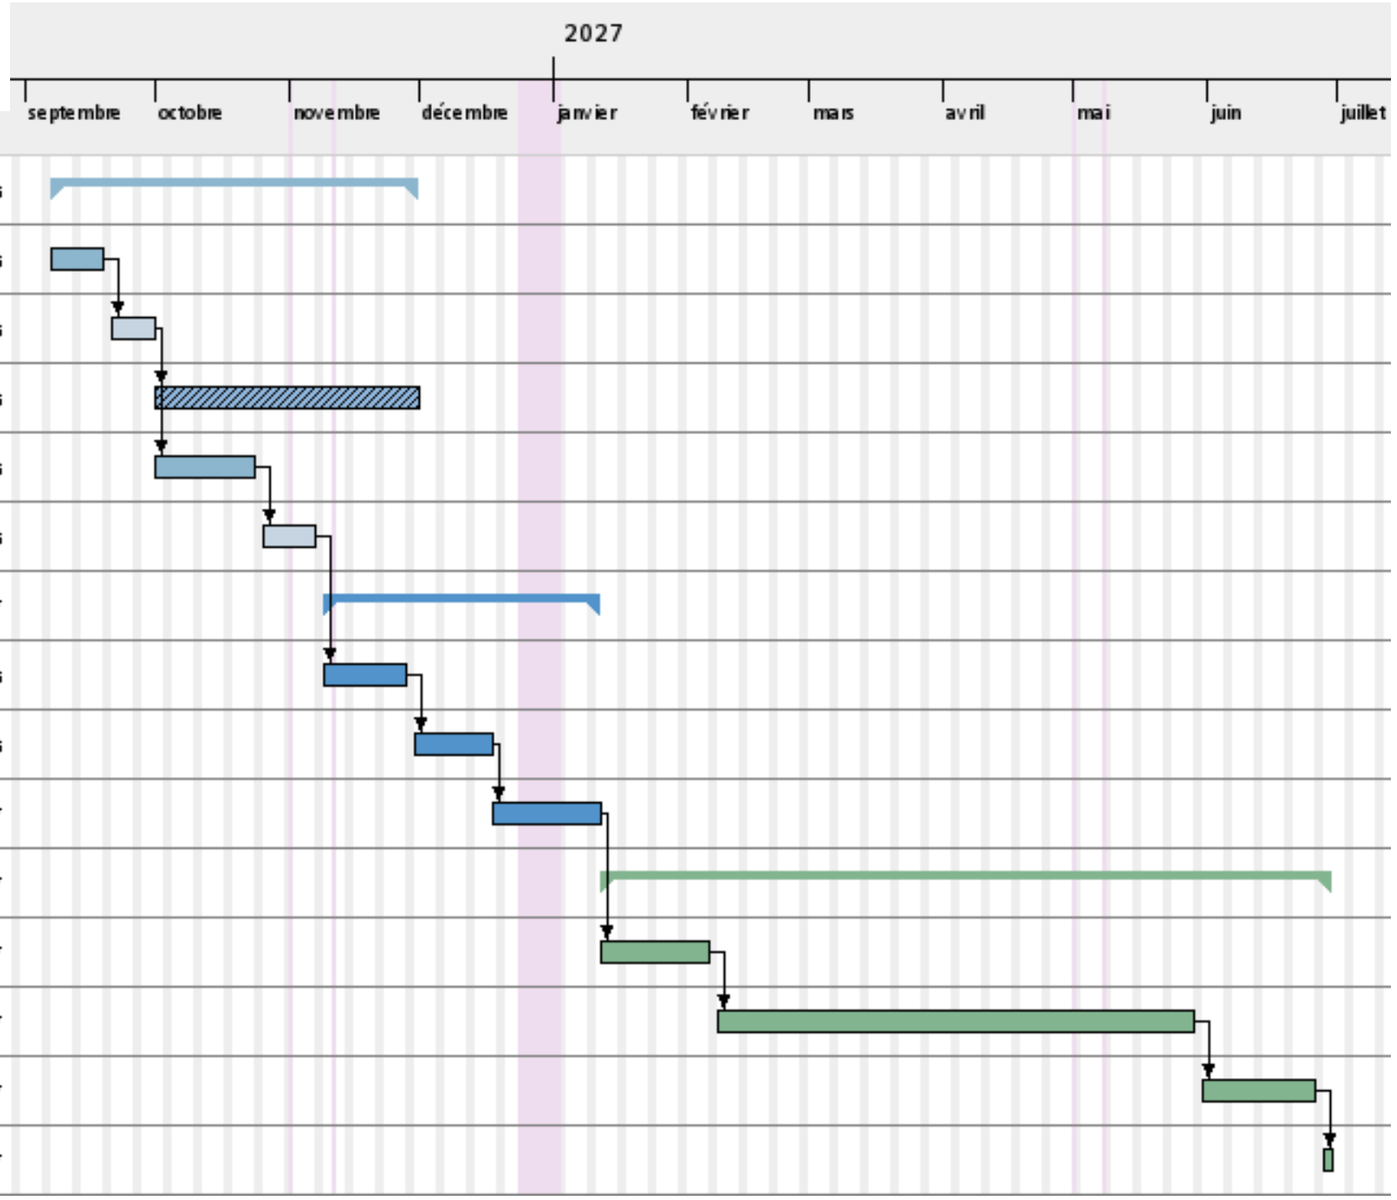

Centre des Finances Publiques - Uzès			PRO			
Maître d'Œuvre : lemoal 36 Bd. de la Bastille 75012 Paris	Maître d'Ouvrage : Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris 16 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris	Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques Adresse du projet : 9, rue d'Uzès - 75009 Paris	Planning previsionnel des travaux	Echelle : Indice : 00 Format : A3	Date : 26/10/2026	Pièce : 00
