
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

MAISON DU DON - ATLANTIS SAINT-HERBLAIN - PLANNING TRAVAUX

Le 24 08 2026

N°	LOTS		Temps de tâche
		Période de préparation	
1	DEMOLITIONS CURAGE	Dépose stores	
		Dépose clois. mod. non réutilisées	
		Dépose cloisons placo	
		Retrait revêtements de sols PVC	
2	ESPACES VERTS	Nettoyage du terrain, décapage	
		Paillage minéral	
		Plantations	
3	MENUISERIE INTERIEURES	Portes	
		Plinthes	
4	CLOISONS PLATRIERES ET MODULAIRES	Traçage cloisons sur parquet	
		Dépose soignée clois. mod. réutilisées	
		Raillage MDD	
		Raillage Zone tech.	
		Placage MDD	
		Placage Zone tech.	
		Bandes	
5	PLAFONDS SUSPENDUS	Dépose soignée dalles MDD	
		Raillage	
		Pose des dalles de plafond	
		Repose dalles MDD	
6	REVETEMENTS DE SOLS SOLS SOUPLES ET DURS	Dépose partielle parquet	
		Protections sur parquet conservé	
		Ragréage	
		Pose sols MDD	
		Pose sols Zone tech.	
		Vitrification MDD	
7	PEINTURE / REVETEMENTS DE MURS / NETTOYAGE	Préparation	
		Commande Acrovyn	
		Peinture MDD	
		Peinture Zone tech.	
		Nettoyage de réception	
8	ELECTRICITE CFO/CFA	Déconnexions/consignations	
		Dépose	
		Cablage MDD	
		Cablage Zone tech.	
		Appareillage	
		Essais	
9	CHAUFF. CLIM. VENTIL. PLOMBERIE SANITAIRES	Dépose	
		Réseaux/gaines	
		Chauffage / raffraichissement	
		Ventilation	
		Plomberie	
		Pose sanitaires	
		Essais	
10	AGENCEMENT	Approvisionnement	
		Préparation en atelier	
		Pose	
11	SIGNALETIQUE	Conception	
		Préparation	
		Pose	

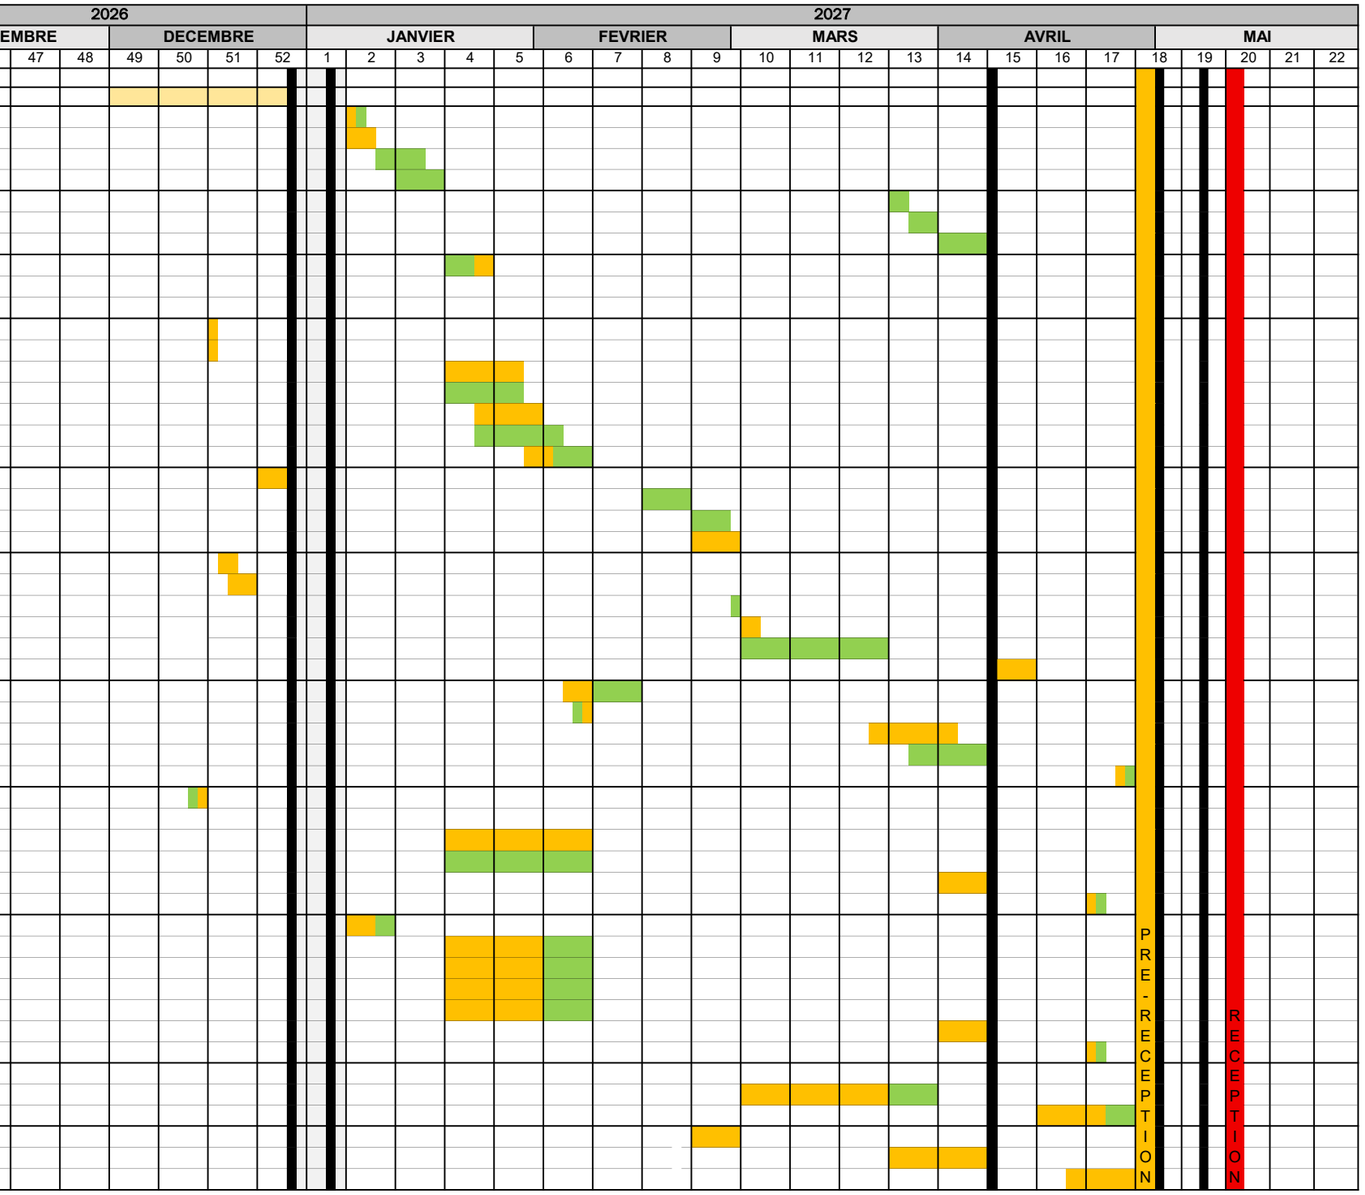

Intervention dans la zone MDD
Intervention dans la zone technique

Signature de l'entreprise
