
RENOVATION D'UN APPARTEMENT

Lot 604 - 17 rue de l'Annonciation 75016 Paris

Calendrier Prévisionnel Travaux - Phase PRO-DCE

Mon 07/09/26

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	**TRAVAUX**				
2	OS Demarrage chantier	0 days	Fri 01/01/27	Fri 01/01/27	
3	Installation de chantier	10 days	Mon 04/01/27	Fri 15/01/27	2
4	Période de préparation	20 days	Mon 04/01/27	Fri 29/01/27	2
5	Etudes	12 days	Mon 04/01/27	Tue 19/01/27	2
6	Validations MOE	8 days	Wed 20/01/27	Fri 29/01/27	5
7	Démolition - Déposes	10 days	Mon 01/02/27	Fri 12/02/27	4
8	Maçonnerie - Plâtre	10 days	Mon 15/02/27	Fri 26/02/27	7
9	Faux plafond	5 days	Mon 01/03/27	Fri 05/03/27	8
10	Plomberie - Chauffage	20 days	Mon 15/02/27	Fri 12/03/27	7
11	Eléctricité	20 days	Mon 22/02/27	Fri 19/03/27	7FS+5 days
12	Peinture - Préparation	15 days	Mon 08/03/27	Fri 26/03/27	9
13	Carrelage	10 days	Mon 22/03/27	Fri 02/04/27	11
14	Pose portes	5 days	Mon 22/02/27	Fri 26/02/27	7FS+5 days
15	Menuis. Intér. - Prise de côtes	5 days	Mon 08/03/27	Fri 12/03/27	9
16	Pose du parquet	10 days	Mon 15/03/27	Fri 26/03/27	12FS-10 days
17	Menuis. Intér. - fabrication	25 days	Mon 15/03/27	Fri 16/04/27	15
18	Menuiseries intérieures - Pose	15 days	Mon 29/03/27	Fri 16/04/27	16
19	Menuis. Ext - Prise de côtes	10 days	Mon 04/01/27	Fri 15/01/27	2
20	Menuis. Ext - fabrication	54 days	Mon 18/01/27	Thu 01/04/27	19
21	Menuis. Ext. - Pose	5 days	Fri 02/04/27	Thu 08/04/27	20
22	Peinture	15 days	Mon 05/04/27	Fri 23/04/27	18FS-10 days
23	Pose cuisine	10 days	Mon 19/04/27	Fri 30/04/27	18
24	Prise de cotes Plan de travail	1 day	Mon 26/04/27	Mon 26/04/27	23SS+5 days
25	Pose Plan de travail et crédence	1 day?	Tue 18/05/27	Tue 18/05/27	24FS+15 days
26	Finition menuiseries	5 days	Mon 12/04/27	Fri 16/04/27	22FS-10 days
27	Plomberie - pose appareils	5 days	Mon 19/04/27	Fri 23/04/27	26
28	Eléctricité - Pose appareils	5 days	Mon 19/04/27	Fri 23/04/27	26
29	Peinture - Finitions	7 days	Mon 03/05/27	Tue 11/05/27	23
30	Nettoyage	3 days	Wed 12/05/27	Fri 14/05/27	29
31	OPR	5 days	Mon 10/05/27	Fri 14/05/27	32FS-5 days
32	Réception	0 days	Fri 14/05/27	Fri 14/05/27	29;30
33	Levée de réserves	10 days	Mon 17/05/27	Fri 28/05/27	31
34	Fin chantier	0 days	Fri 28/05/27	Fri 28/05/27	33

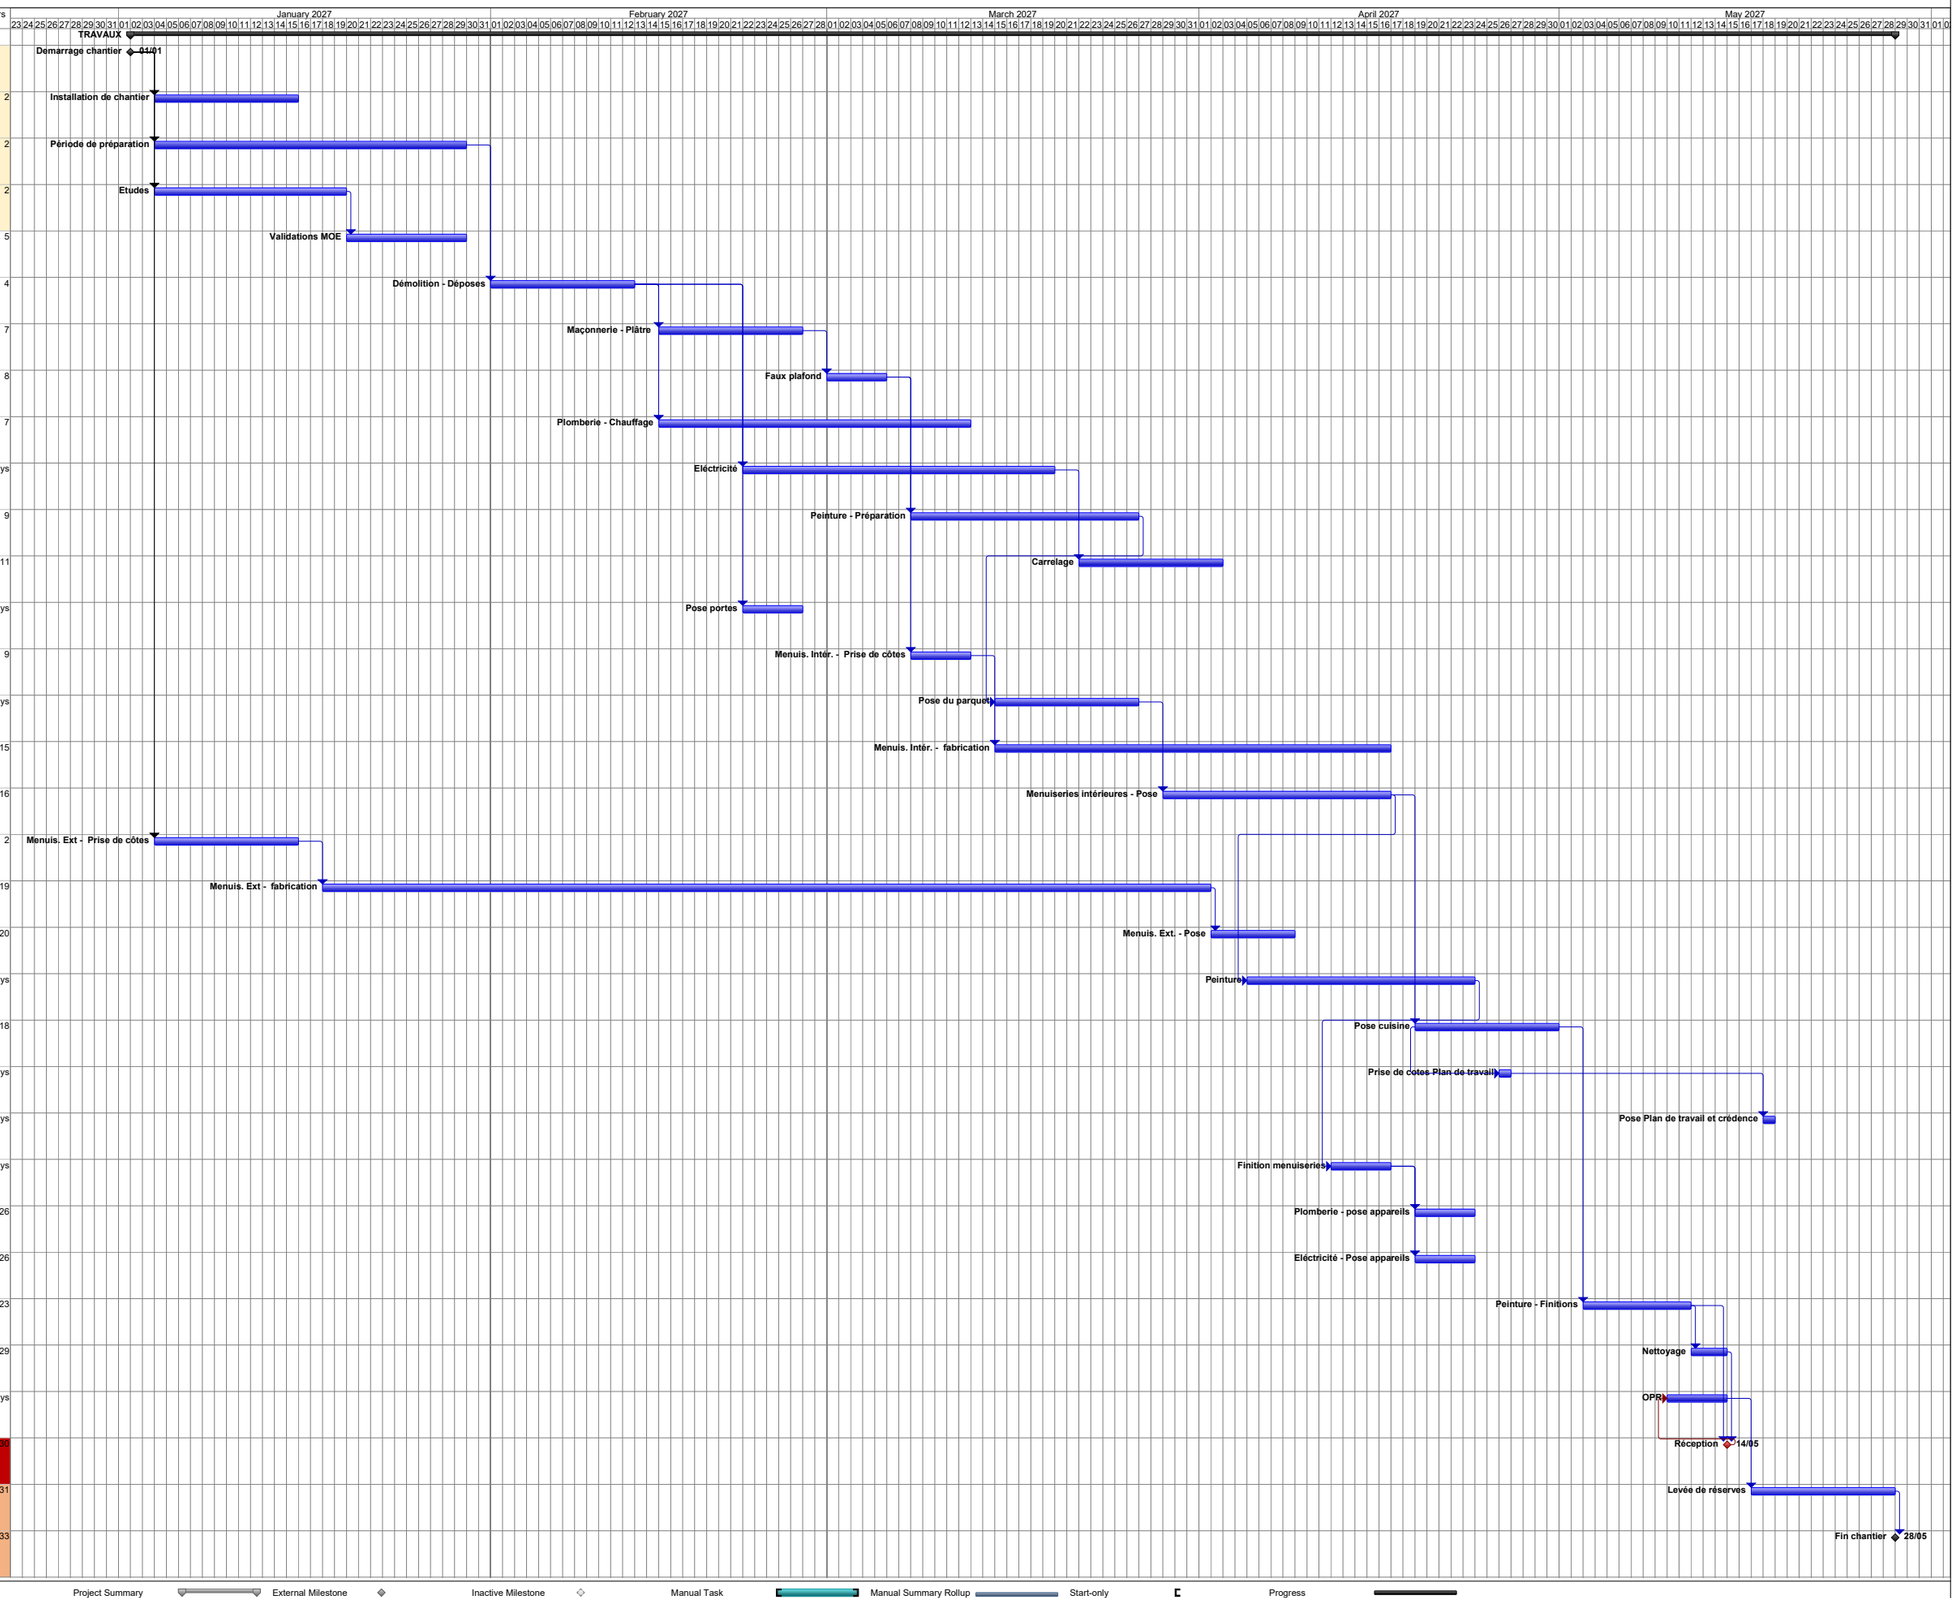

Task | Milestone | Project Summary | External Milestone | Inactive Milestone | Manual Task | Manual Summary Rollup | Start-only | Progress

Split | Summary | External Tasks | Inactive Task | Inactive Summary | Duration-only | Manual Summary | Finish-only | Deadline

2 **OS Demarrage chantier**
Demarrage chantier
