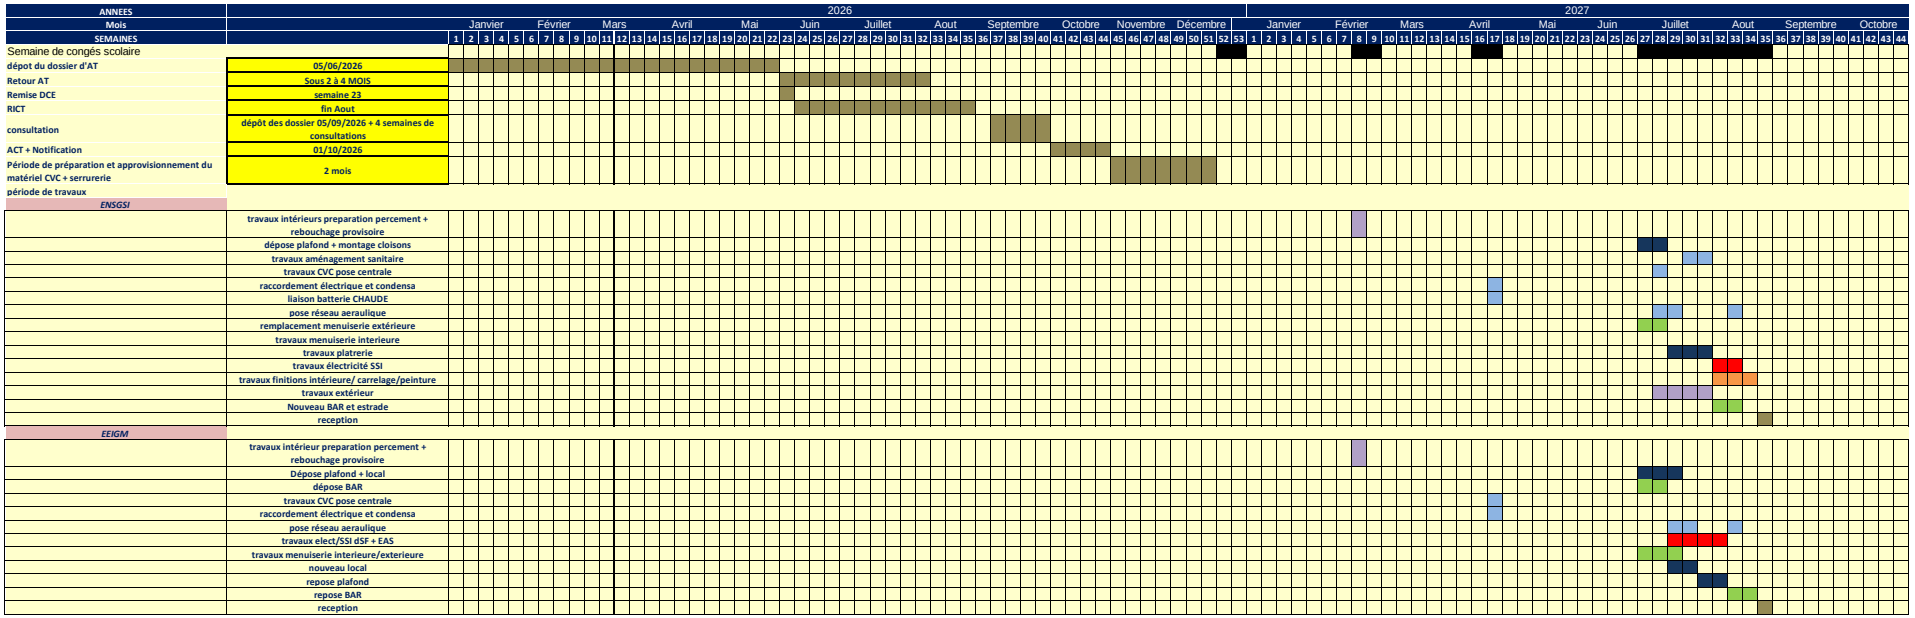

ANNEES
2026
2027
Mois
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre
SEMAINES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Semaine de congés scolaire
dépot du dossier d'AT
05/06/2026
Retour AT
Sous 2 à 4 MOIS
Remise DCE
semaine 23
RICT
fin Aout
consultation
dépôt des dossier 05/09/2026 + 4 semaines de consultations
ACT + Notification
01/10/2026
Période de préparation et approvisionnement du matériel CVC + serrurerie
2 mois
période de travaux
ENSGSI
travaux intérieurs preparation percement + rebouchage provisoire
dépose plafond + montage cloisons
travaux aménagement sanitaire
travaux CVC pose centrale
raccordement électrique et condensa
liaison batterie CHAUDE
pose réseau aeraulique
remplacement menuiserie extérieure
travaux menuiserie interieure
travaux platrerie
travaux électricité SSI
travaux finitions intérieure/ carrelage/peinture
travaux extérieur
Nouveau BAR et estrade
reception
EEIGM
travaux intérieur preparation percement + rebouchage provisoire
Dépose plafond + local
dépose BAR
travaux CVC pose centrale
raccordement électrique et condensa
pose réseau aeraulique
travaux elect/SSI dSF + EAS
travaux menuiserie interieure/exterieure
nouveau local
repose plafond
repose BAR
reception
