
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
www.justice.gouv.fr

MARCHE DE MAITRISE D' OEUVRE POUR LA CREATION D'UNE FUTURE PEP ET MUR D'ENCEINTE M.A. DE MONTBELIARD

ANNEXE PFT 3
PLANNING ETUDES

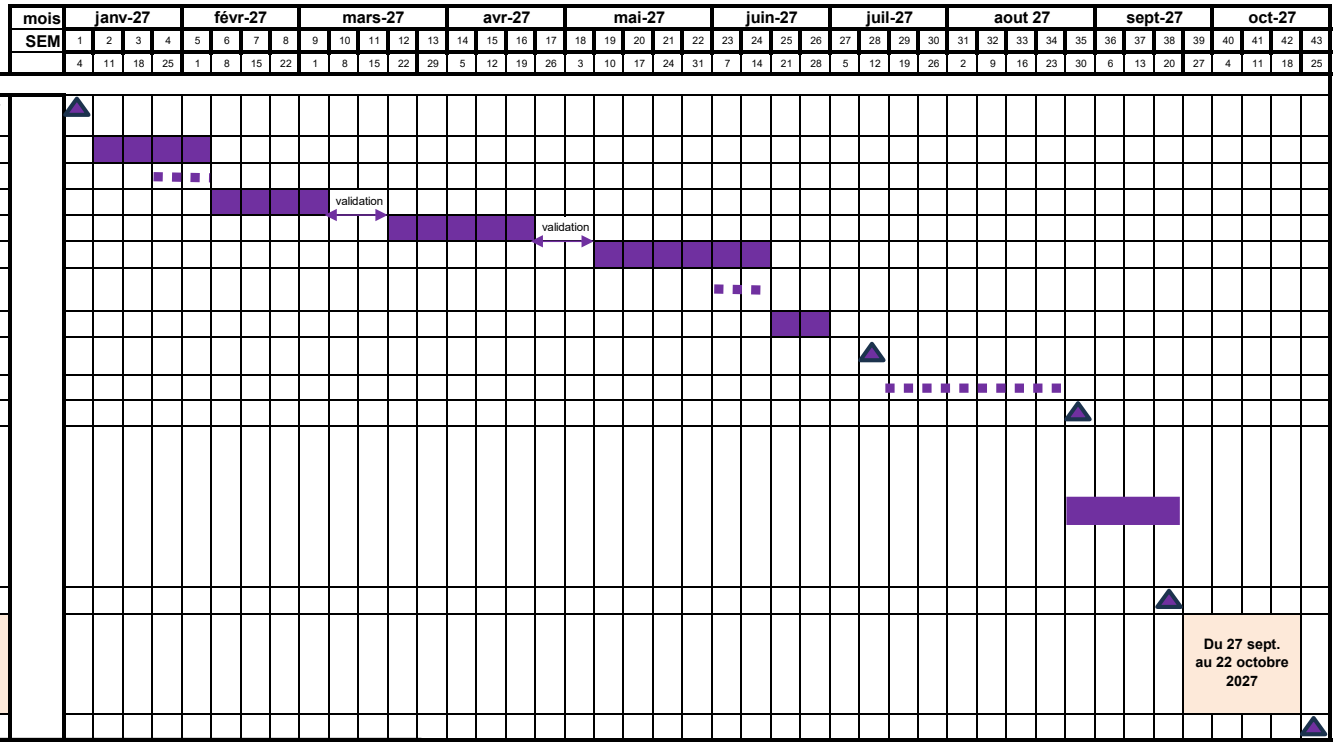

Réunion lancement	**début "études" janvier 2027**	
DIAG	4 semaines	
DIAG Mur d'enceinte (parallèle)	*en parallèle*	
APS	4 semaines	
APD	5 semaines	
PRO - EXE 1 (quantitatifs uniquement)	6 semaines	
RICT	3 semaines (en parallèle)	
Mise au point DCE	2 semaines	
CONSULTATION ENTREPRISES	Publication **15 juillet 2027**	
	*7 semaines**	
Date limite remise des offres	**Vendredi 3 sept 2027**	
ACT Analyse administrative : 1 semaine Analyse technique : 1 semaine Analyse financière : 3 jours Rapport ACT : 4 jours Présentation DISP : 2 jours Validation : 3 jours Attribution : 1 semaine		
Notification entreprises	**24-sept**	
PREPARATION **Durée : 4 semaines** **Comprenant : réunion lancement / OS / calendrier détaillé / PPSPS / PAQ / procédures accès prison / validation installations / visas EXE entreprises / DICT / installation chantier**	**4 semaines**	**Du 27 sept. au 22 octobre 2027**
Démarrage travaux	**25 octobre 2027**	

** Compte tenu : du mois d'août, des congés, d'un marché de 1,5 M€ (pour SCENARIO 1), des lots techniques, le délai est estimé à 7 semaines*
