# OP 1132 : MESOCOSME

2 oct. 2026

## UCA - DPIE


| | |
|---|---|
| **Chef de projet** | |
| **Dates du projet** | 1 sept. 2026 - 31 mars 2028 |
| | |
| **Avancée** | 0% |
| **Tâches** | 18 |
| **Ressources** | 0 |

## Tâches

| Nom | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| CONSULATION MOE | 01/09/2026 | 20/11/2026 |
| | | |
| PHASE 2 : ETUDES | 21/11/2026 | 23/05/2027 |
| APS | 21/11/2026 | 20/12/2026 |
| Validation APS par MOE | 21/12/2026 | 10/01/2027 |
| APD | 11/01/2027 | 31/01/2027 |
| Validation APD par MOA | 01/02/2027 | 15/02/2027 |
| PRO/DCE | 16/02/2027 | 08/03/2027 |
| Validation PRO / DCE par MOA | 09/03/2027 | 23/03/2027 |
| Consultation des entreprises | 24/03/2027 | 02/05/2027 |
| Analyse des offres | 03/05/2027 | 23/05/2027 |
| | | |
| Permis de Construire | 16/02/2027 | 15/06/2027 |
| | | |
| PHASE 3 : CHANTIER | 16/06/2027 | 20/12/2027 |
| Préparation de chantier | 16/06/2027 | 15/07/2027 |
| Démarrage chantier | 16/07/2027 | 16/07/2027 |
| Chantier | 17/07/2027 | 13/12/2027 |
| Réception | 14/12/2027 | 20/12/2027 |
| | | |
| Fin de l'opération / date max | 05/01/2028 | 05/01/2028 |
| Fin Covention FEDER | 31/03/2028 | 31/03/2028 |

# Diagramme de Gantt

| Nom | Date d... | Date ... |
|---|---|---|
| CONSULATION MOE | 01/09/2026 | 20/11... |
| PHASE 2 : ETUDES | 21/11/2026 | 23/05... |
| APS | 21/11/2026 | 20/12... |
| Validation APS par MOE | 21/12/2026 | 10/01... |
| APD | 11/01/2027 | 31/01... |
| Validation APD par MOA | 01/02/2027 | 15/02... |
| PRO/DCE | 16/02/2027 | 08/03... |
| Validation PRO ... | 09/03/2027 | 23/03... |
| Consultation de... | 24/03/2027 | 02/05... |
| Analyse des offres | 03/05/2027 | 23/05... |
| Permis de Construire | 16/02/2027 | 15/06... |
| PHASE 3 : CHANTIER | 16/06/2027 | 20/12... |
| Préparation de chantier | 16/06/2027 | 15/07... |
| Démarrage chantier | 16/07/2027 | 16/07... |
| Chantier | 17/07/2027 | 13/12... |
| Réception | 14/12/2027 | 20/12... |
| Fin de l'opération / date max | 05/01/2028 | 05/01... |
| Fin Covention FEDER | 31/03/2028 | 31/03... |

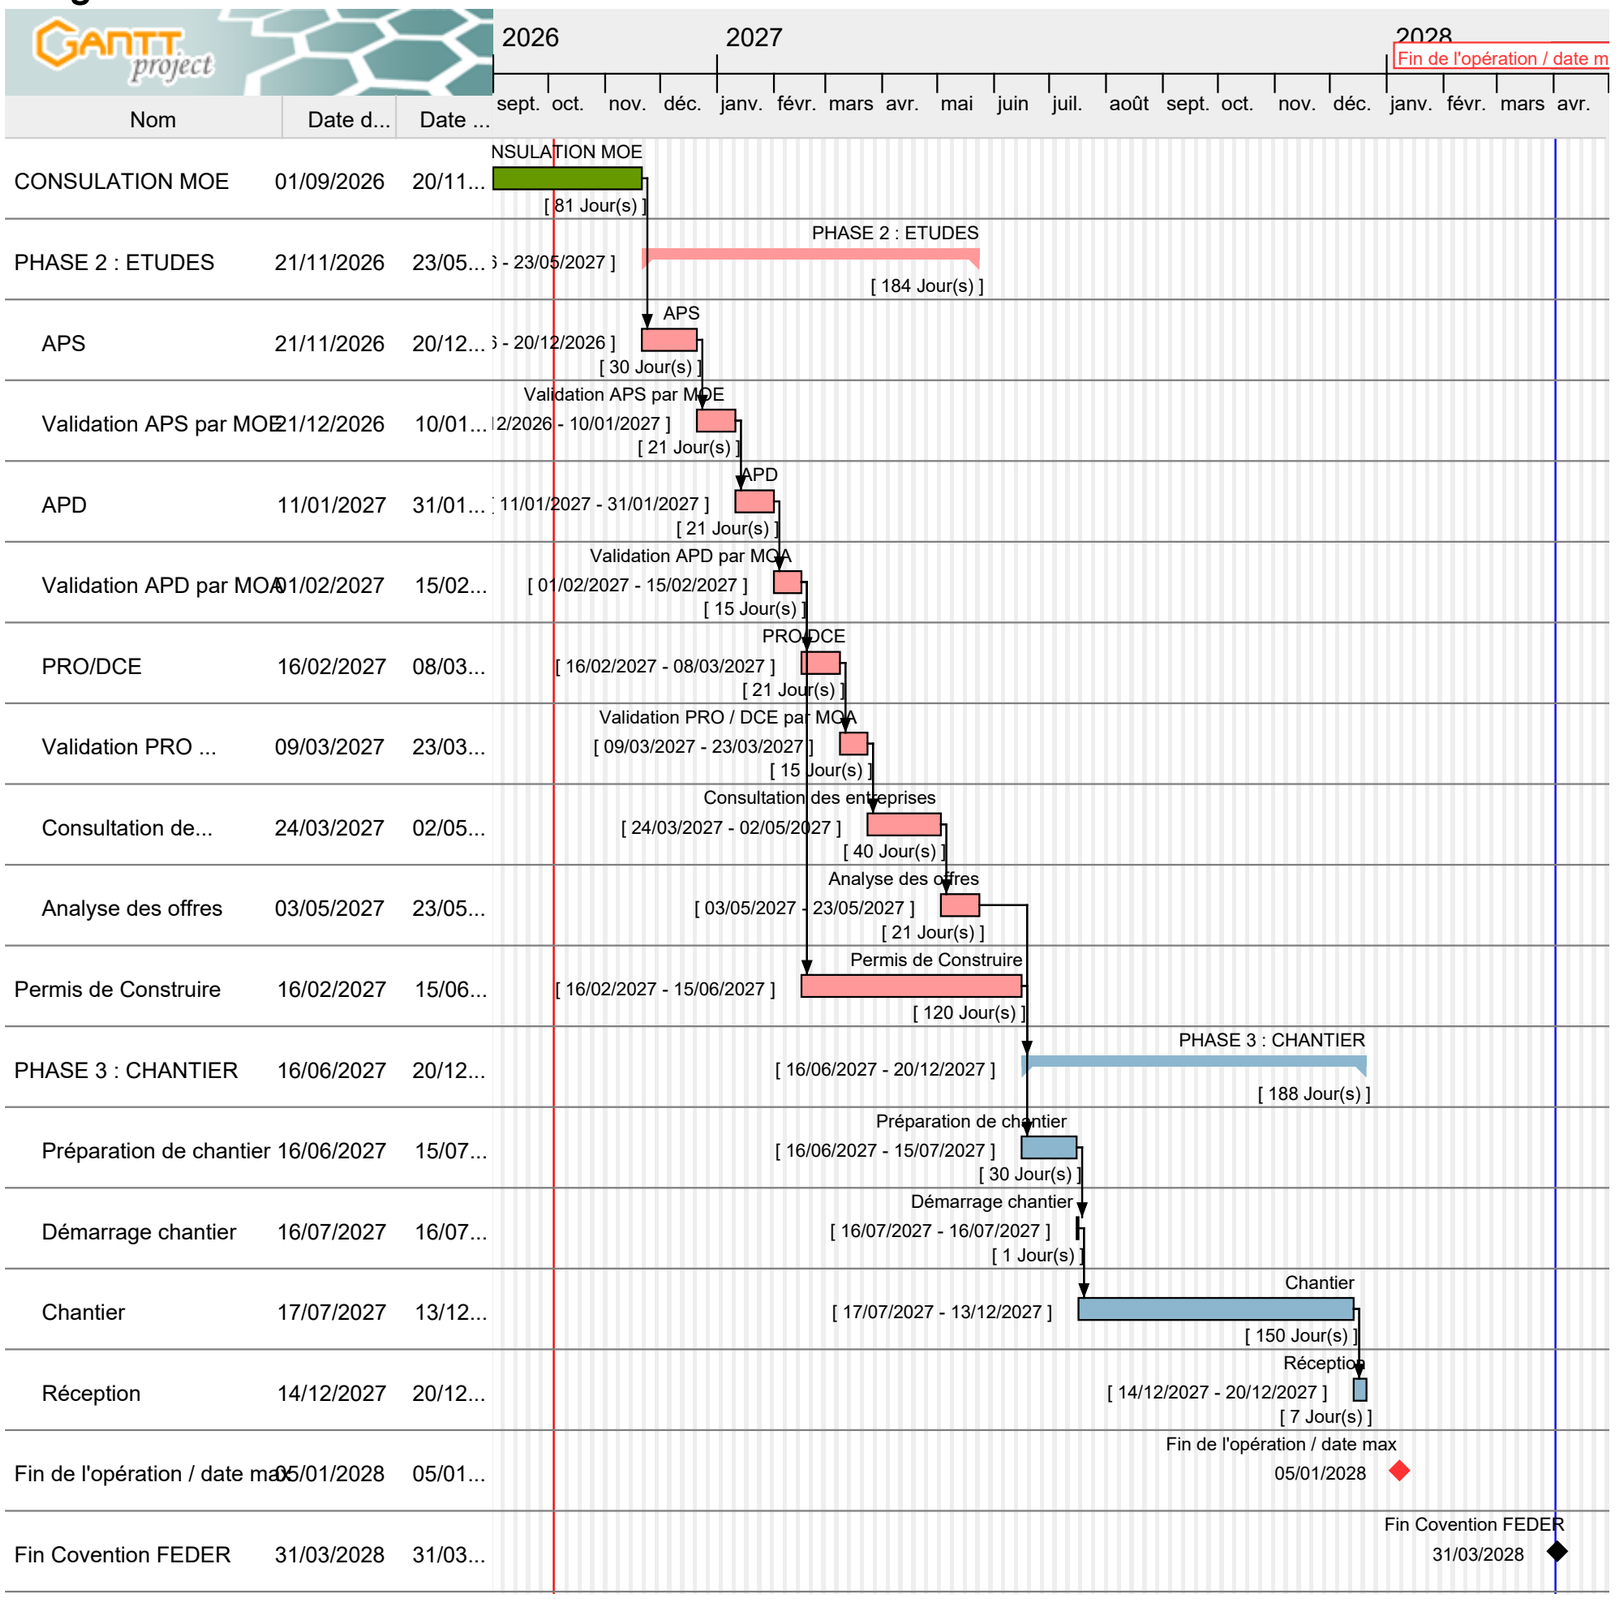

## Diagramme des Ressources

