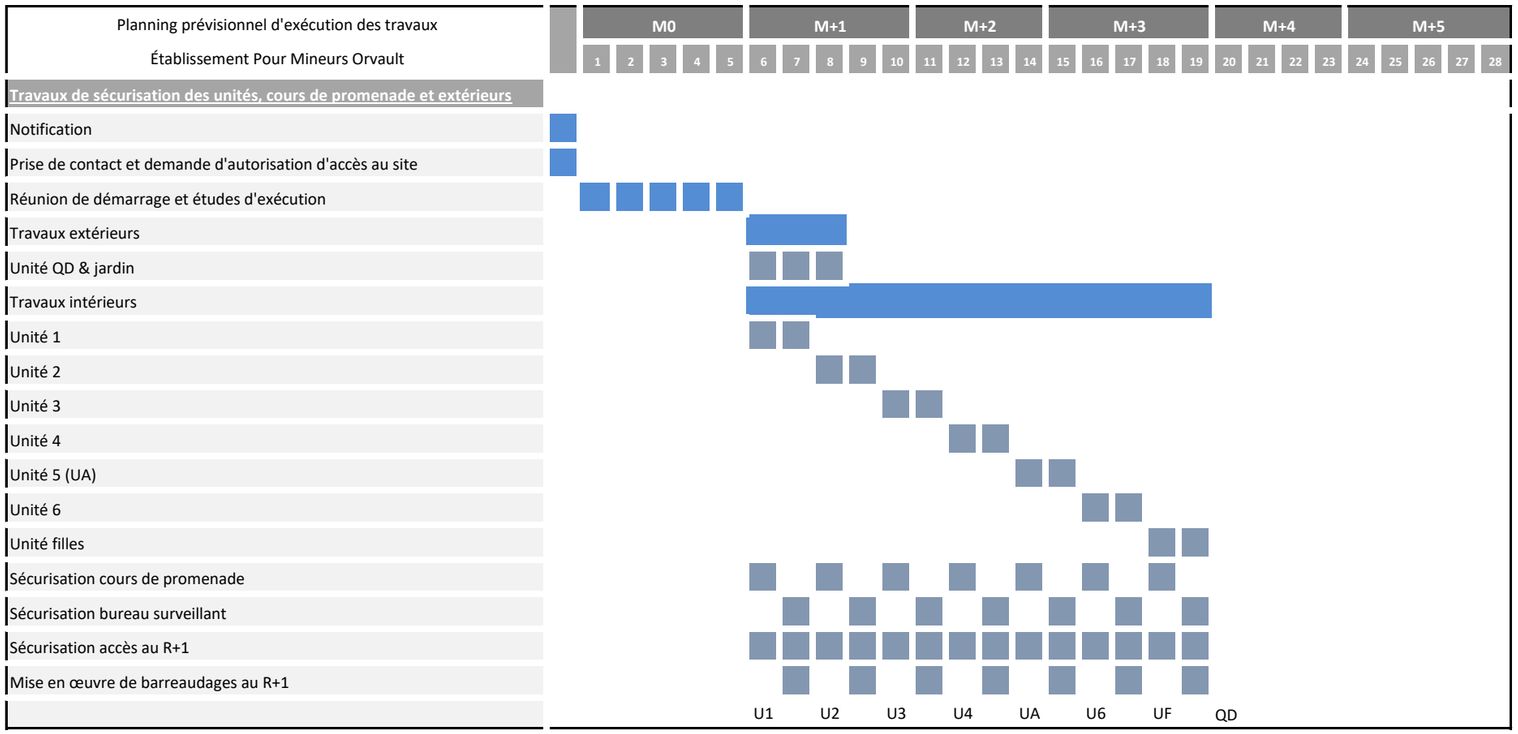

Planning prévisionnel d'exécution des travaux
Établissement Pour Mineurs Orvault
M0
M+1
M+2
M+3
M+4
M+5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Travaux de sécurisation des unités, cours de promenade et extérieurs
Notification
Prise de contact et demande d'autorisation d'accès au site
Réunion de démarrage et études d'exécution
Travaux extérieurs
Unité QD & jardin
Travaux intérieurs
Unité 1
Unité 2
Unité 3
Unité 4
Unité 5 (UA)
Unité 6
Unité filles
Sécurisation cours de promenade
Sécurisation bureau surveillant
Sécurisation accès au R+1
Mise en œuvre de barreaudages au R+1
U1 U2 U3 U4 UA U6 UF QD
