Planning opération

PO

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee)

Direction Générale – Secrétariat Général

Département « Cadre de vie et conditions de Travail » (DCVCT)

Division « Marchés et Immobilier » (DMI) – Timbre C330

88 avenue Verdier – CS 70058 – 92541 MONTROUGE CEDEX

MARCHÉS PUBLICS DE MOE

Objet de la consultation

TRAVAUX DE PROLONGEMENT DU CHEMINEMENT PIÉTON DE LA COUR INTÉRIEURE DE L'ÉTABLISSEMENT INSEE DE METZ DE LA DIRECTION RÉGIONALE DU GRAND EST

Lieu des travaux

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee)

Direction régionale du Grand Est

Établissement de Metz (CSM)

5 rue Henry Maret – CS 90403 – 57008 METZ CEDEX 1

Marché unique

Référence : 06_Planning_previsionnel_INSEE2026_T1016.pdf

Date du document : 19/10/26


0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	14	3	1	1,5	4,5	4,5	1	1,5	2	8	1,1	1,5	1,5
R1		R2	R3	R4	R5	Tâches	initiateur	Durée prévisionnelle en jours (ouvrés)		Date de début	Date de fin	jours (ouvrés)		Action	Tâches	Réunion	Code mère	Code Opé
6	Consultation des marchés de travaux (préparation et mise en ligne)						MOA	30	jours	jeu. 1 oct. 2026	lun. 16 nov. 2026	33	jours	À saisir	Consultation des marchés de travaux (préparation et mise en			
6.1	**Préparation de la consultation**						MOA	10	jours	jeu. 1 oct. 2026	jeu. 1 oct. 2026	1	jours	À saisir	Préparation de la consultation			
6.1.1	*Rédaction DP, RC et CCAP*						MOA	1	jours	jeu. 1 oct. 2026	ven. 16 oct. 2026	12	jours	À saisir	Rédaction DP, RC et CCAP			
6.1.2	*Enregistrement (APPACHE)*						MOA	4	jours	jeu. 1 oct. 2026	jeu. 1 oct. 2026	1	jours	À saisir	Enregistrement (APPACHE)			
6.1.3	*Validation DP, RC et CCAP*						MOA	2	jours	ven. 16 oct. 2026	ven. 16 oct. 2026	1	jours	À saisir	Validation DP, RC et CCAP			
6.1.4	*Publicité (BOAMP)*						MOA	1	jours	lun. 19 oct. 2026	lun. 19 oct. 2026	1	jours	À saisir	Publicité (BOAMP)			
6.1.5	*Mise en ligne (PLACE/messagerie)*						MOA	1	jours	lun. 19 oct. 2026	lun. 19 oct. 2026	1	jours	À saisir	Mise en ligne (PLACE/messagerie)			
6.2	**Date de début de la consultation**						MOA	1	jours	lun. 19 oct. 2026	lun. 19 oct. 2026	1	jours	À saisir	Date de début de la consultation			
6.3	**Consultation mise en ligne**						MOA	20	jours	lun. 19 oct. 2026	lun. 16 nov. 2026	21	jours	À saisir	Consultation mise en ligne			
6.4	**Date de fin de la consultation**						MOA	1	jours	lun. 16 nov. 2026	lun. 16 nov. 2026	1	jours	À saisir	Date de fin de la consultation			
7	Analyse des offres des marchés de travaux						MOA + MOE		jours	lun. 16 nov. 2026	ven. 27 nov. 2026	10	jours	À saisir	Analyse des offres des marchés de travaux			
7.1	**Ouverture des plis (MOA)**						MOA	1	jours	lun. 16 nov. 2026	lun. 16 nov. 2026	1	jours	À saisir	Ouverture des plis (MOA)			
7.2	**Transmission des offres à la MOE (MOA)**						MOA	1	jours	lun. 16 nov. 2026	lun. 16 nov. 2026	1	jours	À saisir	Transmission des offres à la MOE (MOA)			
7.3	**Rédaction du registre d'ouverture des plis (OUV X)**						MOA	1	jours	lun. 16 nov. 2026	lun. 16 nov. 2026	1	jours	À saisir	Rédaction du registre d'ouverture des plis (OUV X)			
7.4	**Signature du registre d'ouverture des plis (OUV X)**						MOA	1	jours	mar. 17 nov. 2026	mar. 17 nov. 2026	1	jours	À saisir	Signature du registre d'ouverture des plis (OUV X)			
7.5	**Date de début de l'analyse des offres**						MOE	1	jours	lun. 16 nov. 2026	lun. 16 nov. 2026	1	jours	À saisir	Date de début de l'analyse des offres			
7.6	**Période de l'analyse des offres**						MOE	5	jours	lun. 16 nov. 2026	ven. 20 nov. 2026	5	jours	À saisir	Période de l'analyse des offres			
7.7	**Date de fin de l'analyse des offres**						MOE	1	jours	ven. 20 nov. 2026	ven. 20 nov. 2026	1	jours	À saisir	Date de fin de l'analyse des offres			
7.8	**Envoi du rapport d'analyse des offres à la MOA par la MOE**						MOE	1	jours	lun. 16 nov. 2026	lun. 16 nov. 2026	1	jours	À saisir	Envoi du rapport d'analyse des offres à la MOA par la MOE			
7.9	**Réunion d'analyse des offres n°01**						MOA + MOE	1	jours	lun. 23 nov. 2026	lun. 23 nov. 2026	1	jours	À saisir	Réunion d'analyse des offres n°01	OUI		
7.10	**Négociation des offres de travaux**						MOA + MOE		jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Négociation des offres de travaux			
7.10.1	*Proposition des questions*						MOE	1	jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Proposition des questions			
7.10.2	*Rédaction des OUV6 et7*						MOA	1	jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Rédaction des OUV6 et7			
7.10.3	*Validation des questions (OUV6 et 7)*						MOA	1	jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Validation des questions (OUV6 et 7)			
7.10.4	*Signature des questions (OUV6 et 7)*						MOA	1	jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Signature des questions (OUV6 et 7)			
7.10.5	*Envoie des questions aux soumissionnaires*						MOA	1	jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Envoie des questions aux soumissionnaires			
7.10.6	*Date de début de la négociation*						MOA + MOE	1	jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Date de début de la négociation			
7.10.7	*Période de négociation*						MOA + MOE	5	jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Période de négociation			
7.10.8	*Date de fin de négociation*						MOA + MOE	1	jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Date de fin de négociation			
7.10.9	*Envoie des offres négociées à la MOE*						MOA		jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Envoie des offres négociées à la MOE			
7.10.10	*Début de l'analyse des offres négociées*						MOE		jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Début de l'analyse des offres négociées			
7.10.11	*Analyse des offres négociées*						MOE	3	jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Analyse des offres négociées			
7.10.12	*Fin de l'analyse des offres négociées*						MOE		jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Fin de l'analyse des offres négociées			

7.10.13	*Envoie du rapport d'analyse à la MOA*	MOE		jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Envoie du rapport d'analyse à la MOA			
7.10.14	***Réunion d'analyse n°02 (après négociation)***	MOA + MOE	1	jours	SO	SO	0	jours	À saisir	Réunion d'analyse n°02 (après négociation)	OUI		
7.11	**Rédaction du rapport de présentation**	MOA	1	jours	mar. 24 nov. 2026	mar. 24 nov. 2026	1	jours	À saisir	Rédaction du rapport de présentation			
7.12	**Signature du rapport de présentation**	MOA	1	jours	mer. 25 nov. 2026	mer. 25 nov. 2026	1	jours	À saisir	Signature du rapport de présentation			
7.13	**Vérification des pièces administrative**	MOA	1	jours	mar. 24 nov. 2026	mar. 24 nov. 2026	1	jours	À saisir	Vérification des pièces administrative			
7.14	**Rédaction du NOTI 1 (attribution)**	MOA	1	jours	mer. 25 nov. 2026	mer. 25 nov. 2026	1	jours	À saisir	Rédaction du NOTI 1 (attribution)			
7.15	**Signature du NOTI 1 (attribution)**	MOA	1	jours	jeu. 26 nov. 2026	jeu. 26 nov. 2026	1	jours	À saisir	Signature du NOTI 1 (attribution)			
7.16	**Envois du NOTI 1 (attribution) à l'attributaire**	MOA	1	jours	ven. 27 nov. 2026	ven. 27 nov. 2026	1	jours	À saisir	Envois du NOTI 1 (attribution) à l'attributaire			
7.17	**Acception de l'attribution et de la participation a la première réunion de chantier**	TVX	1	jours	ven. 27 nov. 2026	ven. 27 nov. 2026	1	jours	À saisir	Acception de l'attribution et de la participation a la première			
8	Enregistrement comptable et notification des marchés de travaux	MOA + CGF3		jours	ven. 27 nov. 2026	lun. 21 déc. 2026	17	jours	À saisir	Enregistrement comptable et notification des marchés de			
8.1	**Rédaction de la FRM**	MOA	1	jours	ven. 27 nov. 2026	ven. 27 nov. 2026	1	jours	À saisir	Rédaction de la FRM			
8.2	**Validation de la FRM par le SGF**	SGF	1	jours	ven. 27 nov. 2026	lun. 30 nov. 2026	2	jours	À saisir	Validation de la FRM par le SGF			
8.3	**Enregistrement des marchés sur PLACE**	MOA	1	jours	lun. 30 nov. 2026	lun. 30 nov. 2026	1	jours	À saisir	Enregistrement des marchés sur PLACE			
8.4	**Information de la transmission des pièces marché au CGF3 via PLACE**	MOA	1	jours	lun. 30 nov. 2026	lun. 30 nov. 2026	1	jours	À saisir	Information de la transmission des pièces marché au CGF3 via			
8.5	**Instruction du CGF3**	CGF3	20	jours	lun. 30 nov. 2026	ven. 18 déc. 2026	15	jours	À saisir	Instruction du CGF3			
8.6	**Confirmation d'enregistrement par le CGF3**	CGF3	1	jours	ven. 18 déc. 2026	ven. 18 déc. 2026	1	jours	À saisir	Confirmation d'enregistrement par le CGF3			
8.7	**Notification du marché**	MOA	2	jours	lun. 21 déc. 2026	lun. 21 déc. 2026	1	jours	À saisir	Notification du marché			
8.7.1	*Signature de l'ATTRI 1 par la MOA*	MOA	1	jours	lun. 21 déc. 2026	lun. 21 déc. 2026	1	jours	À saisir	Signature de l'ATTRI 1 par la MOA			
8.7.2	*Envoi de l'ATTRI 1 pour notification au titulaire du marché via PLACE*	MOA	1	jours	lun. 21 déc. 2026	lun. 21 déc. 2026	1	jours	À saisir	Envoi de l'ATTRI 1 pour notification au titulaire du			
8.8	**Rédaction des lettres de rejet des offres (NOTI 3) par le MOA**	MOA	1	jours	lun. 21 déc. 2026	lun. 21 déc. 2026	1	jours	À saisir	Rédaction des lettres de rejet des offres (NOTI 3) par le MOA			
8.9	**Signature des lettres de rejet des offres (NOTI 3) par le MOA**	MOA	1	jours	mar. 22 déc. 2026	mar. 22 déc. 2026	1	jours	À saisir	Signature des lettres de rejet des offres (NOTI 3) par le MOA			
8.10	**Envoie des lettres de rejet des offres (NOTI 3) par le MOA**	MOA	1	jours	mar. 22 déc. 2026	mar. 22 déc. 2026	1	jours	À saisir	Envoie des lettres de rejet des offres (NOTI 3) par le MOA			
9	Période des travaux	MOA + MOE + TVX		jours	mer. 20 janv. 2027	mar. 30 mars 2027	50	jours	À saisir	Période des travaux			
9.1	**1e réunion de chantier (présentation du projet)**	MOA + MOE + TVX	1	jours	mer. 20 janv. 2027	mer. 20 janv. 2027	1	jours	À saisir	1e réunion de chantier (présentation du projet)	OUI		
9.2	**Signature de l'ordre de service de démarrage des travaux**	MOA + MOE + TVX	1	jours	mer. 20 janv. 2027	mer. 20 janv. 2027	1	jours	À saisir	Signature de l'ordre de service de démarrage des travaux			
9.3	**Envoie de l'OS n°01 au CGF3 via PLACE**	MOE	1	jours	jeu. 21 janv. 2027	jeu. 21 janv. 2027	1	jours	À saisir	Envoie de l'OS n°01 au CGF3 via PLACE			
9.4	**Début de la période de préparation du chantier**	MOA + MOE + TVX + OPC	1	jours	mer. 20 janv. 2027	mer. 20 janv. 2027	1	jours	À saisir	Début de la période de préparation du chantier			
9.5	**Période de préparation du chantier**	MOA + MOE + TVX + OPC	20	jours	mer. 20 janv. 2027	mar. 16 févr. 2027	20	jours	À saisir	Période de préparation du chantier			
9.6	**Fin de la période de préparation du chantier**	MOA + MOE + TVX + OPC	1	jours	mar. 16 févr. 2027	mar. 16 févr. 2027	1	jours	À saisir	Fin de la période de préparation du chantier			
9.7	**2e réunion de chantier (début des travaux)**	MOA + MOE + TVX + OPC	1	jours	mer. 17 févr. 2027	mer. 17 févr. 2027	1	jours	À saisir	2e réunion de chantier (début des travaux)	OUI		
9.8	**DET**	MOE	0	jours	mer. 20 janv. 2027	mar. 30 mars 2027	50	jours	À saisir	DET			
9.8.1	*Début de la mission DET*	MOE	1	jours	mer. 20 janv. 2027	mer. 20 janv. 2027	1	jours	À saisir	Début de la mission DET			
9.8.2	*Période de la mission DET*	MOE		jours	mer. 20 janv. 2027	mar. 30 mars 2027	50	jours	À saisir	Période de la mission DET			
9.8.3	*Fin de la mission DET*	MOE	1	jours	mar. 30 mars 2027	mar. 30 mars 2027	1	jours	À saisir	Fin de la mission DET			
9.9	**EXE**	MOE	0	jours	mer. 20 janv. 2027	mar. 30 mars 2027	50	jours	À saisir	EXE			

9.9.1	*Début de la mission EXE*	MOE	1	jours	mer. 20 janv. 2027	mer. 20 janv. 2027	1	jours	À saisir	Début de la mission EXE			
9.9.2	*Période de la mission EXE*	MOE		jours	mer. 20 janv. 2027	mar. 30 mars 2027	50	jours	À saisir	Période de la mission EXE			
9.9.3	*Fin de la mission EXE*	MOE	1	jours	mar. 30 mars 2027	mar. 30 mars 2027	1	jours	À saisir	Fin de la mission EXE			
9.10	**VISA**	MOE	0	jours	mer. 20 janv. 2027	mar. 30 mars 2027	50	jours	À saisir	VISA			
9.10.1	*Début de la mission VISA*	MOE	1	jours	mer. 20 janv. 2027	mer. 20 janv. 2027	1	jours	À saisir	Début de la mission VISA			
9.10.2	*Période de la mission VISA*	MOE		jours	mer. 20 janv. 2027	mar. 30 mars 2027	50	jours	À saisir	Période de la mission VISA			
9.10.3	*Fin de la mission VISA*	MOE	1	jours	mar. 30 mars 2027	mar. 30 mars 2027	1	jours	À saisir	Fin de la mission VISA			
9.11	**Date de fin des travaux**	MOE	1	jours	mar. 30 mars 2027	mar. 30 mars 2027	1	jours	À saisir	Date de fin des travaux			
10	Opérations de réception travaux	MOA + MOE + TVX + OPC		jours	mer. 24 mars 2027	mer. 7 avr. 2027	11	jours	À saisir	Opérations de réception travaux			
10.1	**Date de début des OPR**	MOA + MOE + TVX + OPC	1	jours	mer. 24 mars 2027	mer. 24 mars 2027	1	jours	À saisir	Date de début des OPR			
10.2	**AOR**	MOA + MOE + TVX + OPC	1	jours	mer. 24 mars 2027	mer. 24 mars 2027	1	jours	À saisir	AOR			
10.2.1	*Début de la mission AOR*	MOA + MOE + TVX + OPC	1	jours	mer. 24 mars 2027	mer. 24 mars 2027	1	jours	À saisir	Début de la mission AOR			
10.2.2	*Période de la mission AOR*	MOA + MOE + TVX + OPC		jours	mer. 24 mars 2027	mar. 30 mars 2027	5	jours	À saisir	Période de la mission AOR			
10.2.3	*Fin de la mission AOR*	MOA + MOE + TVX + OPC	1	jours	mar. 30 mars 2027	mar. 30 mars 2027	1	jours	À saisir	Fin de la mission AOR			
10.3	**Rédaction de l'EXE 4 et 5**	MOA + MOE + TVX	1	jours	mer. 24 mars 2027	mer. 24 mars 2027	1	jours	À saisir	Rédaction de l'EXE 4 et 5			
10.4	**Réunion des OPR**	MOA + MOE + TVX + OPC	1	jours	mer. 24 mars 2027	mer. 24 mars 2027	1	jours	À saisir	Réunion des OPR	OUI		
10.5	**Signature de l'EXE 4 et 5**	MOA + MOE + TVX	1	jours	mer. 24 mars 2027	mer. 24 mars 2027	1	jours	À saisir	Signature de l'EXE 4 et 5			
10.6	**Fixation de la date de réception**	MOA + MOE	1	jours	mar. 30 mars 2027	mar. 30 mars 2027	1	jours	À saisir	Fixation de la date de réception			
10.7	**Rédaction de l'EXE 6**	MOA	1	jours	mar. 30 mars 2027	mar. 30 mars 2027	1	jours	À saisir	Rédaction de l'EXE 6			
10.8	**Signature de l'EXE 6**	MOA	1	jours	mar. 30 mars 2027	mar. 30 mars 2027	1	jours	À saisir	Signature de l'EXE 6			
10.9	**Date de début de la période de levée des réserves**	MOA + MOE	1	jours	mer. 31 mars 2027	mer. 31 mars 2027	1	jours	À saisir	Date de début de la période de levée des réserves			
10.10	**période de levée des réserves**	MOA + MOE		jours	jeu. 25 mars 2027	mer. 7 avr. 2027	10	jours	À saisir	période de levée des réserves			
10.11	**Date de fin de la période de levée des réserves**	MOA + MOE	1	jours	mer. 7 avr. 2027	mer. 7 avr. 2027	1	jours	À saisir	Date de fin de la période de levée des réserves			
10.12	**Réunion de levée des réserves**	MOA + MOE	1	jours	mer. 7 avr. 2027	mer. 7 avr. 2027	1	jours	À saisir	Réunion de levée des réserves	OUI		
10.13	**Rédaction de l'EXE 8 et 9**	MOA + MOE	1	jours	mer. 7 avr. 2027	mer. 7 avr. 2027	1	jours	À saisir	Rédaction de l'EXE 8 et 9			
10.14	**Signature de l'EXE 8 et 9**	MOA	1	jours	mer. 7 avr. 2027	mer. 7 avr. 2027	1	jours	À saisir	Signature de l'EXE 8 et 9			
11	Garantie de parfait achèvement travaux	MOA + MOE	260	jours	mar. 30 mars 2027	jeu. 30 mars 2028	263	jours	À saisir	Garantie de parfait achèvement travaux			
11.1	**Début de la période de parfait achèvement**	MOA + MOE	1	jours	mar. 30 mars 2027	mar. 30 mars 2027	1	jours	À saisir	Début de la période de parfait achèvement			
11.2	**Période de parfait achèvement**	MOA + MOE	260	jours	mar. 30 mars 2027	jeu. 30 mars 2028	263	jours	À saisir	Période de parfait achèvement			
11.3	**Fin de la période de parfait achèvement**	MOA + MOE	1	jours	jeu. 30 mars 2028	jeu. 30 mars 2028	1	jours	À saisir	Fin de la période de parfait achèvement			

2 6 3,8 3,8


	Tâches	Date de début	Date de fin
6.3	Consultation mise en ligne	lun. 19 oct. 26	lun. 16 nov. 26
7	Analyse des offres des marchés de travaux	lun. 16 nov. 26	ven. 27 nov. 26
8	Enregistrement comptable et notification des marchés de travaux	ven. 27 nov. 26	lun. 21 déc. 26
9	Période des travaux	mer. 20 janv. 27	mar. 30 mars 27
10	Opérations de réception travaux	mer. 24 mars 27	mer. 07 avr. 27
10.6	Fixation de la date de réception	mar. 30 mars 27	mar. 30 mars 27
11	Garantie de parfait achèvement travaux	mar. 30 mars 27	jeu. 30 mars 28
50.4	Vacances d'automne 2026 (zone A, B et C)	lun. 19 oct. 26	ven. 30 oct. 26
50.5	Vacances de fin d'année 2026 (zone A, B et C)	lun. 21 déc. 26	ven. 01 janv. 27
53.1.1	Vacances d'hivers 2027 (zone C)	lun. 08 févr. 27	ven. 19 févr. 27
53.1.2	Vacances d'hivers 2027 (zone B)	lun. 22 févr. 27	ven. 05 mars 27
53.2.1	Vacances de printemps 2027 (zone C)	lun. 05 avr. 27	ven. 16 avr. 27
53.2.2	Vacances de printemps 2027 (zone B)	lun. 19 avr. 27	ven. 30 avr. 27

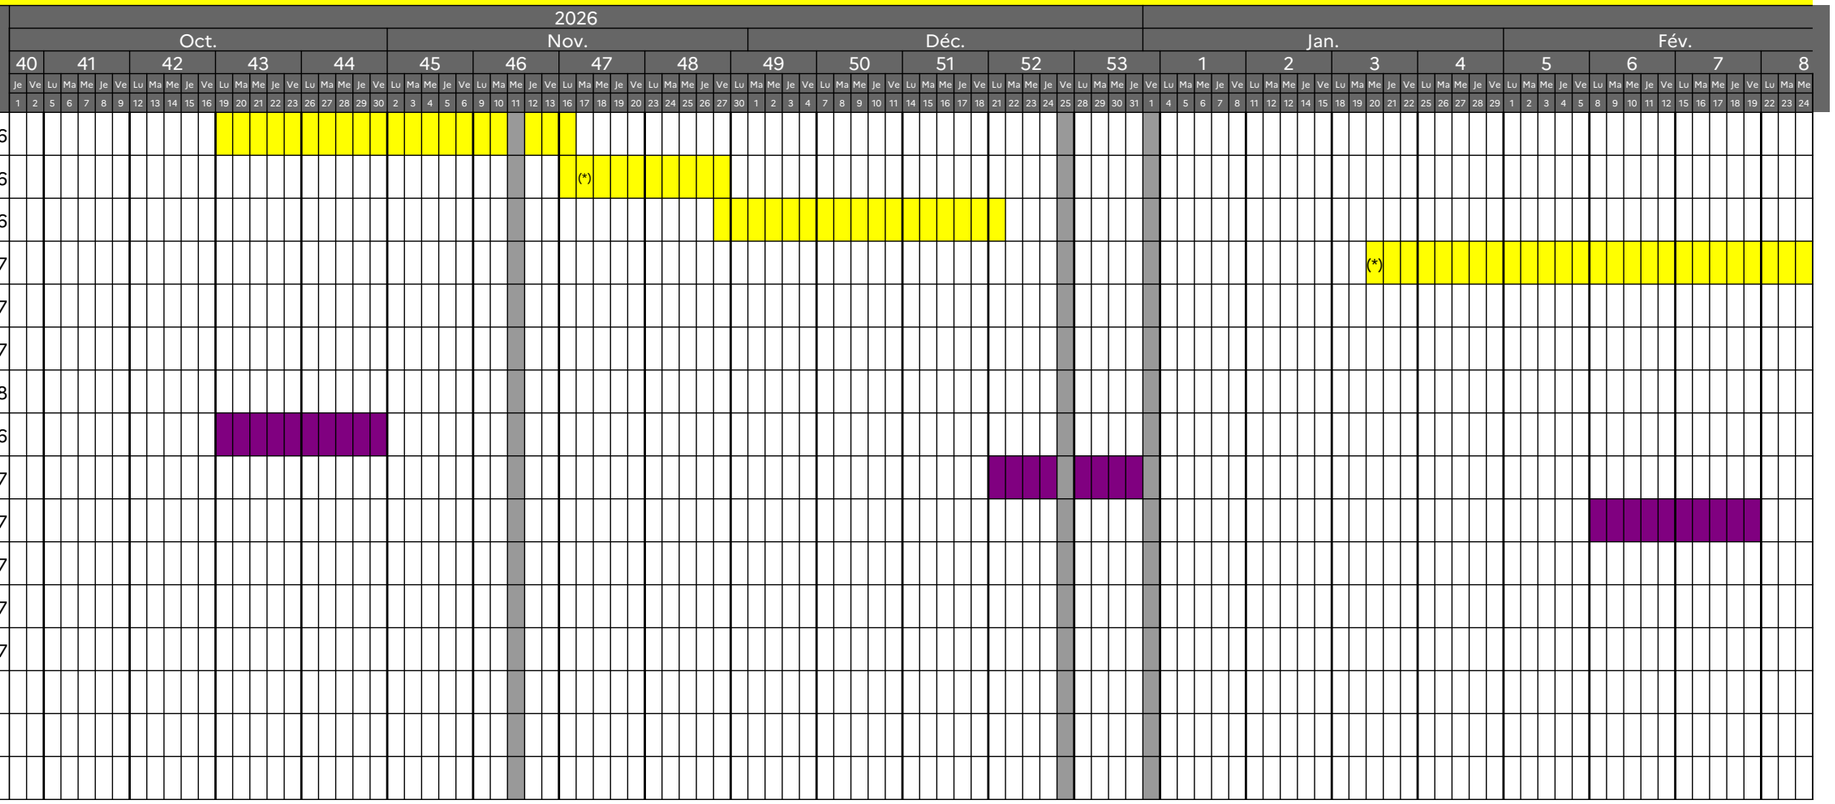

(*) Réunions

R Réception

Tâches		Date de début	Date de fin
6.3	Consultation mise en ligne	lun. 19 oct. 26	lun. 16 nov. 26
7	Analyse des offres des marchés de travaux	lun. 16 nov. 26	ven. 27 nov. 26
8	Enregistrement comptable et notification des marchés de travaux	ven. 27 nov. 26	lun. 21 déc. 26
9	Période des travaux	mer. 20 janv. 27	mar. 30 mars 27
10	Opérations de réception travaux	mer. 24 mars 27	mer. 07 avr. 27
10.6	Fixation de la date de réception	mar. 30 mars 27	mar. 30 mars 27
11	Garantie de parfait achèvement travaux	mar. 30 mars 27	jeu. 30 mars 28
50.4	Vacances d'automne 2026 (zone A, B et C)	lun. 19 oct. 26	ven. 30 oct. 26
50.5	Vacances de fin d'année 2026 (zone A, B et C)	lun. 21 déc. 26	ven. 01 janv. 27
53.1.1	Vacances d'hivers 2027 (zone C)	lun. 08 févr. 27	ven. 19 févr. 27
53.1.2	Vacances d'hivers 2027 (zone B)	lun. 22 févr. 27	ven. 05 mars 27
53.2.1	Vacances de printemps 2027 (zone C)	lun. 05 avr. 27	ven. 16 avr. 27
53.2.2	Vacances de printemps 2027 (zone B)	lun. 19 avr. 27	ven. 30 avr. 27

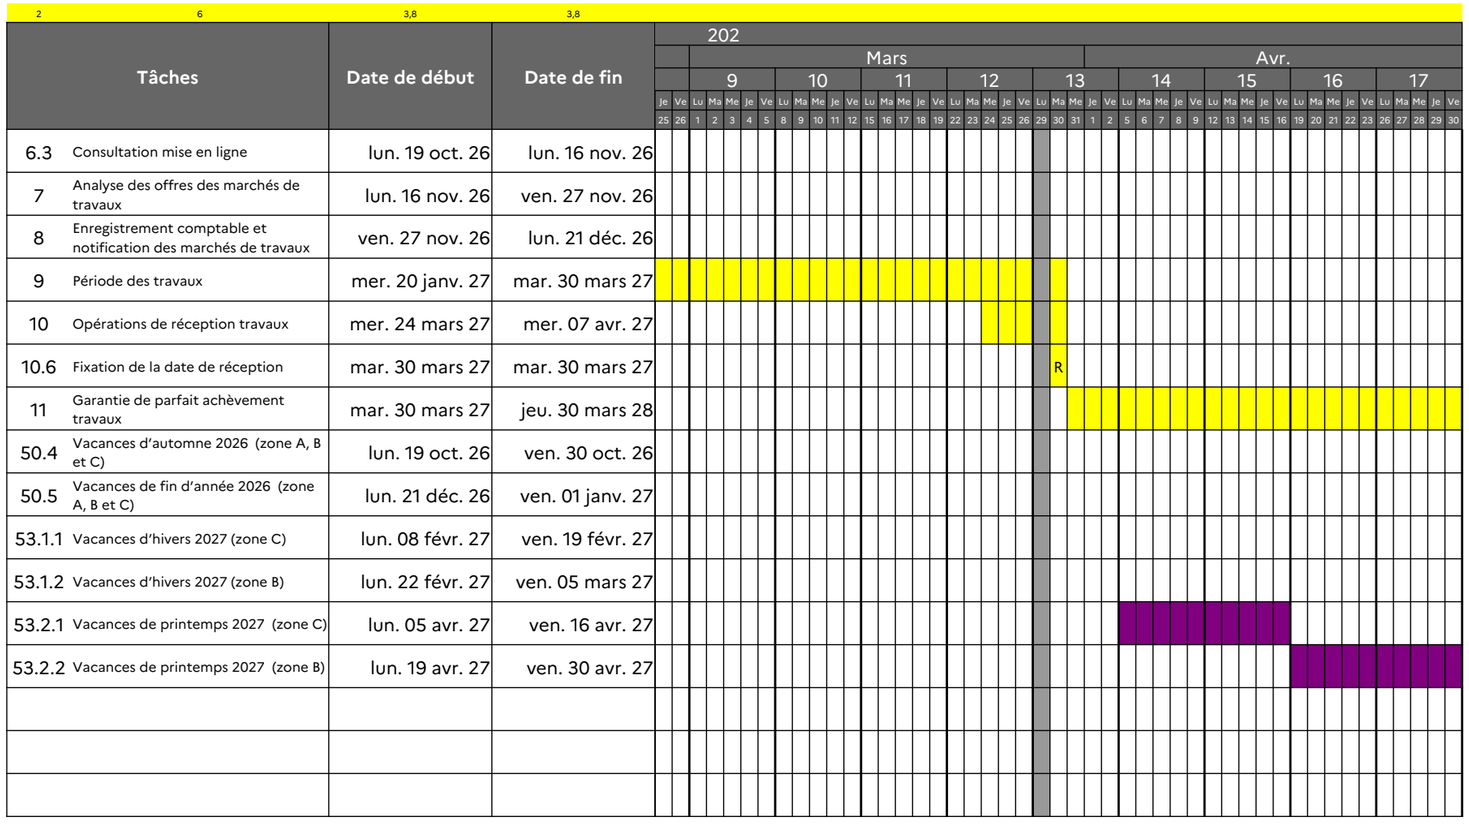

(*) Réunions

R Réception
