
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILTE
UNIVERSITE DE LORRAINE

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**OS démarrage travaux**	1 jour	Mer 16/12/26	Mer 16/12/26	
2		**Periode de préparation**	60 jours	Jeu 17/12/26	Ven 26/03/27	1
3		**ISEA**	**40 jours**	**Lun 29/03/27**	**Ven 21/05/27**	
4		Lot 01 Gros oeuvre	5 jours	Lun 29/03/27	Ven 02/04/27	2
5		Lot 02 Plomberie/CVC/Carrelage	15 jours	Lun 05/04/27	Ven 23/04/27	4
6		Lot 03 Menuiserie Intérieure	15 jours	Lun 05/04/27	Ven 23/04/27	4
7		Lot 04 Peinture - Plâtrerie	15 jours	Lun 05/04/27	Ven 23/04/27	4
8		Lot 05 Electricité	15 jours	Lun 05/04/27	Ven 23/04/27	4
9		OPR ISEA	5 jours	Lun 03/05/27	Ven 07/05/27	16
10		LEVEE DES RESERVES ISEA	10 jours	Lun 10/05/27	Ven 21/05/27	9
11		**ICPM**	**35 jours**	**Lun 05/04/27**	**Ven 21/05/27**	
12		Lot 01 Gros oeuvre	5 jours	Lun 05/04/27	Ven 09/04/27	4
13		Lot 02 Plomberie/CVC/Carrelage	15 jours	Lun 12/04/27	Ven 30/04/27	12
14		Lot 03 Menuiserie Intérieure	15 jours	Lun 12/04/27	Ven 30/04/27	12
15		Lot 04 Peinture - Plâtrerie	15 jours	Lun 12/04/27	Ven 30/04/27	12
16		Lot 05 Eéctricité	15 jours	Lun 12/04/27	Ven 30/04/27	12
17		OPR ICPM	5 jours	Lun 03/05/27	Ven 07/05/27	16
18		LEVEE DES RESERVES ICPM	10 jours	Lun 10/05/27	Ven 21/05/27	17
19		**TRAVAUX VRD ICPM - ISEA**	20 jours	Lun 29/03/27	Ven 23/04/27	2
20		**IUT SAINT AVOLD**	**38 jours**	**Lun 10/05/27**	**Mer 30/06/27**	
21		Lot 01 Gros oeuvre	5 jours	Lun 10/05/27	Ven 14/05/27	17;9
22		Lot 02 Plomberie/CVC/Carrelage	15 jours	Lun 17/05/27	Ven 04/06/27	21
23		Lot 03 Menuiserie Intérieure	15 jours	Lun 17/05/27	Ven 04/06/27	21
24		Lot 04 Peinture - Plâtrerie	15 jours	Lun 17/05/27	Ven 04/06/27	21
25		Lot 05 Eéctricité	15 jours	Lun 17/05/27	Ven 04/06/27	21
26		TRAVAUX VRD - SAINT AVOLD	20 jours	Lun 10/05/27	Ven 04/06/27	17;9
27		OPR IUT SAINT AVOLD	5 jours	Lun 07/06/27	Ven 11/06/27	25
28		LEVEE DES RESERVES SAINT AVOLD	8 jours	Lun 21/06/27	Mer 30/06/27	27
29		**IUT FORBACH**	**33 jours**	**Lun 17/05/27**	**Mer 30/06/27**	
30		Lot 01 Gros oeuvre	5 jours	Lun 17/05/27	Ven 21/05/27	21
31		Lot 02 Plomberie/CVC/Carrelage	15 jours	Lun 24/05/27	Ven 11/06/27	30
32		Lot 03 Menuiserie Intérieure	15 jours	Lun 24/05/27	Ven 11/06/27	30
33		Lot 04 Peinture - Plâtrerie	15 jours	Lun 24/05/27	Ven 11/06/27	30
34		Lot 05 Eéctricité	15 jours	Lun 24/05/27	Ven 11/06/27	30
35		**TRAVAUX VRD - FORBACH**	15 jours	Lun 17/05/27	Ven 04/06/27	30DD
36		OPR FORBACH	5 jours	Lun 14/06/27	Ven 18/06/27	34
37		LEVEE DES RESERVES FORBACH - SAINT AVOLD	8 jours	Lun 21/06/27	Mer 30/06/27	36
38		**RECEPTION TRAVAUX**	5 jours	Jeu 01/07/27	Mer 07/07/27	37

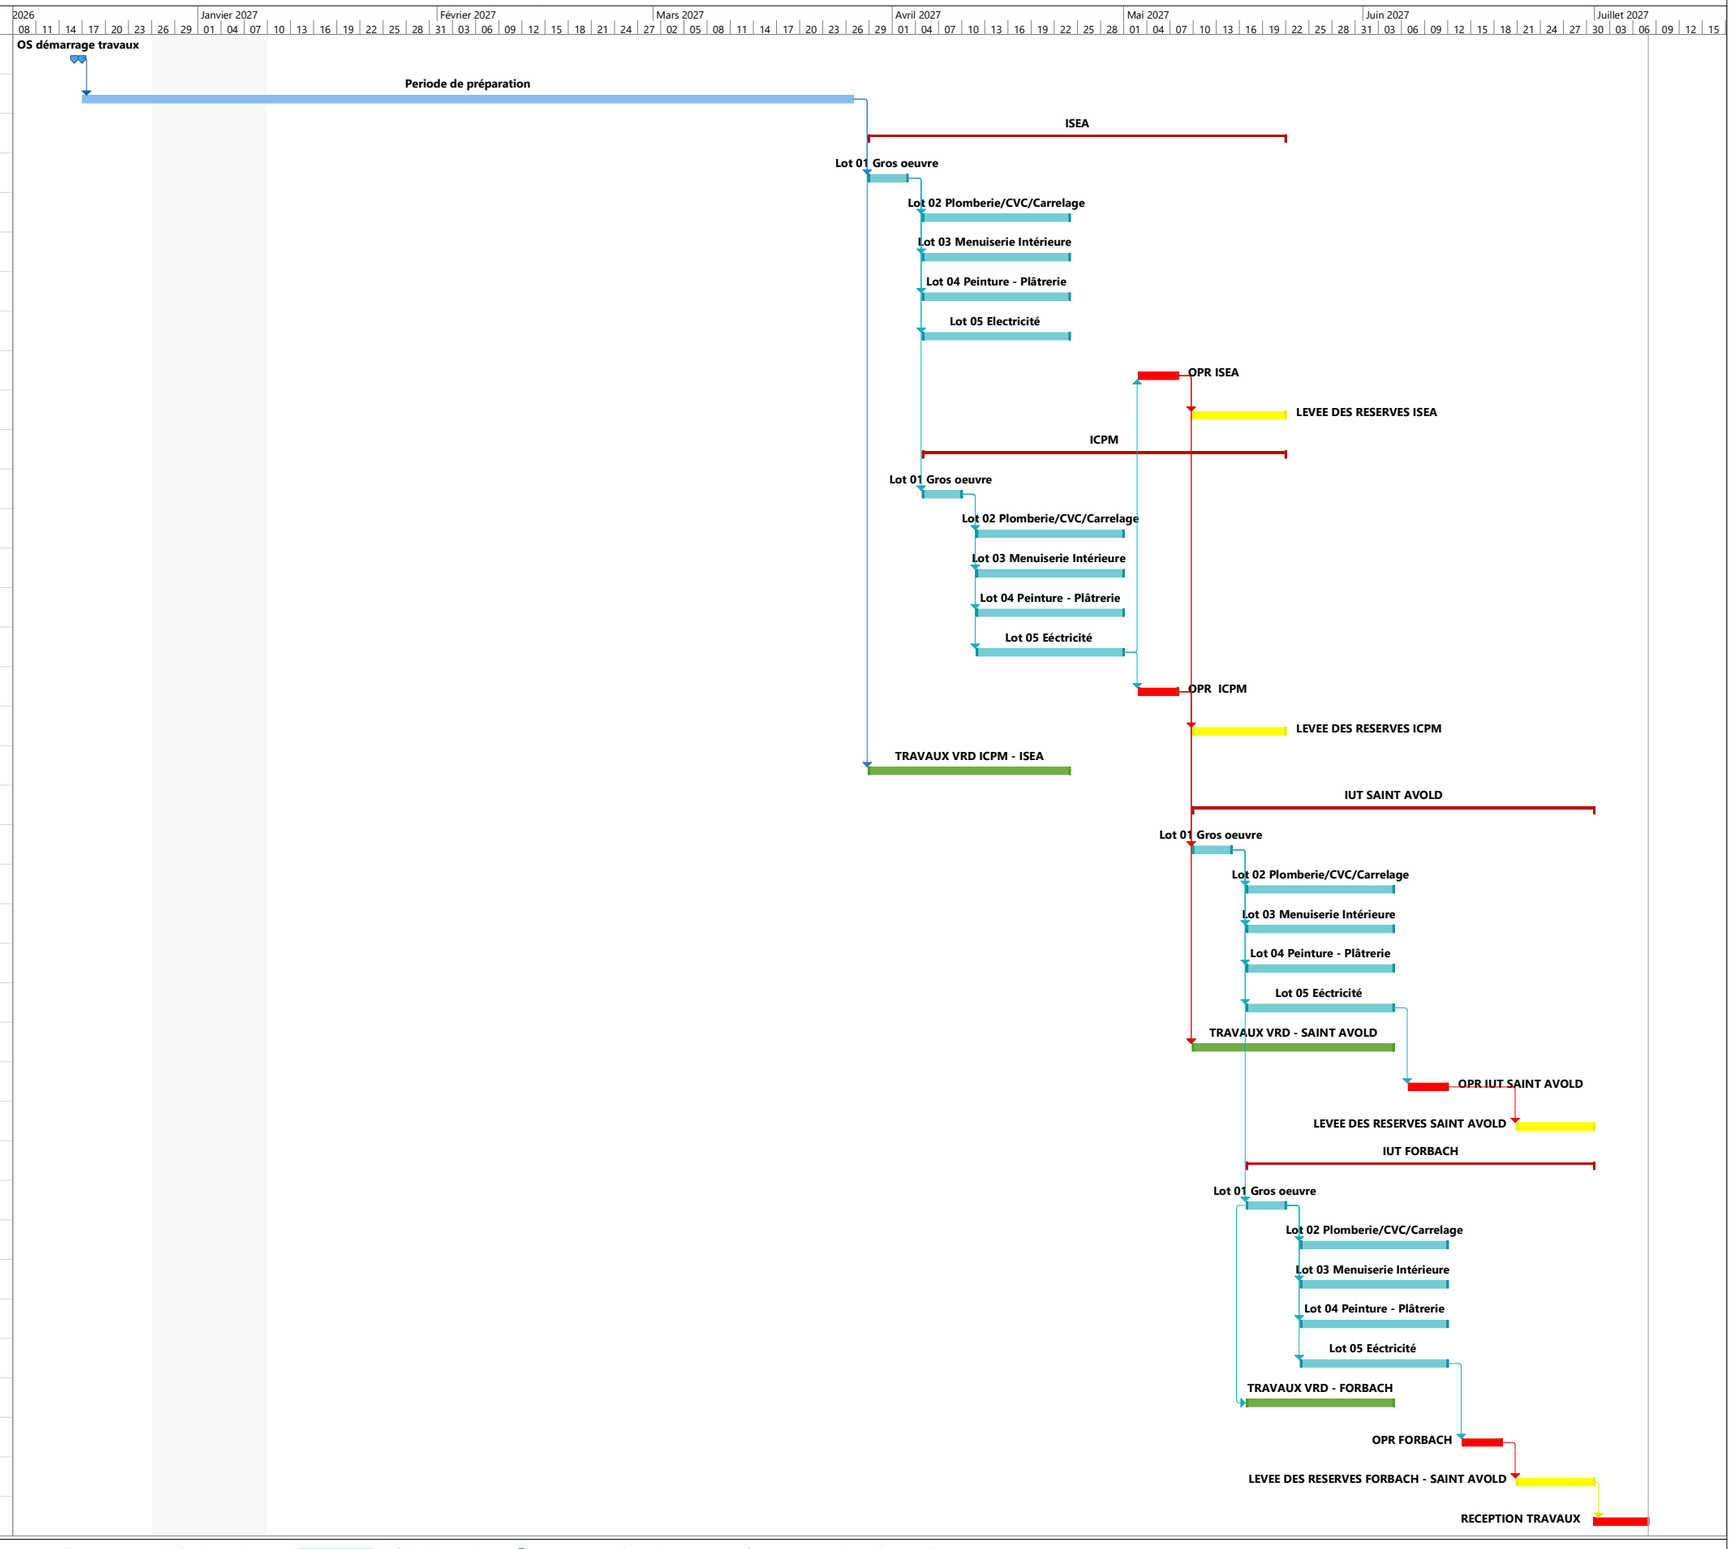

Projet : Projet1
Date : Jeu 15/10/26

Tâche	Récapitulative	Jalon inactif	Durée uniquement	Début uniquement	Jalons externes	Progression manuelle
Fractionnement	Récapitulatif du projet	Récapitulatif inactif	Report récapitulatif manuel	Fin uniquement	Échéance	
Jalon	Tâche inactive	Tâche manuelle	Récapitulatif manuel	Tâches externes	Avancement	
