
FLUX PERSONNEL

CHANTIER

PHASE 0

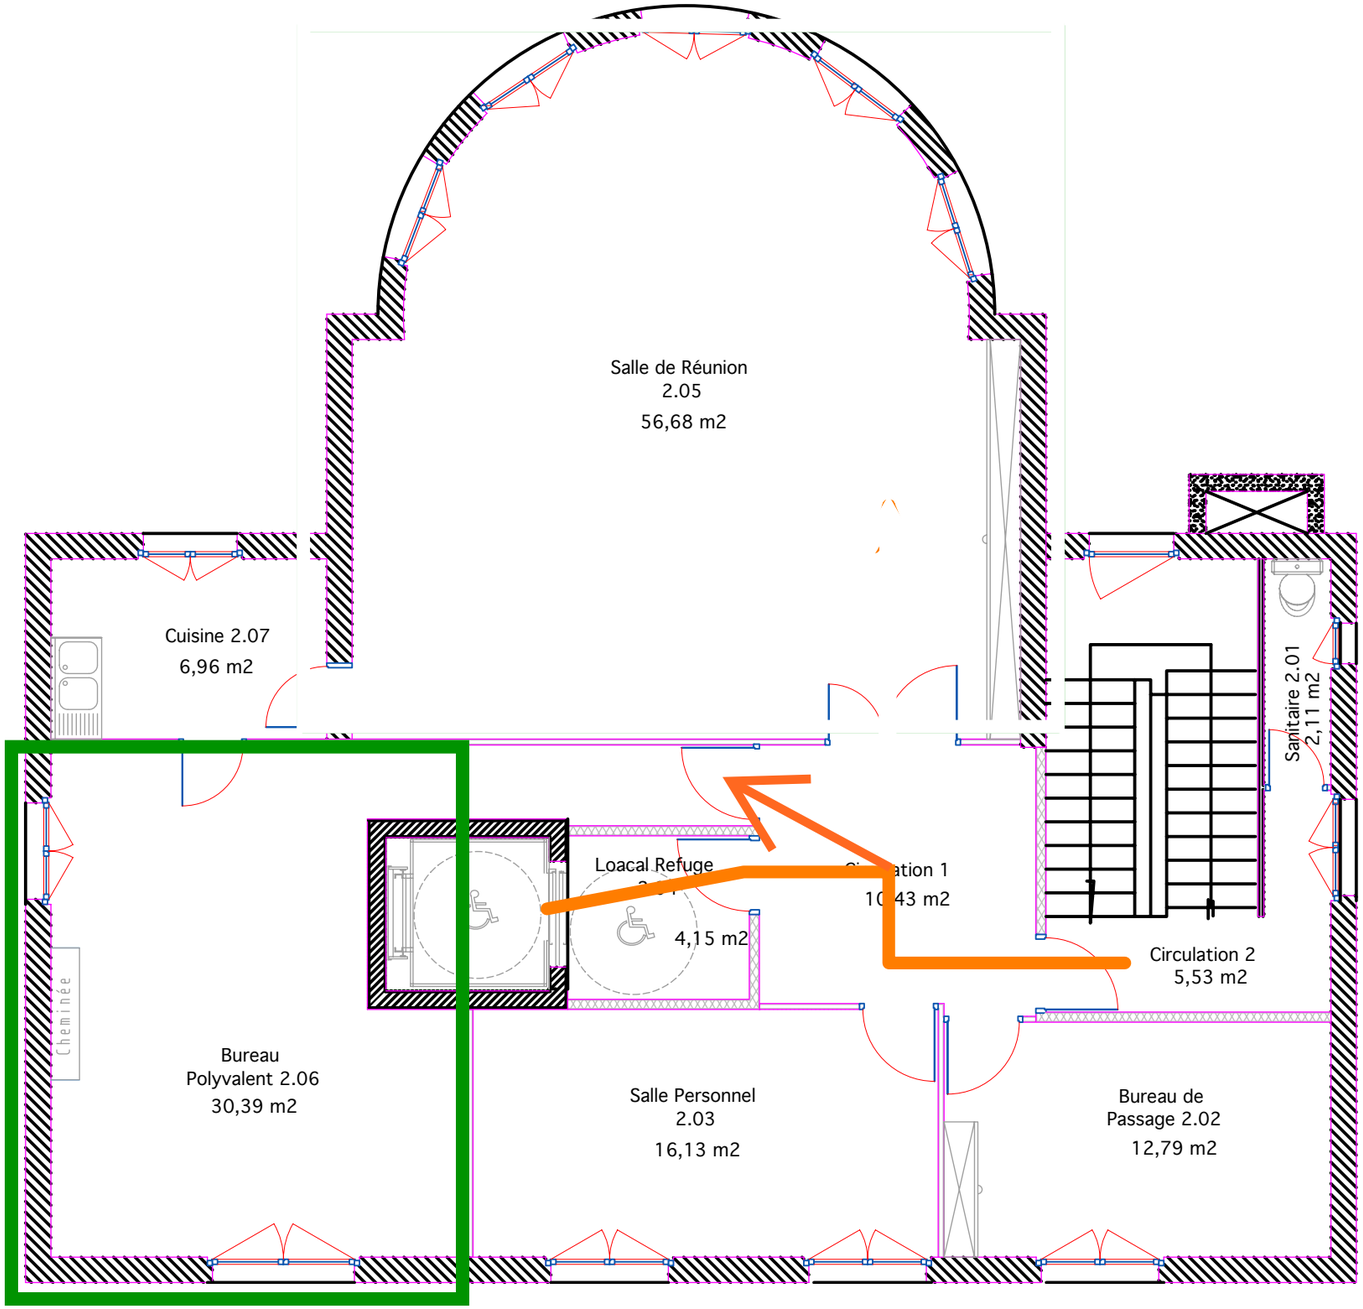

PHASE 0 : 2° étage
Utilisation provisoire de l'étage en bureaux pour l'opération à tiroirs.
Ajouts de prises pour postes de travails.

PHASE 1 : 1° étage
Réalisation dans la même phase des aménagements de bureaux et du rafraichissement des sanitaires.

- Création des ouvertures — 1 sem
- Déposes : cloisons, sols, réseaux, elec, cvc,… — 3 jours pour les bureaux; 2 jours pour le sanitaire
- Travaux de second œuvre — 6 sem bureaux + sanitaire

PHASE 2 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :

- Désamiantage — 1 sem hors période de plan de retrait
- Démolition du sol (marteau piqueur). — 1 sem
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,… — 2 jours
- Renforcement plancher rochelle + platelage — 3 jours
- Travaux de second œuvre — 6 sem

PHASE 3 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :

- Démolition du sol (marteau piqueur). — 2 jours hors période de plan de retrait
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,… — 1 jour
- Travaux de second œuvre — 3 sem

PHASE 4 :
Plusieurs phases de travaux pour la gestion des flux et de l'accueil :

1- Fabrication en atelier des modules préfabriqués du SAUJ et du Poste de sécurité. 4 semaines.
2- Démolition du SAUJ et laisser en maintenance le poste de sécurité. 2 jours
3- Mise en place des nouveaux réseaux.
4- Montage du module poste de sécurité. 2,5 sem
5- Dépose de l'ancien poste de sécurité
6- Montage du module SAUJ et attente enfants 3 sem

PROTECTION CHANTIER


FLUX PERSONNEL

PUBLIC

CHANTIER

PREVENUS

PHASE 1

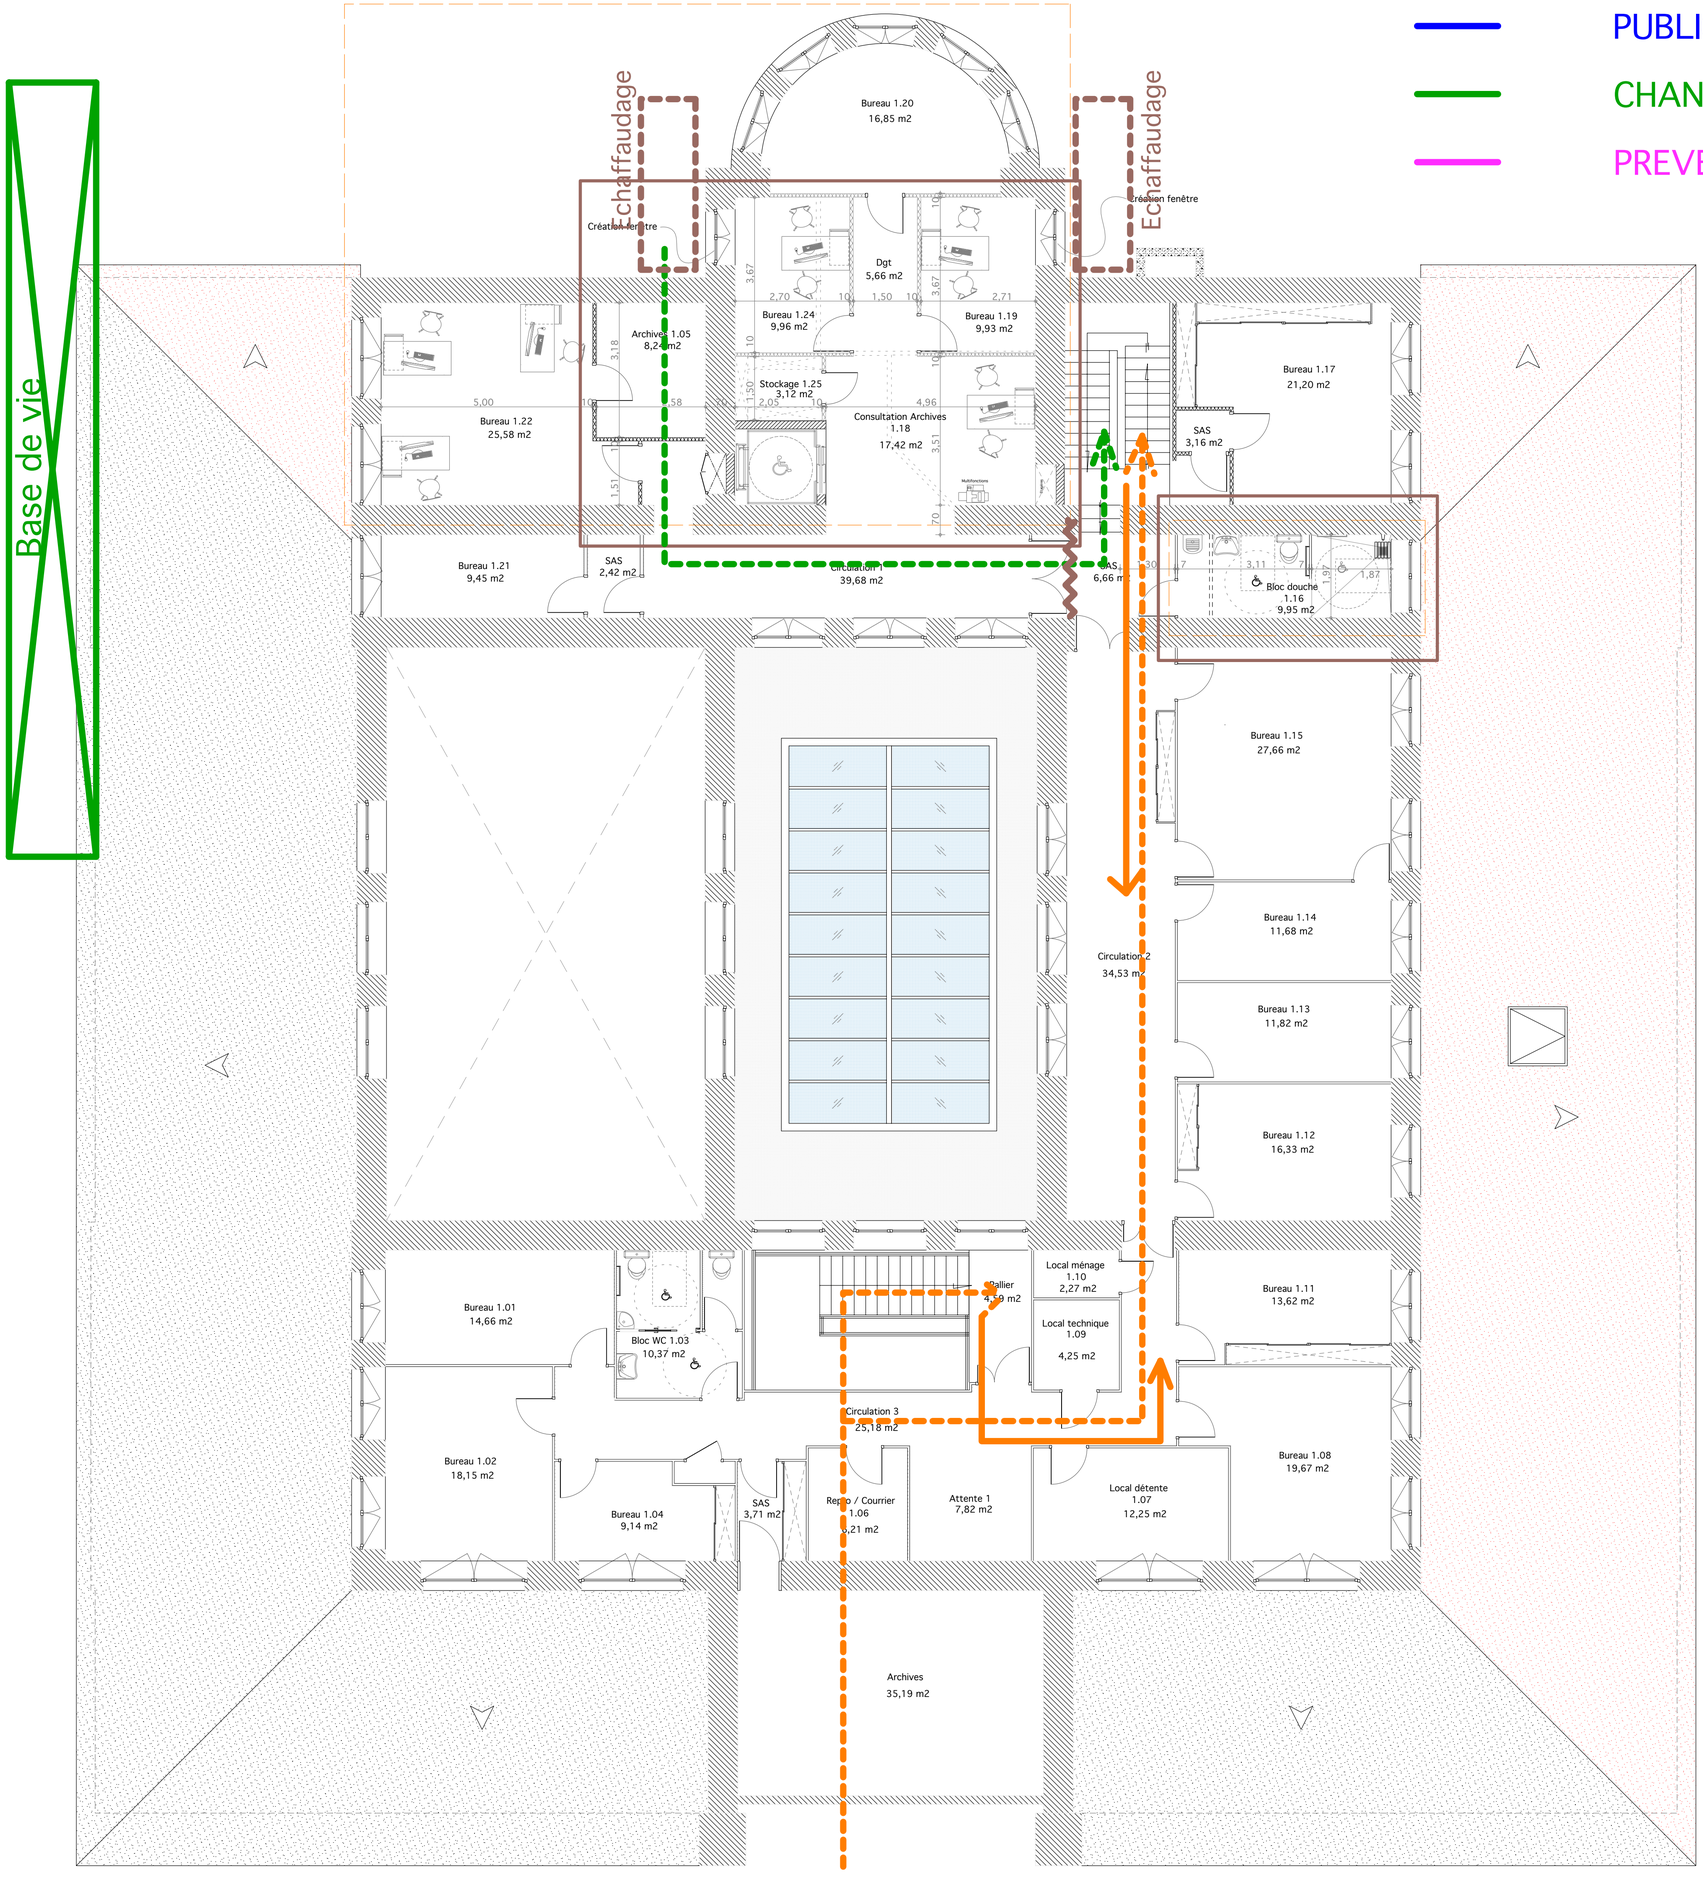

PHASE 0 : 2° étage
Utilisation provisoire de l'étage en bureaux pour l'opération à tiroirs.
Ajouts de prises pour postes de travails.

PHASE 1 : 1° étage
Réalisation dans la même phase des aménagements de bureaux et du rafraichissement des sanitaires.

- Création des ouvertures	- 1 sem
- Déposes : cloisons, sols, réseaux, elec, cvc,…	- 3 jours pour les bureaux - 2 jours pour le sanitaire
- Travaux de second œuvre	- 6 sem bureaux + sanitaire

PHASE 2 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :

- Désamiantage	- 1 sem hors période de plan de retrait
- Démolition du sol (marteau piqueur).	- 1 sem
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,…	- 2 jours
- Renforcement plancher rochelle + platelage	- 3 jours
- Travaux de second œuvre	- 6 sem

PHASE 3 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :

- Démolition du sol (marteau piqueur).	- 2 jours hors période de plan de retrait
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,…	- 1 jour
- Travaux de second œuvre	- 3 sem

PHASE 4 :
Plusieurs phases de travaux pour la gestion des flux et de l'accueil :

1- Fabrication en atelier des modules préfabriqués du SAUJ et du Poste de sécurité. 4 semaines.
2- Démolition du SAUJ et laisser en maintenance le poste de sécurité. 2 jours
3- Mise en place des nouveaux réseaux.
4- Montage du module poste de sécurité. 2,5 sem
5- Dépose de l'ancien poste de sécurité
6- Montage du module SAUJ et attente enfants 3 sem

PHASE 2

FLUX PERSONNEL

PUBLIC

CHANTIER

Base de vie

Base de vie désamiantage

Bureau 0.34
Avocats
16,81 m2

Bureau 0.35
Salle de réunions
Vestiaires
23,30 m2

Archives
0.33
13,94 m2

Reprise plafon coupe feu et obturation du vide sur escalier

Réserve
4,70 m2
0.32

Reprise cloisonnement et porte CF

Bureau 0.31
Greffe correctionnel
24,34 m2

Bureau 0.30
Président
26,03 m2

Bureau 0.01
14,68 m2

Geôle 0.02
6,90 m2

Sas Geôle
5,59 m2

Bureau 0.03
Aud. Cabinet / Délib
22,73 m2

Bureau prévenus
0.04
4,51 m2

Circulation 2
9,6 m2
0.05

Local ménage
0.331
4,09 m2

SAS
1,35 m2

Circulation 1
37,43 m2

SAS
2,15 m2

0.29
Local destructeur
4,41 m2

WC
1,40 m2

Cheminée

WC
7,89 m2
0.06

Circulation 3
31,59 m2

0.09
Local EDF
6,60 m2

TGBT
1,72 m2
0.07

Autocom
1,02 m2
0.08

Tribune
24,35 m2

Salle des pas perdus 1
7,41 m2

Tribune
28,69 m2

Attente tutelles
12,50 m2

Bureau 0.27
Greffe des tutelles
19,35 m2

Bureau 0.10
17,11 m2

0.11
SAS
4,95 m2

0.36
Salle d'audience
80,61 m2

Panneaux acoustiques

0.25
Salle d'audience
75,94 m2

Bureau 0.26
11,60 m2

Bureau 0.12
Chaine Pénale
16,87 m2

HSP mezzanine
2,25m

Bureau 0.23
32,26 m2

Bureau 0.13
Magistrat
17,17 m2

Salle des pas perdus 2
0.23
141,50 m2

HSP
sous solive
2,70 m

HSP
4,50m

Bureau 0.22
15,25 m2

Dgt
12,90 m2

Bureau 0.14
Secrétariat
9,71 m2

0.24
SAUJ
16,45 m2

Sécurité
8,91 m2

Attente enfants
0.37
8,77 m2

HSP
5,05m

HSP
5,05m

HSP
4,50m

Bureau 0.21
10,75 m2

Bureau 0.15
Procureur
24,55 m2

0.16
Sanitaires
12,87 m2

0.17
Salle de réunion
Bibliothèque
22,06 m2

Parvis
78,47 m2

0.18
Application des peines Magistrat
19,29 m2

0.19
Application des Peines
12,75 m2

SAS
2,29 m2

Bureau 0.20
Greffier en chef
24,55 m2

Ht plafond 3,05

Ht plafond 1,70

Hauteur sur rochelle

Hauteur plafond 1,97

Hauteur plafond 1,70

Combles

Local Baie
0.38
11,04 m2

Hauteur plafond 3,05

±2,56

Bureaux Mezzanine
0.39
27,47 m2

Hauteur plafond 1,60

Vide sur Grilles

Dessus bureaux
(plafond plâtrerie)

±2,56

HSP
4,50m

PHASE 0 : 2° étage
Utilisation provisoire de l'étage en bureaux pour l'opération à tiroirs.
Ajouts de prises pour postes de travails.

PHASE 1 : 1° étage
Réalisation dans la même phase des aménagements de bureaux et du rafraichissement des sanitaires.

- Création des ouvertures	- 1 sem
- Déposes : cloisons, sols, réseaux, elec, cvc,…	- 3 jours pour les bureaux
	- 2 jours pour le sanitaire
- Travaux de second œuvre	- 6 sem bureaux + sanitaire

PHASE 2 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :

- Désamiantage	- 1 sem hors période de plan de retrait
- Démolition du sol (marteau piqueur).	- 1 sem
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,…	- 2 jours
- Renforcement plancher rochelle + platelage	- 3 jours
- Travaux de second œuvre	- 6 sem

PHASE 3 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :

- Démolition du sol (marteau piqueur).	- 2 jours hors période de plan de retrait
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,…	- 1 jour
- Travaux de second œuvre	- 3 sem

PHASE 4 :
Plusieurs phases de travaux pour la gestion des flux et de l'accueil :

1- Fabrication en atelier des modules préfabriqués du SAUJ et du Poste de sécurité. 4 semaines.
2- Démolition du SAUJ et laisser en maintenance le poste de sécurité. 2 jours
3- Mise en place des nouveaux réseaux.
4- Montage du module poste de sécurité. 2,5 sem
5- Dépose de l'ancien poste de sécurité
6- Montage du module SAUJ et attente enfants 3 sem

PHASE 3

FLUX PERSONNEL

PUBLIC

CHANTIER

PREVENUS

Base de vie

PHASE 0 : 2° étage
Utilisation provisoire de l'étage en bureaux pour l'opération à tiroirs.
Ajouts de prises pour postes de travails.

PHASE 1 : 1° étage
Réalisation dans la même phase des aménagements de bureaux et du rafraichissement des sanitaires.

- Création des ouvertures	- 1 sem
- Déposes : cloisons, sols, réseaux, elec, cvc,…	- 3 jours pour les bureaux
	- 2 jours pour le sanitaire
- Travaux de second œuvre	- 6 sem bureaux + sanitaire

PHASE 2 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :


- Désamiantage	- 1 sem hors période de plan de retrait
- Démolition du sol (marteau piqueur).	- 1 sem
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,…	- 2 jours
- Renforcement plancher rochelle + platelage	- 3 jours
- Travaux de second œuvre	- 6 sem

PHASE 3 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :

- Démolition du sol (marteau piqueur).	- 2 jours hors période de plan de retrait
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,…	- 1 jour
- Travaux de second œuvre	- 3 sem

PHASE 4 :
Plusieurs phases de travaux pour la gestion des flux et de l'accueil :

1- Fabrication en atelier des modules préfabriqués du SAUJ et du Poste de sécurité. 4 semaines.
2- Démolition du SAUJ et laisser en maintenance le poste de sécurité. 2 jours
3- Mise en place des nouveaux réseaux.
4- Montage du module poste de sécurité. 2,5 sem
5- Dépose de l'ancien poste de sécurité
6- Montage du module SAUJ et attente enfants 3 sem

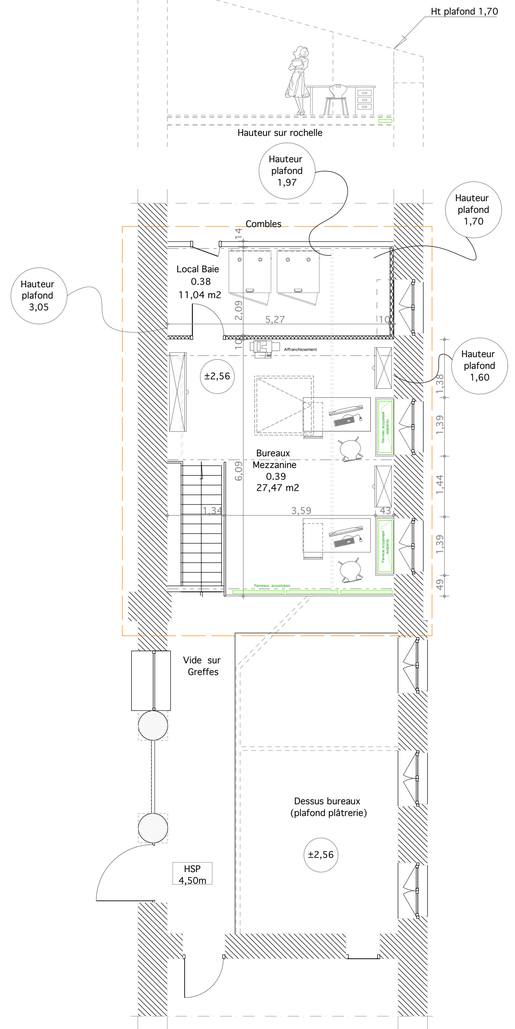

PROTECTION CHANTIER

FLUX PERSONNEL

PUBLIC

CHANTIER

PREVENUS

PHASE 4/1

PHASE 0 : 2° étage
Utilisation provisoire de l'étage en bureaux pour l'opération à tiroirs.
Ajouts de prises pour postes de travails.

PHASE 1 : 1° étage
Réalisation dans la même phase des aménagements de bureaux et du rafraichissement des sanitaires.

- Création des ouvertures	- 1 sem
- Déposes : cloisons, sols, réseaux, elec, cvc,…	- 3 jours pour les bureaux
	- 2 jours pour le sanitaire
- Travaux de second œuvre	- 6 sem bureaux + sanitaire

PHASE 2 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :


- Désamiantage	- 1 sem hors période de plan de retrait
- Démolition du sol (marteau piqueur).	- 1 sem
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,…	- 2 jours
- Renforcement plancher rochelle + platelage	- 3 jours
- Travaux de second œuvre	- 6 sem

PHASE 3 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :

- Démolition du sol (marteau piqueur).	- 2 jours hors période de plan de retrait
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,…	- 1 jour
- Travaux de second œuvre	- 3 sem

PHASE 4 :
Plusieurs phases de travaux pour la gestion des flux et de l'accueil :

1- Fabrication en atelier des modules préfabriqués du SAUJ et du Poste de sécurité. 4 semaines.
2- Démolition du SAUJ et laisser en maintenance le poste de sécurité. 2 jours
3- Mise en place des nouveaux réseaux.
4- Montage du module poste de sécurité. 2,5 sem
5- Dépose de l'ancien poste de sécurité
6- Montage du module SAUJ et attente enfants 3 sem

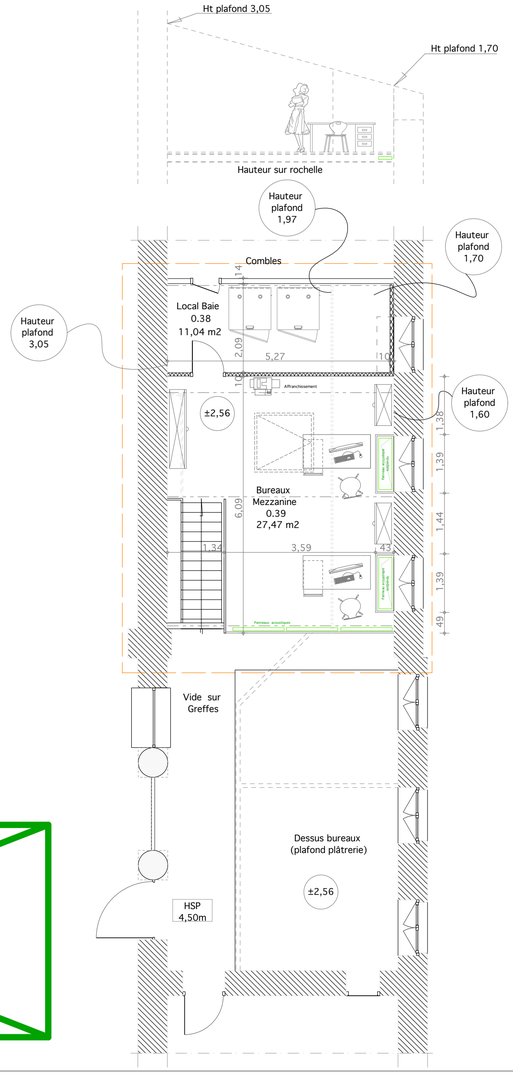

PROTECTION CHANTIER

Accueil Provisoire

FLUX PERSONNEL

PUBLIC

CHANTIER

PREVENUS

PHASE 4/2

PHASE 0 : 2° étage
Utilisation provisoire de l'étage en bureaux pour l'opération à tiroirs.
Ajouts de prises pour postes de travails.

PHASE 1 : 1° étage
Réalisation dans la même phase des aménagements de bureaux et du rafraichissement des sanitaires.

- Création des ouvertures	- 1 sem
- Déposes : cloisons, sols, réseaux, elec, cvc,…	- 3 jours pour les bureaux
	- 2 jours pour le sanitaire
- Travaux de second œuvre	- 6 sem bureaux + sanitaire

PHASE 2 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :

- Désamiantage	- 1 sem hors période de plan de retrait
- Démolition du sol (marteau piqueur).	- 1 sem
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,…	- 2 jours
- Renforcement plancher rochelle + platelage	- 3 jours
- Travaux de second œuvre	- 6 sem

PHASE 3 :
Une des zones de travaux les plus bruyantes, avec :

- Démolition du sol (marteau piqueur).	- 2 jours hors période de plan de retrait
- Déposes : cloisons, réseaux, elec, cvc,…	- 1 jour
- Travaux de second œuvre	- 3 sem

PHASE 4 :
Plusieurs phases de travaux pour la gestion des flux et de l'accueil :

1- Fabrication en atelier des modules préfabriqués du SAUJ et du Poste de sécurité. 4 semaines.
2- Démolition du SAUJ et laisser en maintenance le poste de sécurité. 2 jours
3- Mise en place des nouveaux réseaux.
4- Montage du module poste de sécurité. 2,5 sem
5- Dépose de l'ancien poste de sécurité
6- Montage du module SAUJ et attente enfants 3 sem

