Trois hangarettes

3 nov. 2026

MAE

http://

Chef de projet	Vincent LASCASSIES
Dates du projet	23 déc. 2026 - 12 nov. 2027
Avancée	0%
Tâches	19
Ressources	1

Ce planning prévisionnel concerne le marché de fourniture et l'installation de trois hangarettes aéronautiques modulaires permettant d’abriter des aéronefs de collection sur le tarmac du Musée de l’Air et de l’Espace.

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
Notification OS démarrage	23/12/2026	23/12/2026	0
EXE	11/01/2027	04/06/2027	105
Réalisation des EXE	11/01/2027	05/02/2027	20
Présentation	08/02/2027	08/02/2027	0
Validation	08/02/2027	19/02/2027	10
Reprise des EXE selon observations	22/02/2027	12/03/2027	15
Présentation	15/03/2027	15/03/2027	0
Validation	15/03/2027	26/03/2027	10
Projet validé	29/03/2027	29/03/2027	0
Approvisionnement/Fabrication	29/03/2027	04/06/2027	50
SIAE	29/03/2027	03/09/2027	114
Installations	29/03/2027	11/06/2027	55
Salon	14/06/2027	18/06/2027	5
Repli des installations	21/06/2027	03/09/2027	54
INTERVENTION SUR SITE	06/09/2027	10/11/2027	47
Installation de chantier	06/09/2027	08/09/2027	3
Réalisation des prestations	09/09/2027	20/10/2027	30
Repli des installations	21/10/2027	27/10/2027	5
Réception	12/11/2027	12/11/2027	0

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Vincent LASCASSIES	Chef de projet

Diagramme de Gantt

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

MUSÉE AIR + ESPACE
AÉROPORT PARIS – LE BOURGET

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
Notification OS démarrage	23/12/2026	23/12/2026	0
EXE	11/01/2027	04/06/2027	105
Réalisation des EXE	11/01/2027	05/02/2027	20
Présentation	08/02/2027	08/02/2027	0
Validation	08/02/2027	19/02/2027	10
Reprise des EXE selon observations	22/02/2027	12/03/2027	15
Présentation	15/03/2027	15/03/2027	0
Validation	15/03/2027	26/03/2027	10
Projet validé	29/03/2027	29/03/2027	0
Approvisionnement/Fabrication	29/03/2027	04/06/2027	50
SIAE	29/03/2027	03/09/2027	114
INTERVENTION SUR SITE	06/09/2027	10/11/2027	47
Installation de chantier	06/09/2027	08/09/2027	3
Réalisation des prestations	09/09/2027	20/10/2027	30
Repli des installations	21/10/2027	27/10/2027	5
Réception	12/11/2027	12/11/2027	0

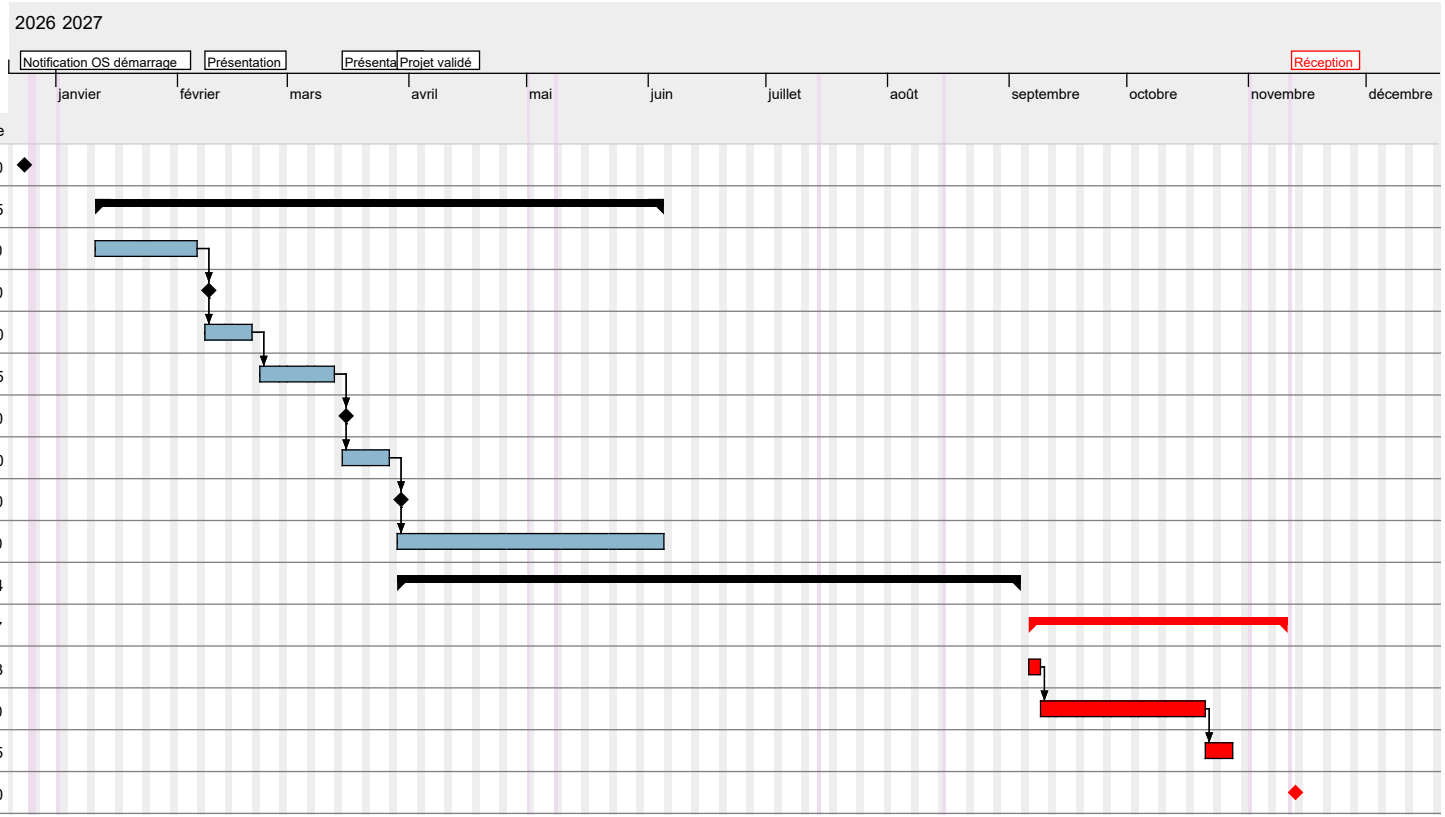


Diagramme des Ressources

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

MUSÉE AIR + ESPACE
AÉROPORT PARIS – LE BOURGET

Nom	Rôle par défaut
Vincent LASCASSI...	Chef de projet

