
PHA-01 | RDC — phasage de démolition des cloisons

R-DÉM — maintenir un chemin de charge complet pendant toute modification des appuis.

PROJET — SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS


D1

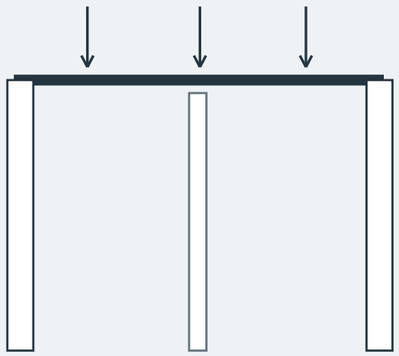

RECONNAÎTRE ET PRÉPARER

Repérer les cloisons à déposer, les refends et trumeaux à conserver, les réseaux et les éléments portés. État initial des niveaux et fissures ; protections et organisation de l’évacuation.


D2

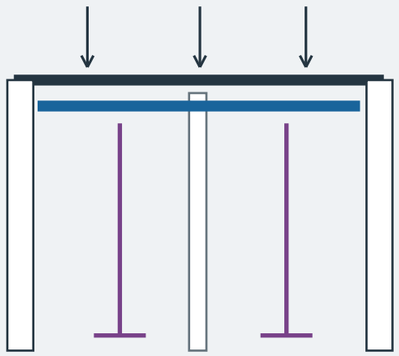

FONDER, ÉTAYER, POSER

Réceptionner les reprises en caves. Installer l’étaiement avec descente des charges jusqu’à une assise reconnue. Ouvrir les empochements et poser T-01 puis L-01 / L-02 et les attaches.


D3

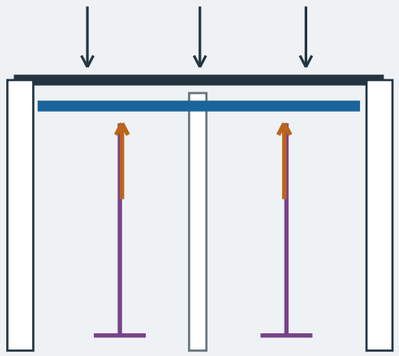

METTRE EN CONTACT

Engager les reprises par paliers mesurés sans relèvement arbitraire. Verrouiller les appuis, attendre la résistance des produits de clavage et réceptionner les assemblages avant la première déconnexion.


D4

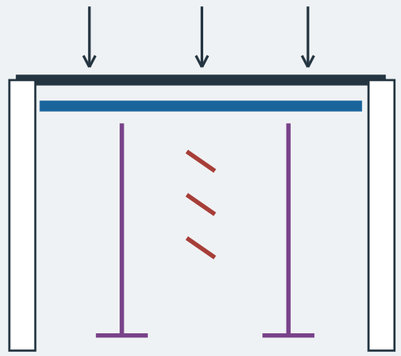

DÉMOLIR PAR SÉQUENCES

Déconnecter et déposer par petites fractions suivant la méthode de démolition. Préserver les panneaux conservés ; ni chocs importants ni arrachement des têtes. Évacuer au fur et à mesure et contrôler à chaque changement d’état.

D5

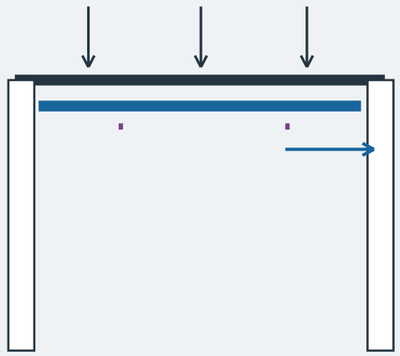

TRANSFÉRER ET RÉCEPTIONNER

Retirer les étais progressivement après achèvement et réception des liaisons définitives. Suivre les déplacements et fissures ; rétablir les protections et les finitions. Maintenir les restrictions de charge jusqu’à réception.

Points d’arrêt : réception des fondations et de l’étaiement ; réception des poches et attaches ; contrôle de la mise en contact avant déconnexion ; mesures après chaque séquence ; réception avant désétaiement. Arrêter en cas de déplacement ou fissuration dépassant les seuils fixés par l’EXE. Les gravats ne sont jamais stockés sur un plancher non justifié pour cette surcharge.
