

PLANNING D'INTERVENTION DES TRAVAUX

Reprise des épaufrures, de l'étanchéité et réfection des gardes-corps des bâtiments des compagnies (École de Gendarmerie – Caserne RICHEMONT Montluçon 03)

Ecole de gendarmerie - caserne Richemont
95 Avenue Jules Guesde 03102 MONTLUÇON

Maître d'ouvrage : SGAMI SUD-EST



LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE

De l'idée à la réalisation ...

Planning détaillé pour 1 bâtiment

SEMAINE						
LOTS						
		Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5
LOT n°1 Maçonnerie - Installation de chantier Echafaudage	FERIÉ	<div>Montage des échafaudages (4 balcons) Mise en place des gardes-corps provisoires aux porte-fenêtres Sécurisation du chantier (barrières vauban)</div> <div>1ère Travée2ème Travée</div> <div>Dépose des chapes et des profils de rive</div>	<div>1ère Travée</div> <div>Mise en place des plats carbone + réalisation des chapes sur les bacons</div>	<div>SECHAGE DES CHAPES</div> <div>2ème Travée</div> <div>SECHAGE DES CHAPES</div> <div>Mise en place des plats carbone + réalisation des chapes sur les bacons</div>	<div>Reprise d'enduit au droit des scellements des barres d'appuis reposées</div>	<div>Démontage des échafaudages</div> <div>1ère Travée2ème Travée</div> <div>Reprise d'enduit au droit des scellements des balcons</div> <div>Peinture des sous-faces des balcons</div>
LOT n°2 Pierre - Traitement de façade	FERIÉ	<div>Dépose des barres d'appuis des fenêtres</div>		<div>BALCONS 1ère TRAVÉE INACCESSIBLES</div> <div>BALCONS 2ème TRAVÉE INACCESSIBLES</div>		
LOT n°3 Etanchéité - Résines - chéneaux	FERIÉ	<div>Réfection des chéneaux</div>		<div>1ère Travée2ème Travée</div> <div>Réalisation de l'étanchéité + goutte d'eau sur les balcons</div>		
LOT n°4 Serrurerie - Metallerie	FERIÉ	<div>1ère Travée2ème Travée</div> <div>Dépose des gardes-corps des 4 balcons</div>		<div>TRAVAIL EN ATELIER</div> <div>Sablage, application d'un traitement anti-rouille et mise en peinture des garde-corps et barres d'appuis</div>	<div>1ère Travée2ème Travée</div> <div>Repose des gardes-corps des balcons et des consoles</div>	

PLANNING D'INTERVENTION DES TRAVAUX

Ecole de gendarmerie - caserne Richemont
95 Avenue Jules Guesde 03102 MONTLUCON


Maître d'ouvrage : SGAMI SUD-EST



LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE

... De l'idée à la réalisation ...

Planning général

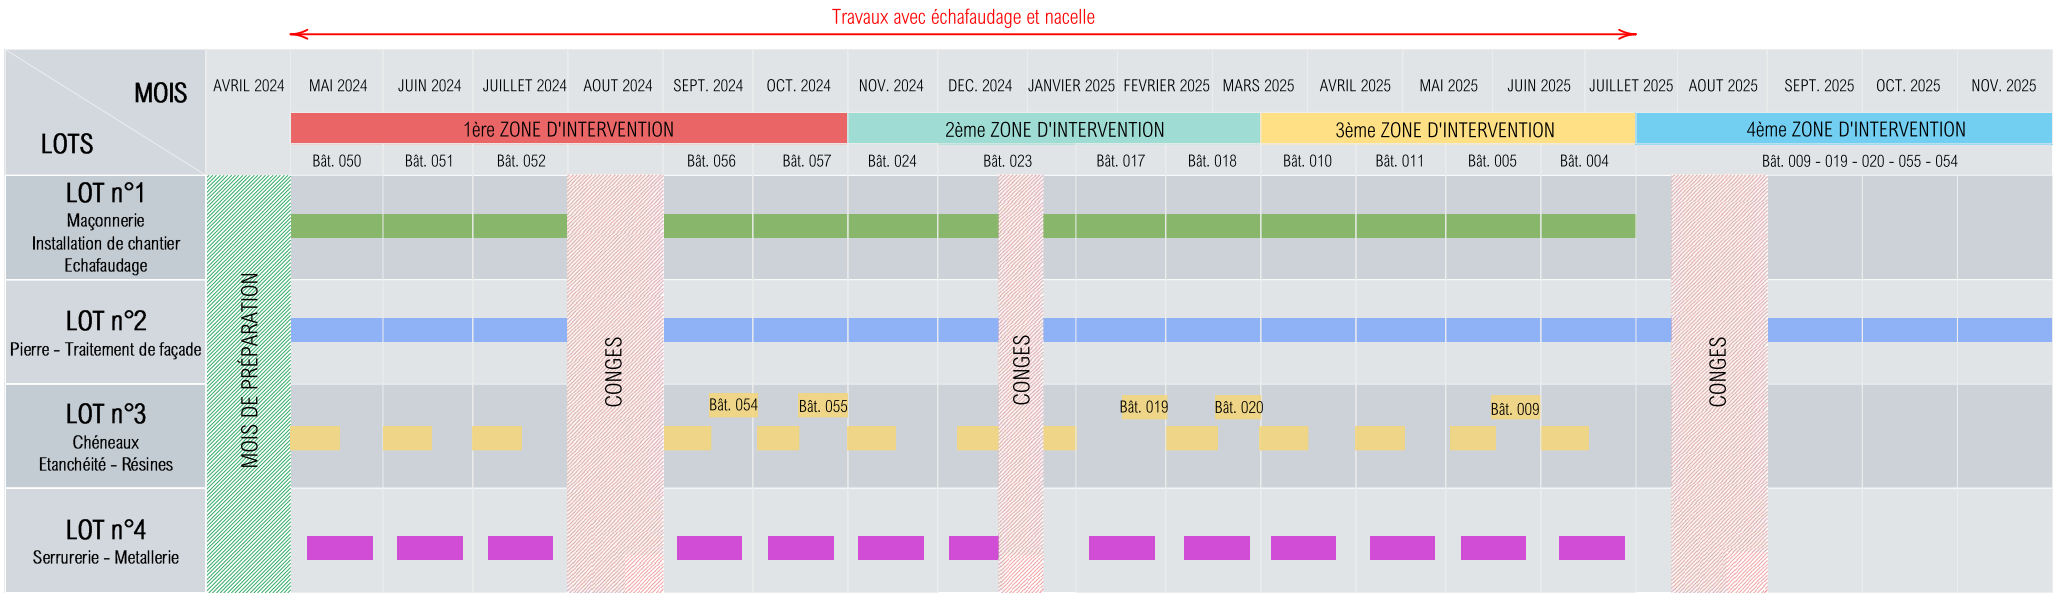

DUREE DES TRAVAUX : 20 mois dont 1 mois de préparation et 2,5 mois de congés.
Un delta de 3 mois sera prévu pour palier les périodes d'intempérie.
