



Plan de la porcherie

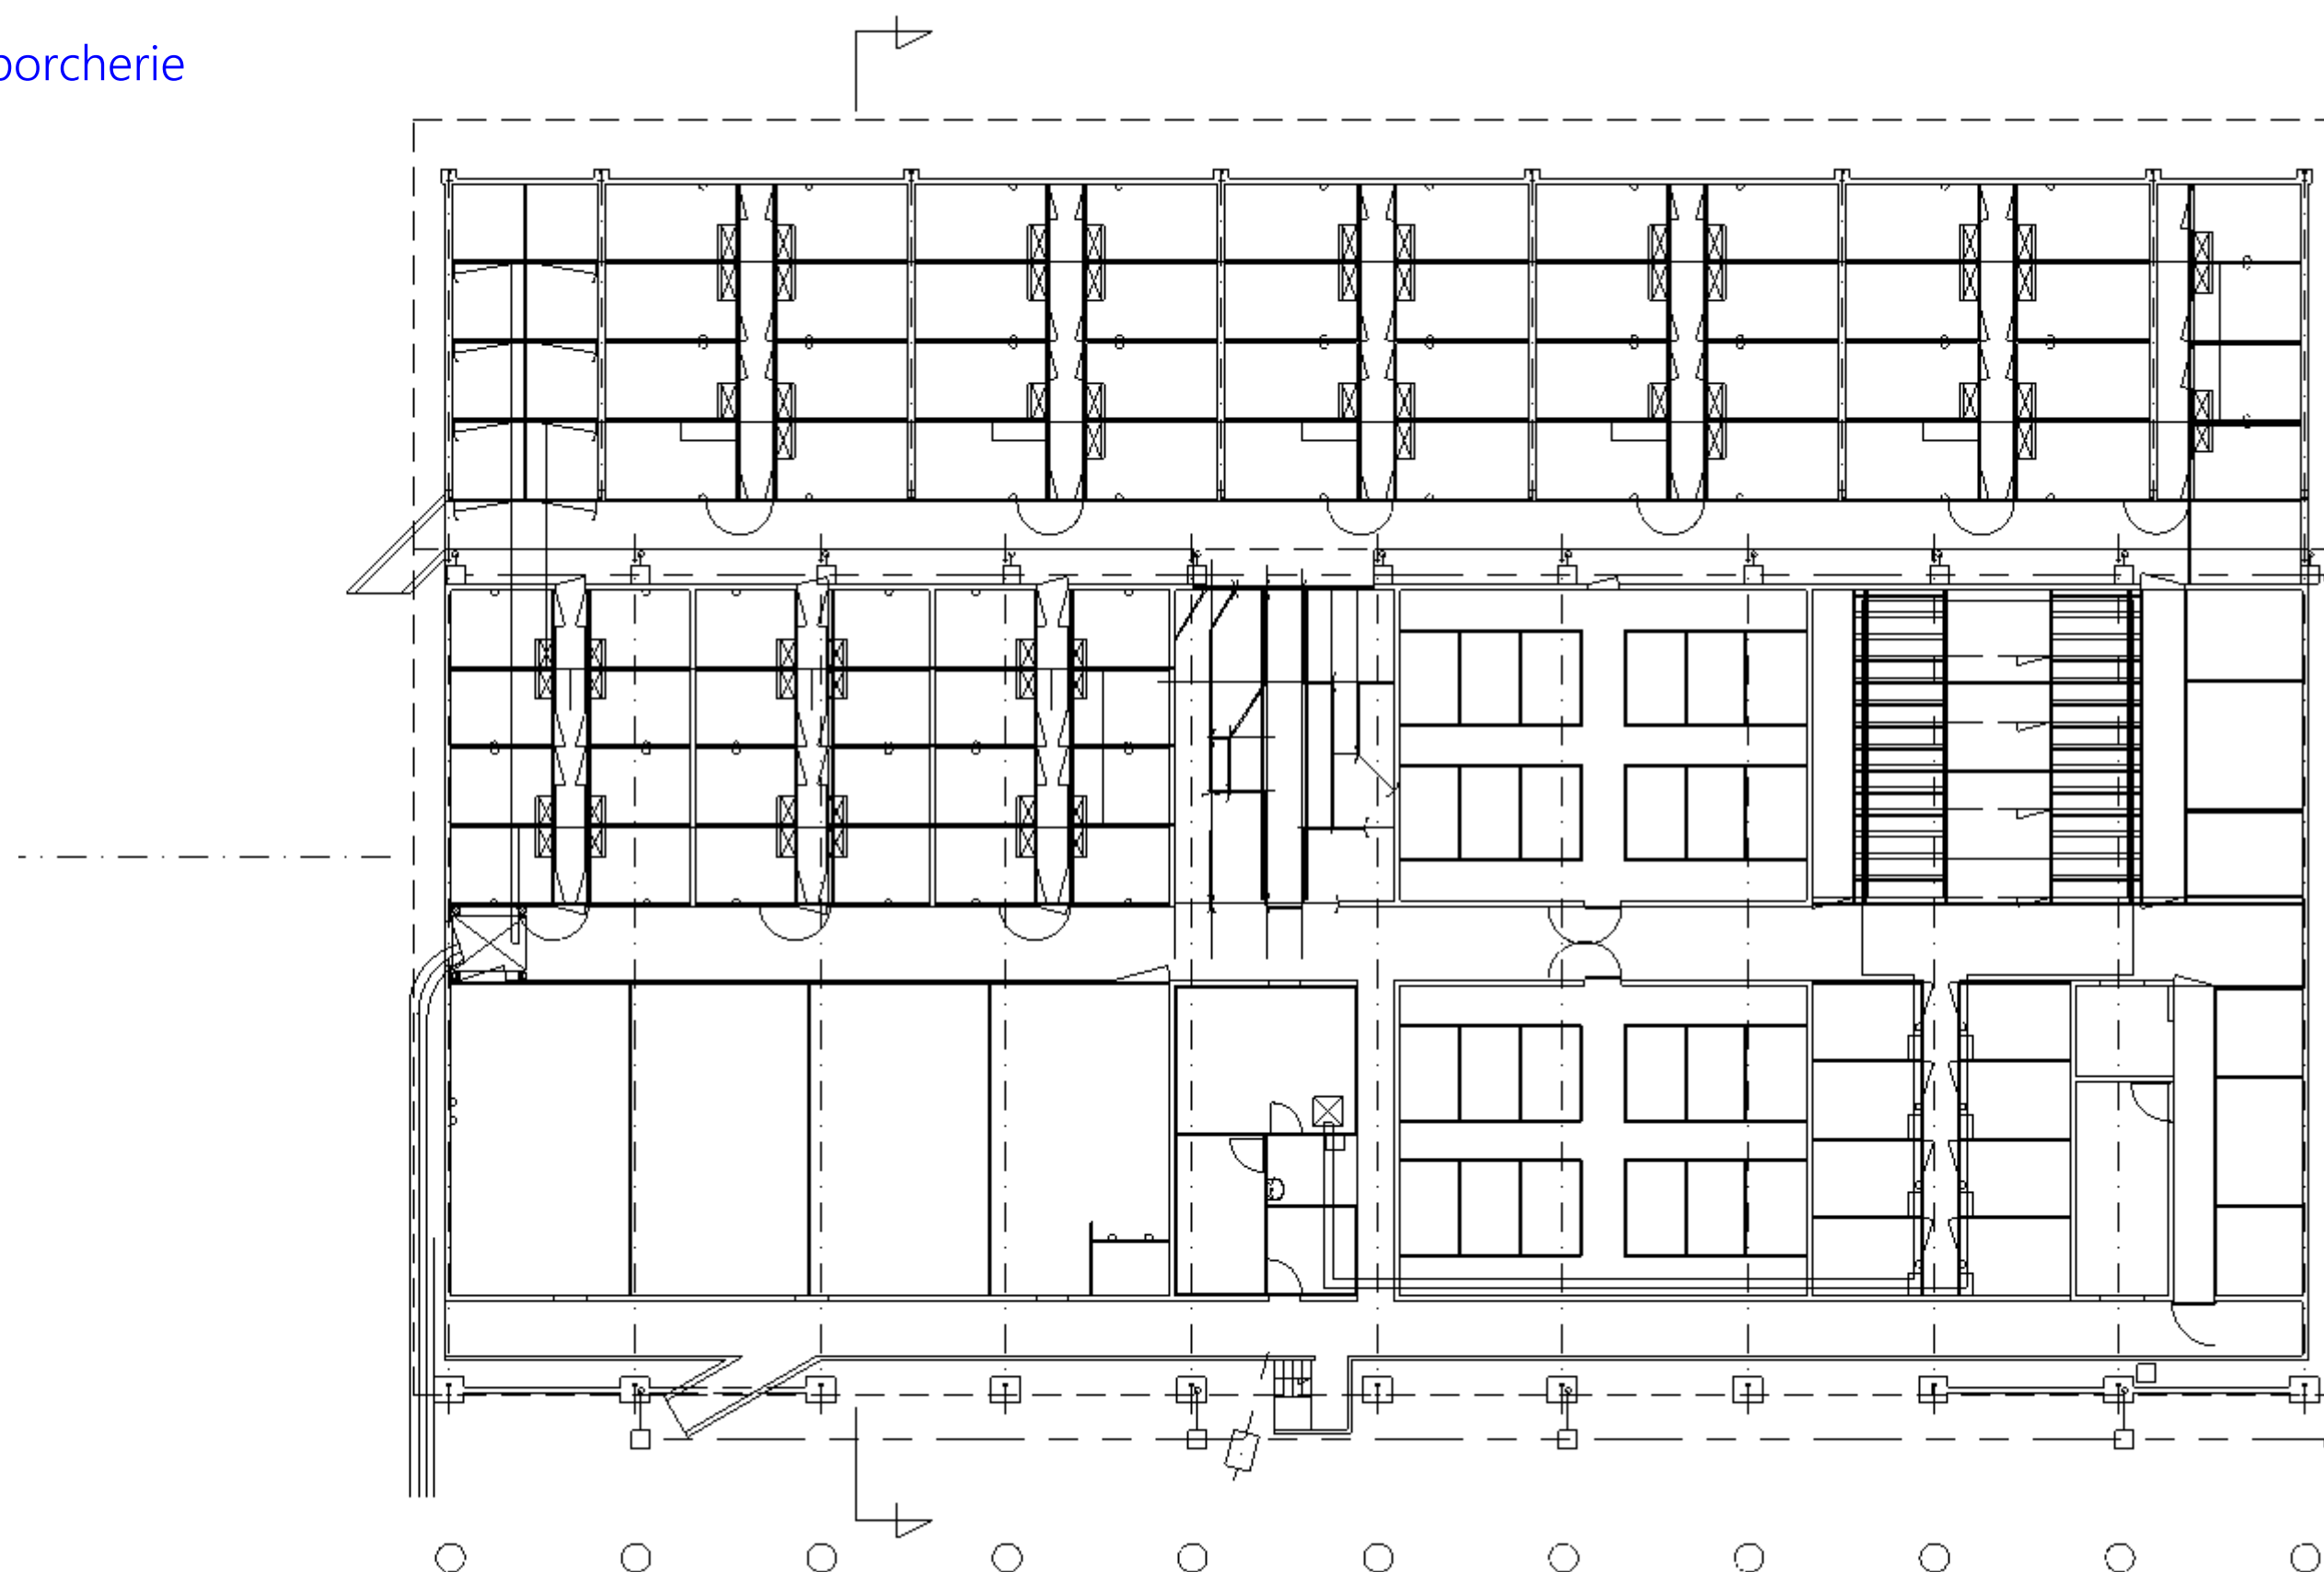

Couvreur :
Identification des zones
immobilisées de 1 à 4



Immobilisée

- zone 1
- zone 2
- zone 3
- zone 4

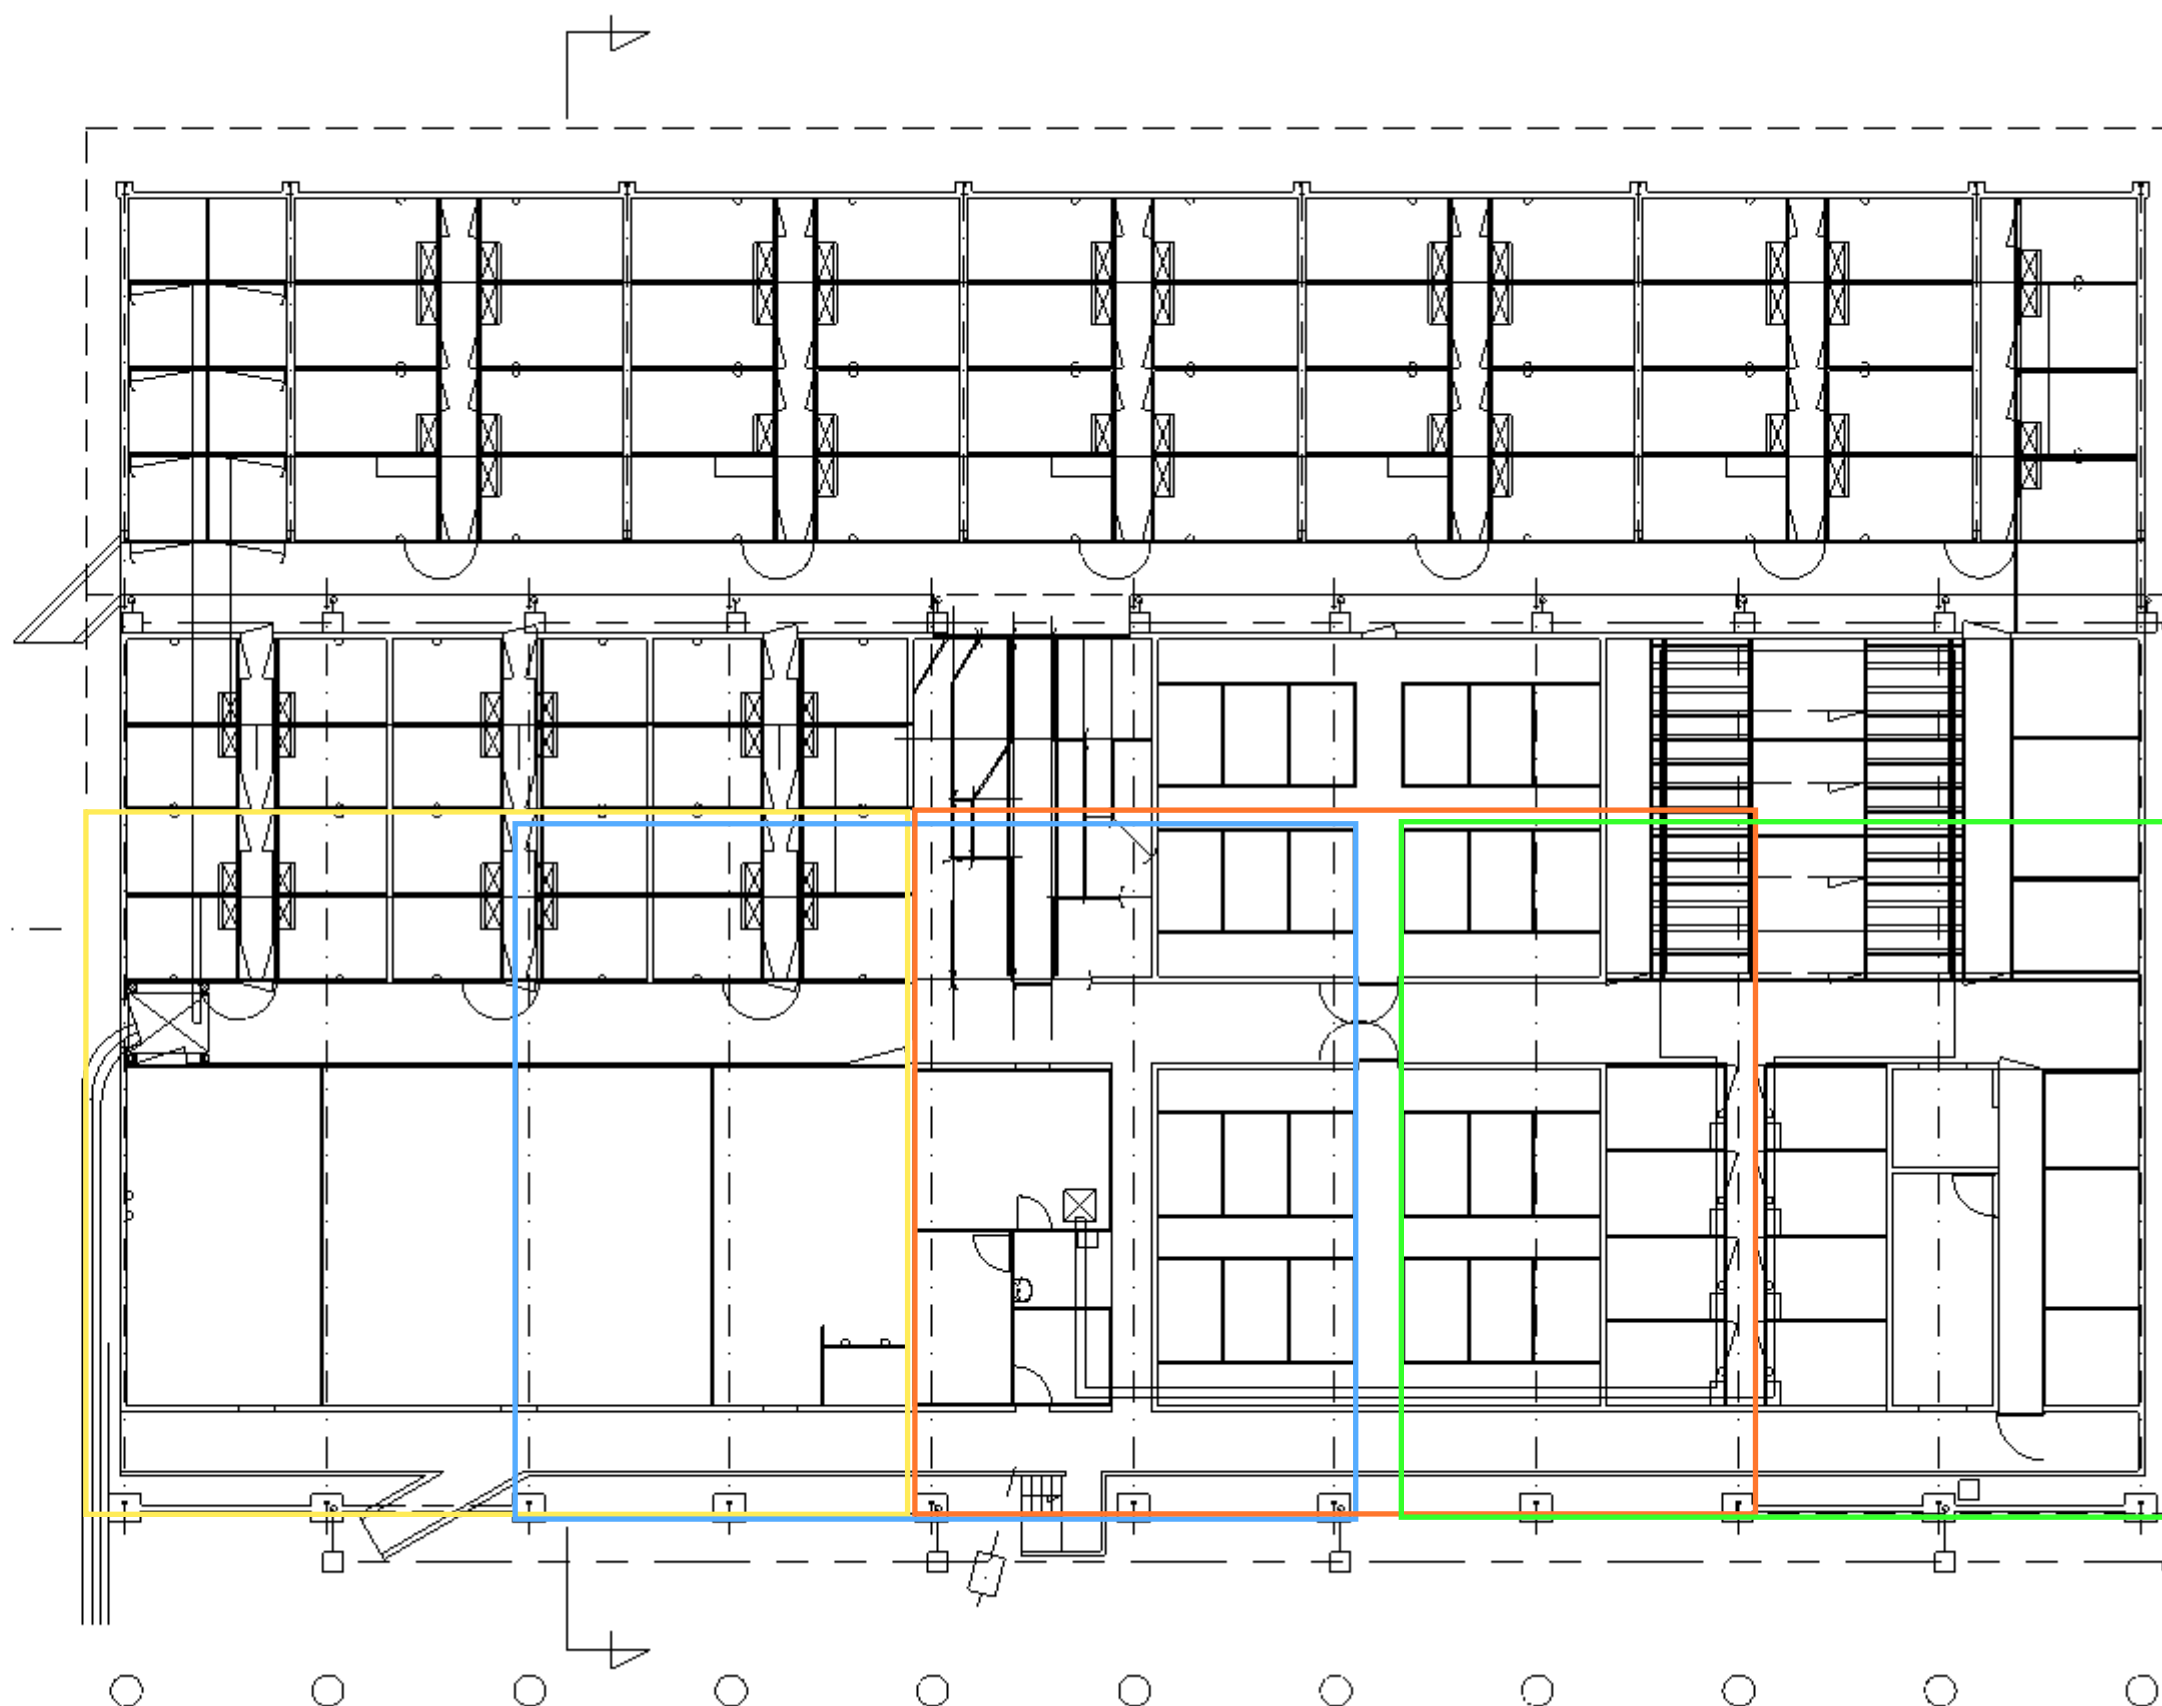



Couvreur :
Identification des zones
travaillées dans les zones
immobilisées de 1 à 4

Immobilisée *Travaillée*

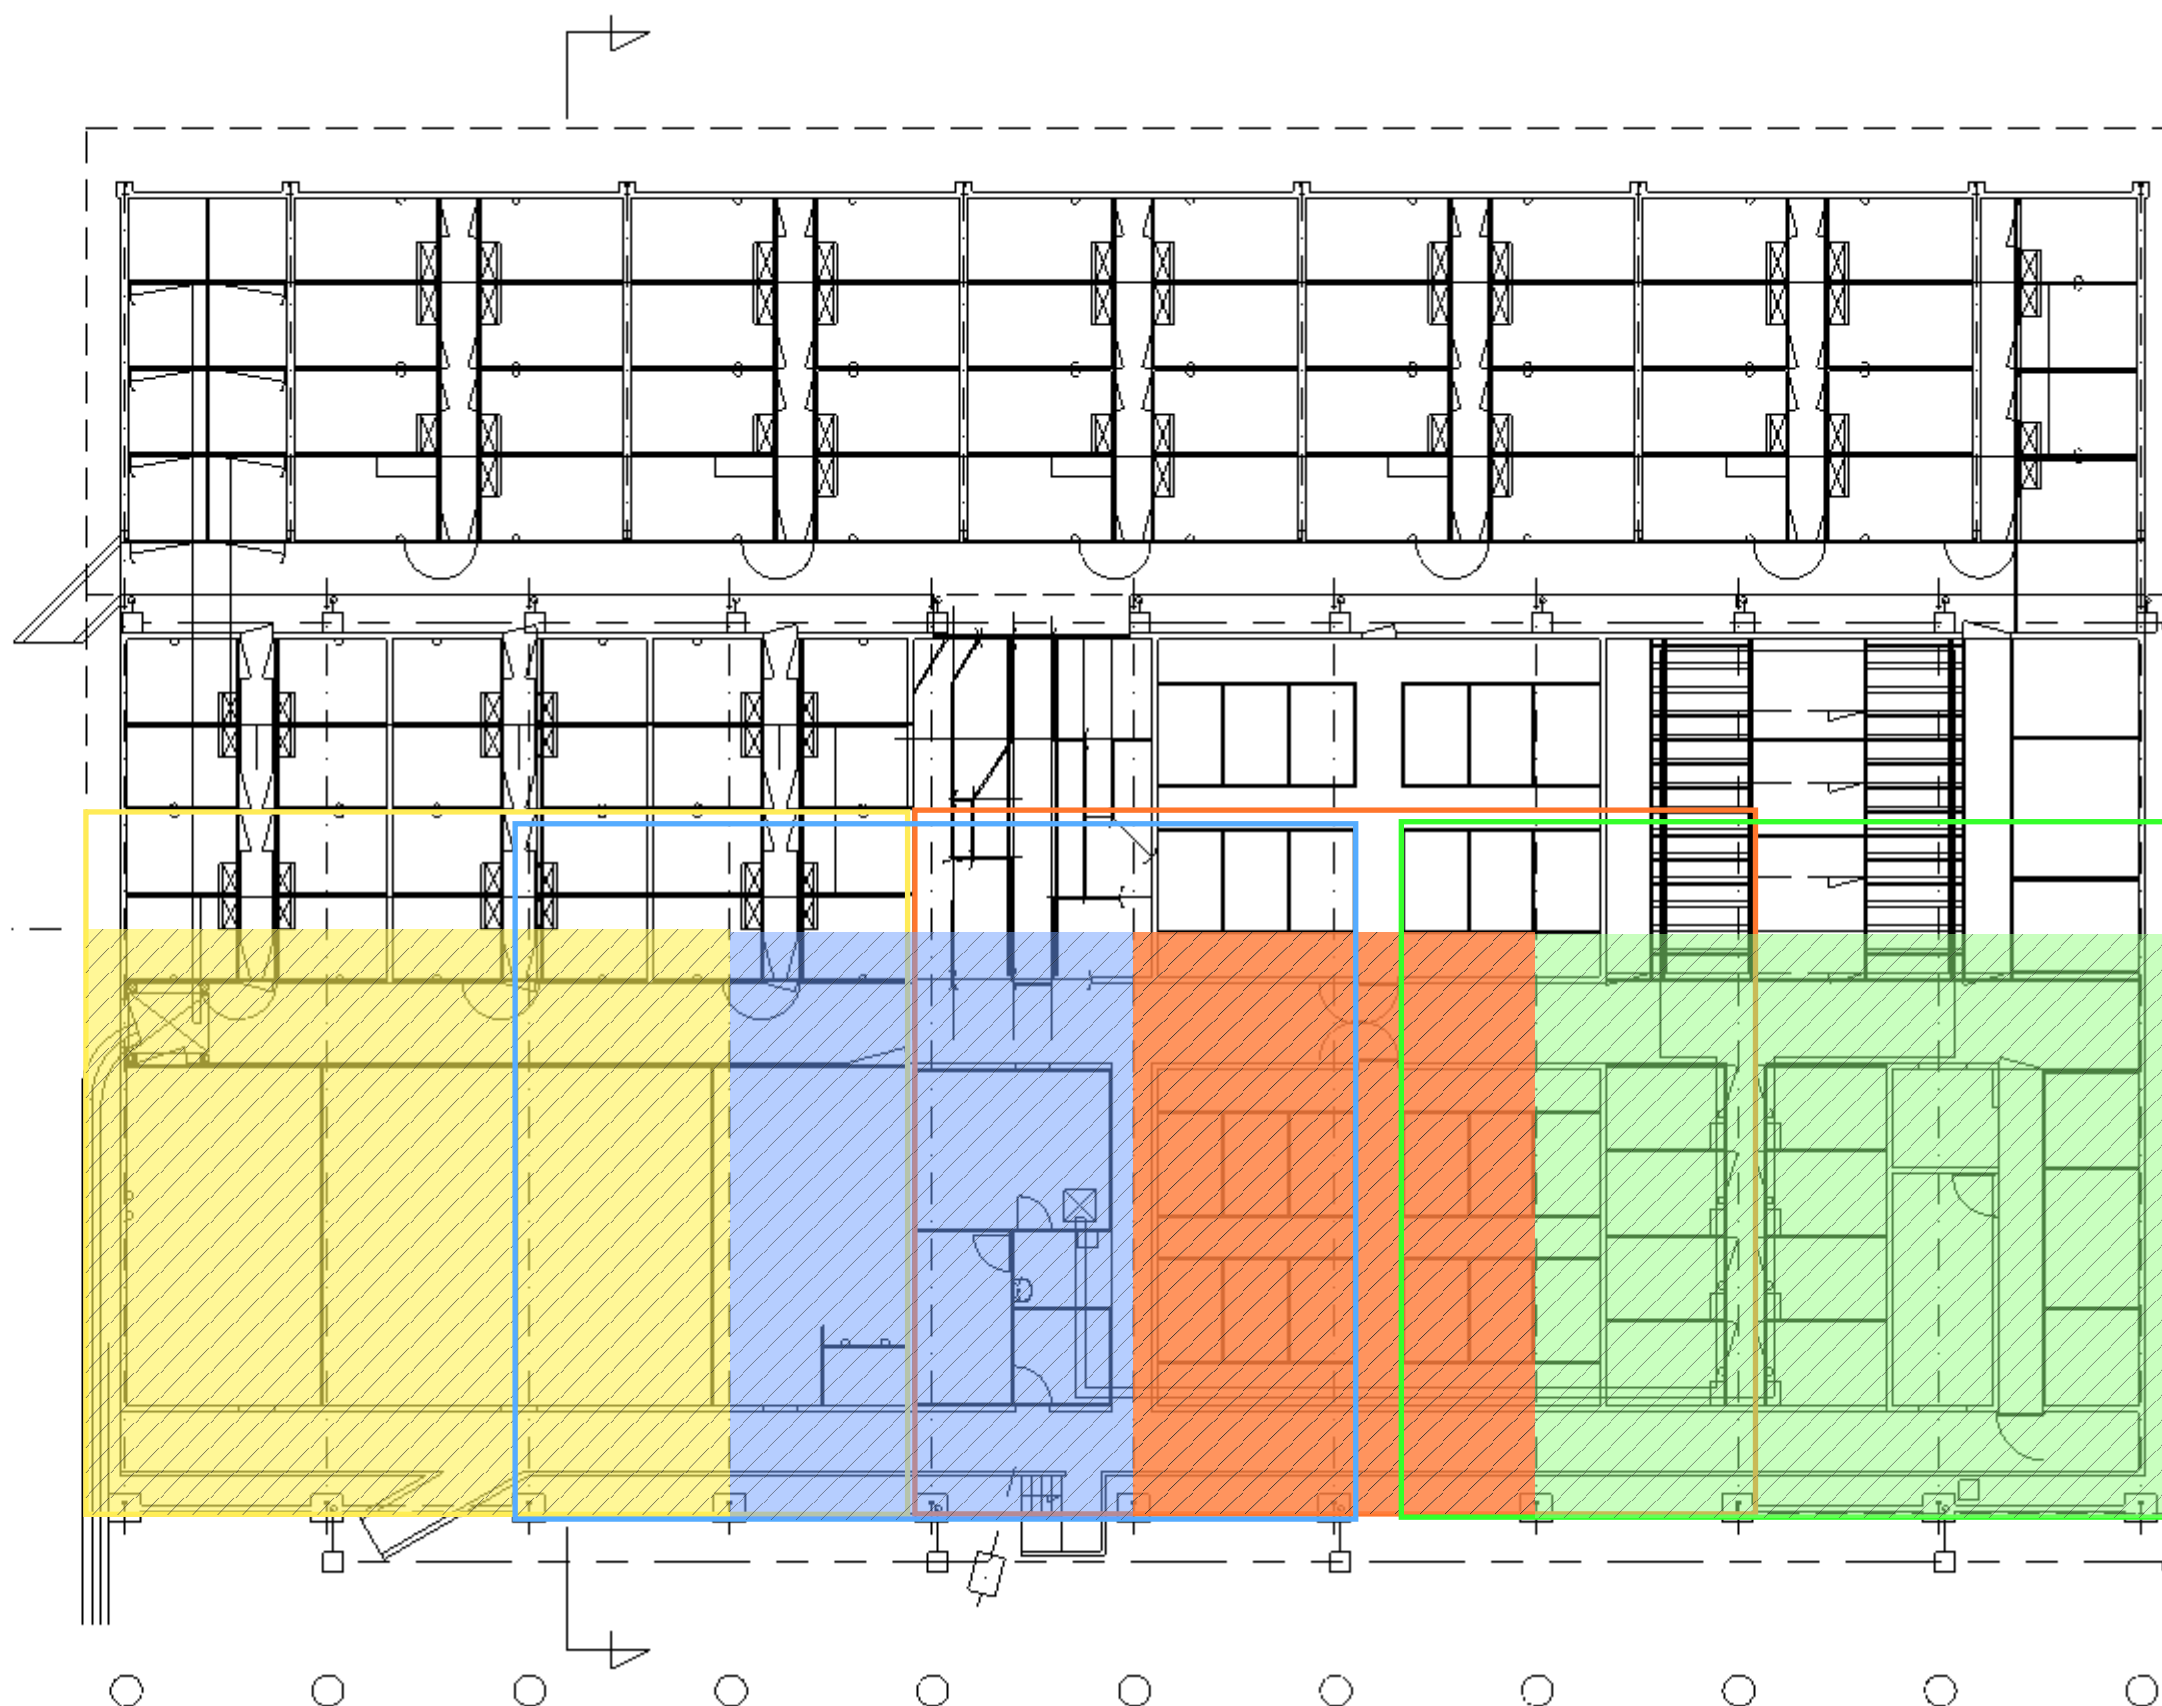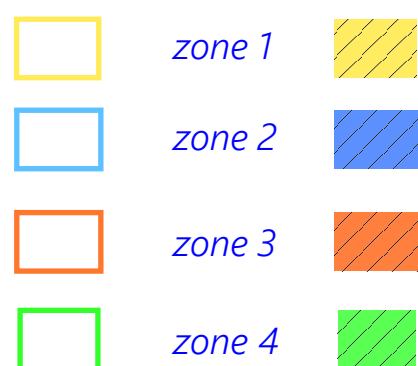

Couvreur :
Identification des zones
travaillées dans les zones
immobilisées de 1 et 3



Immobilisée Travaillée

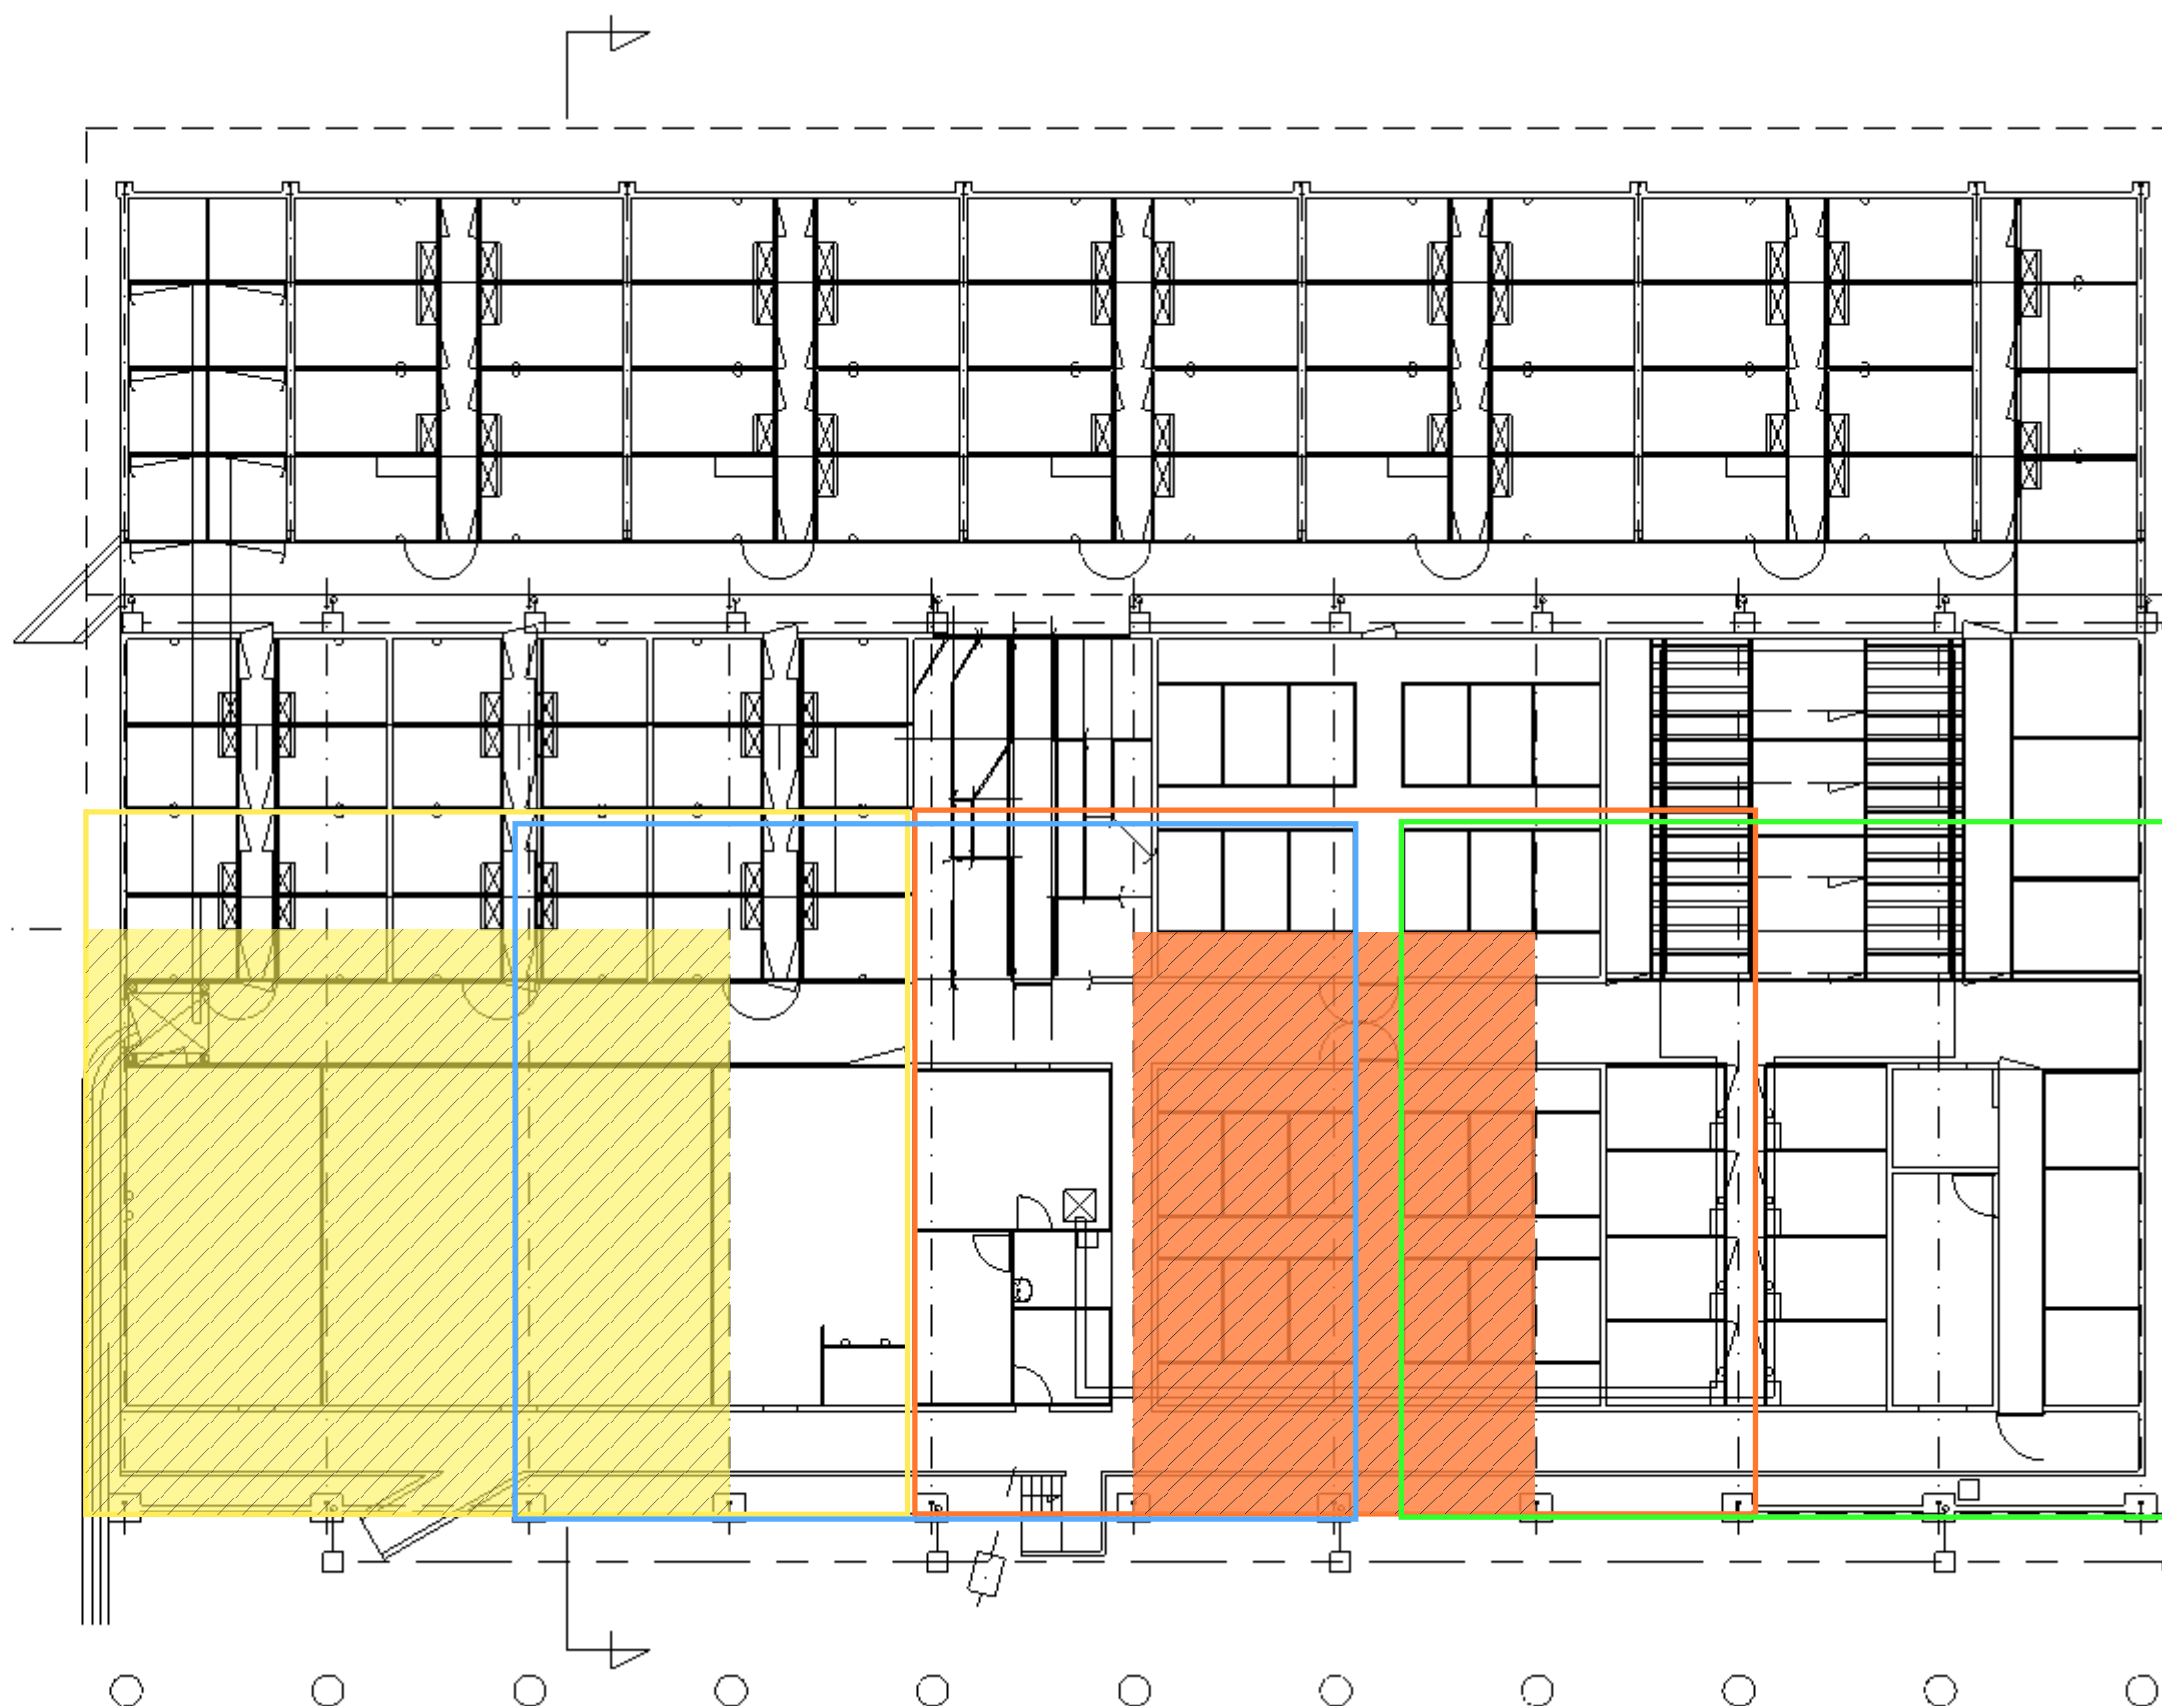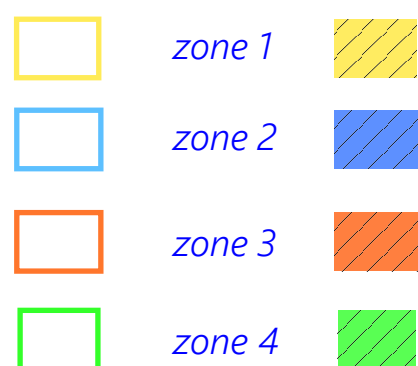

Couvreur :

Identification des zones
travaillées dans les zones
immobilisées de 2 et 4

Immobilisée Travaillée

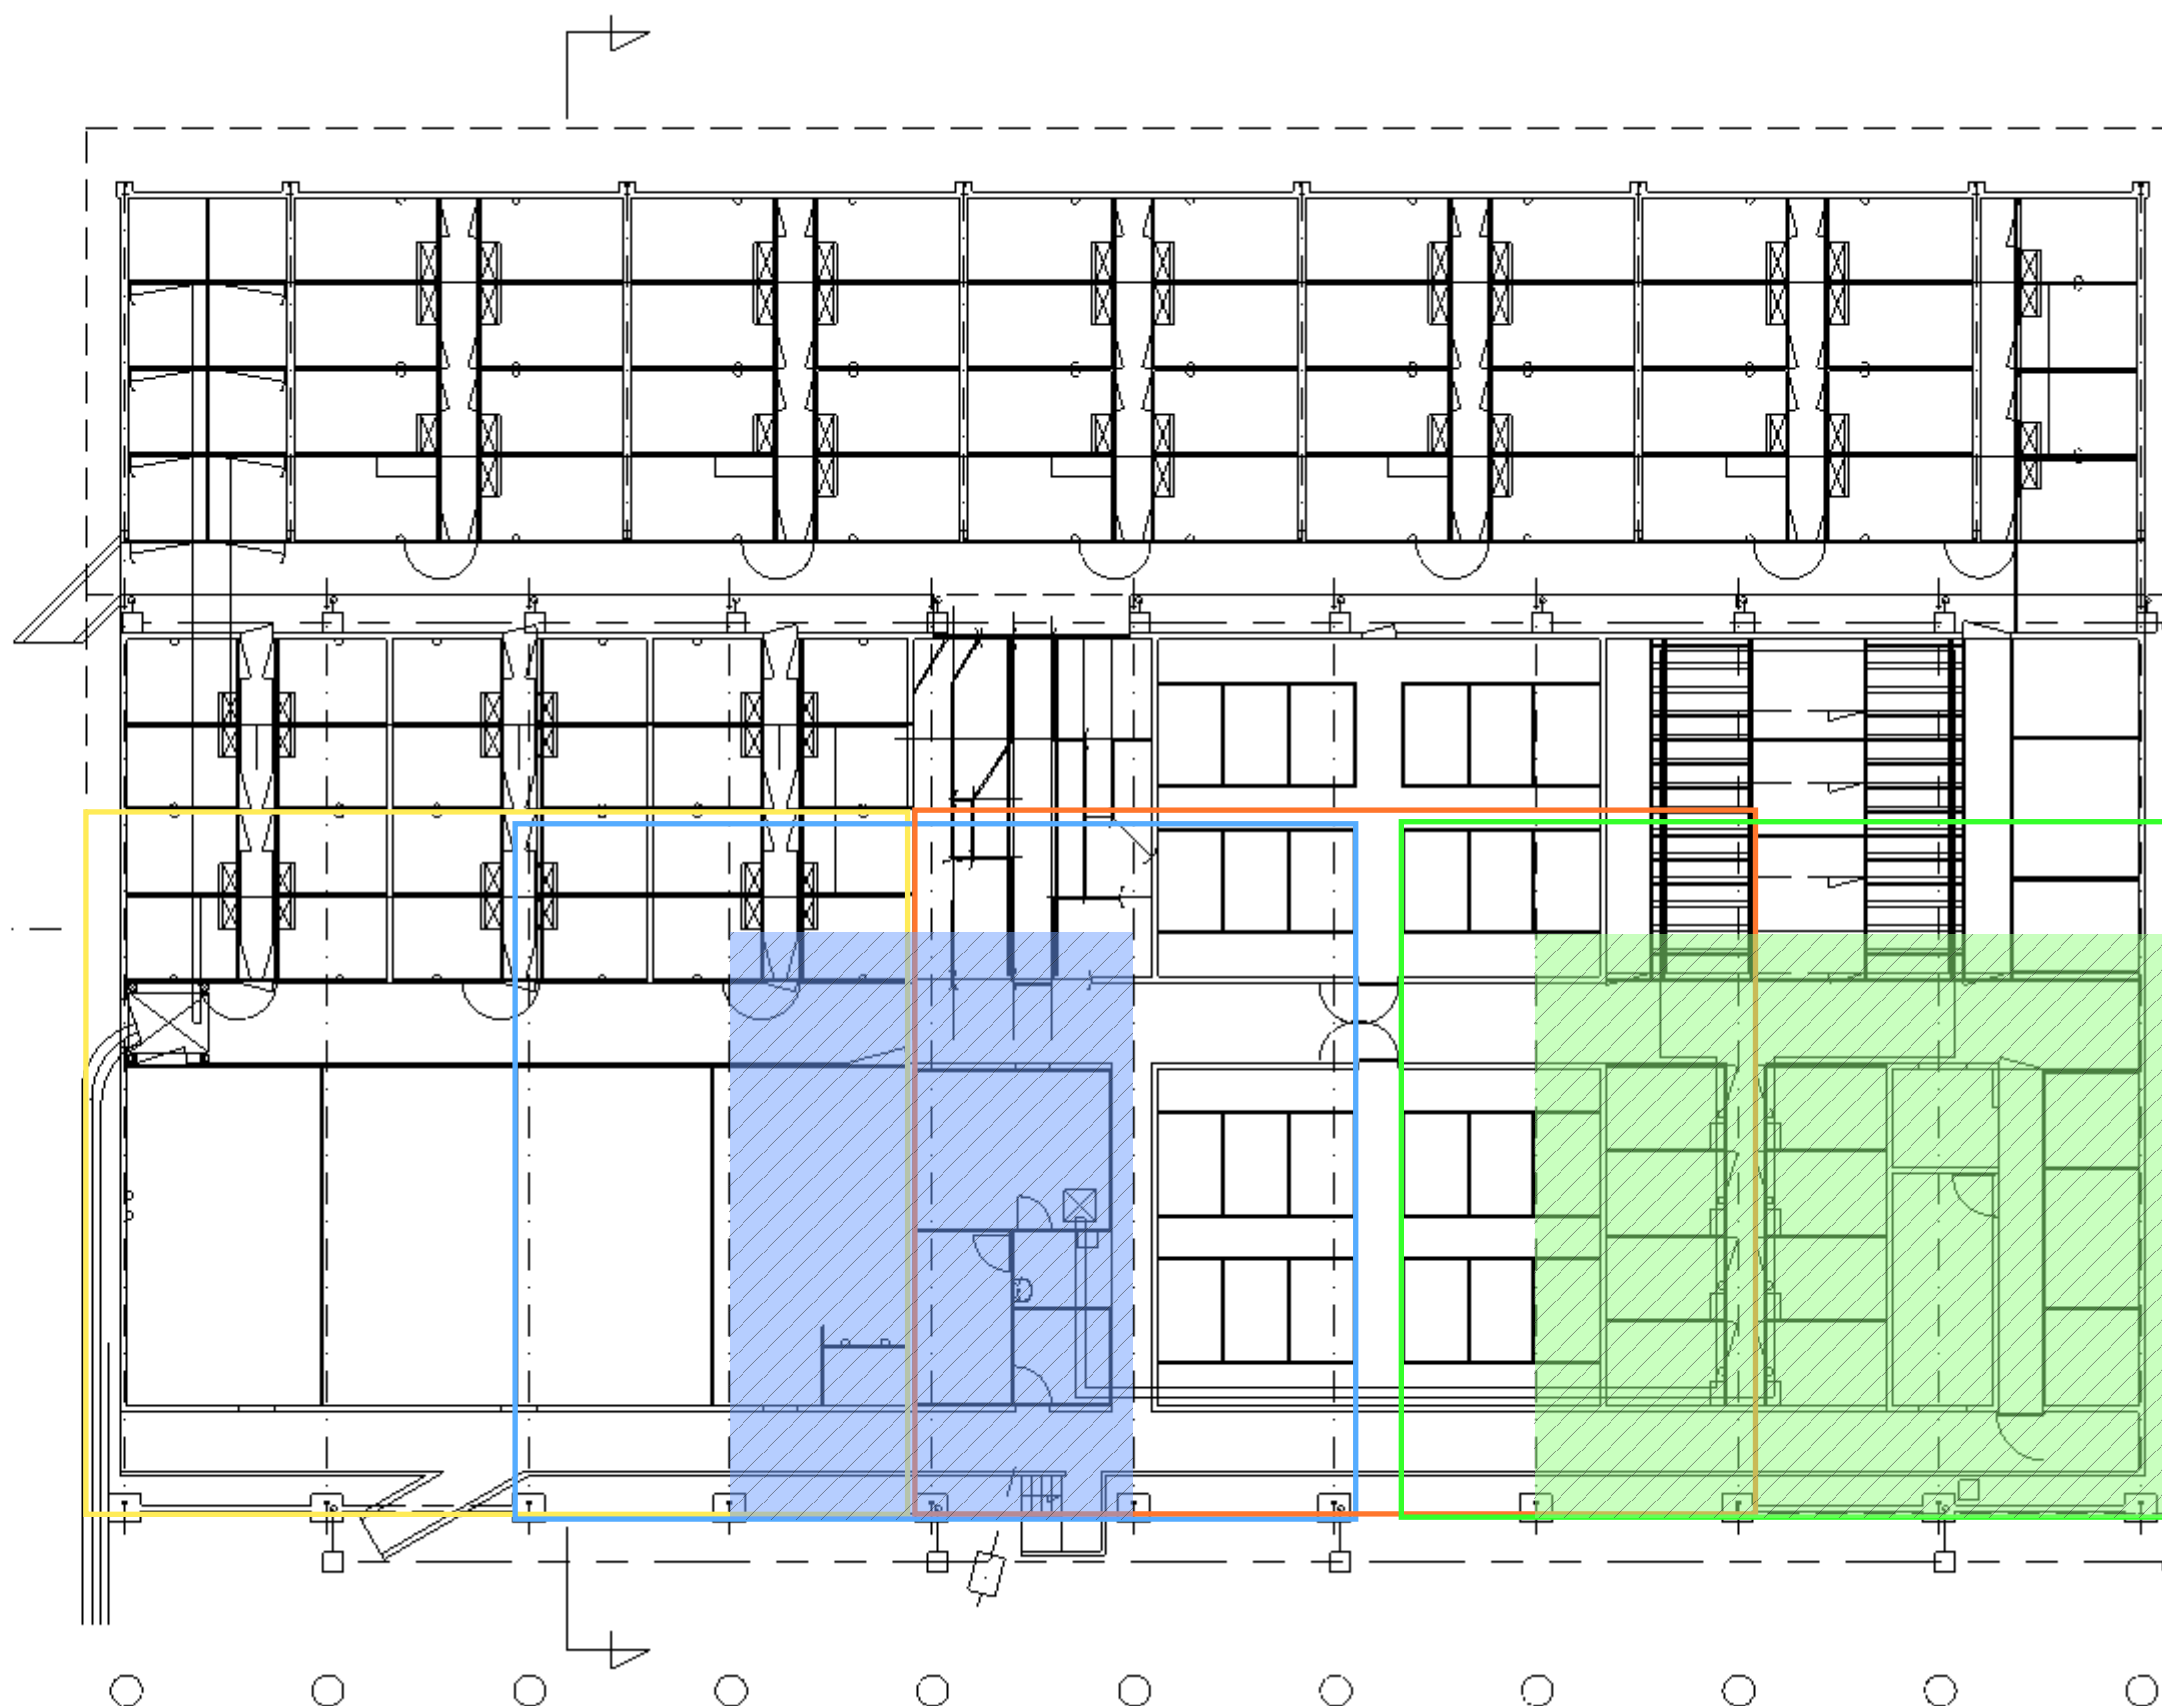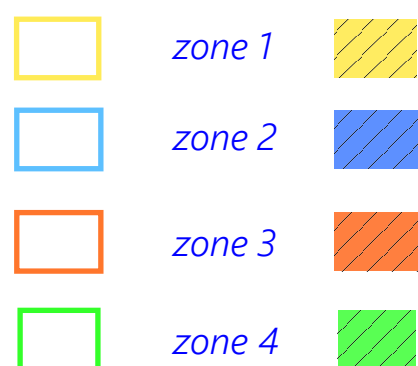

Couvreur :
Identification des zones
immobilisées de 5 à 8


Immobilisée

- zone 5
- zone 6
- zone 7
- zone 8



Couvreur :
Identification des zones
travaillées dans les zones
immobilisées de 5 à 8

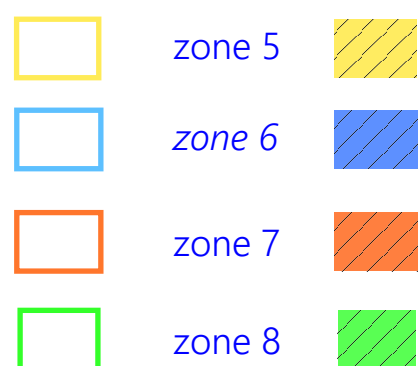







Immobilisée Travaillée



Couvreur :

Identification des zones
travaillées dans les zones
immobilisées de 5 et 7

Immobilisée Travaillée









	zone 5	
	zone 6	
	zone 7	
	zone 8	




Couvreur :

Identification des zones
travaillées dans les zones
immobilisées de 6 et 8

Immobilisée Travaillée

	zone 5	
	zone 6	
	zone 7	
	zone 8	

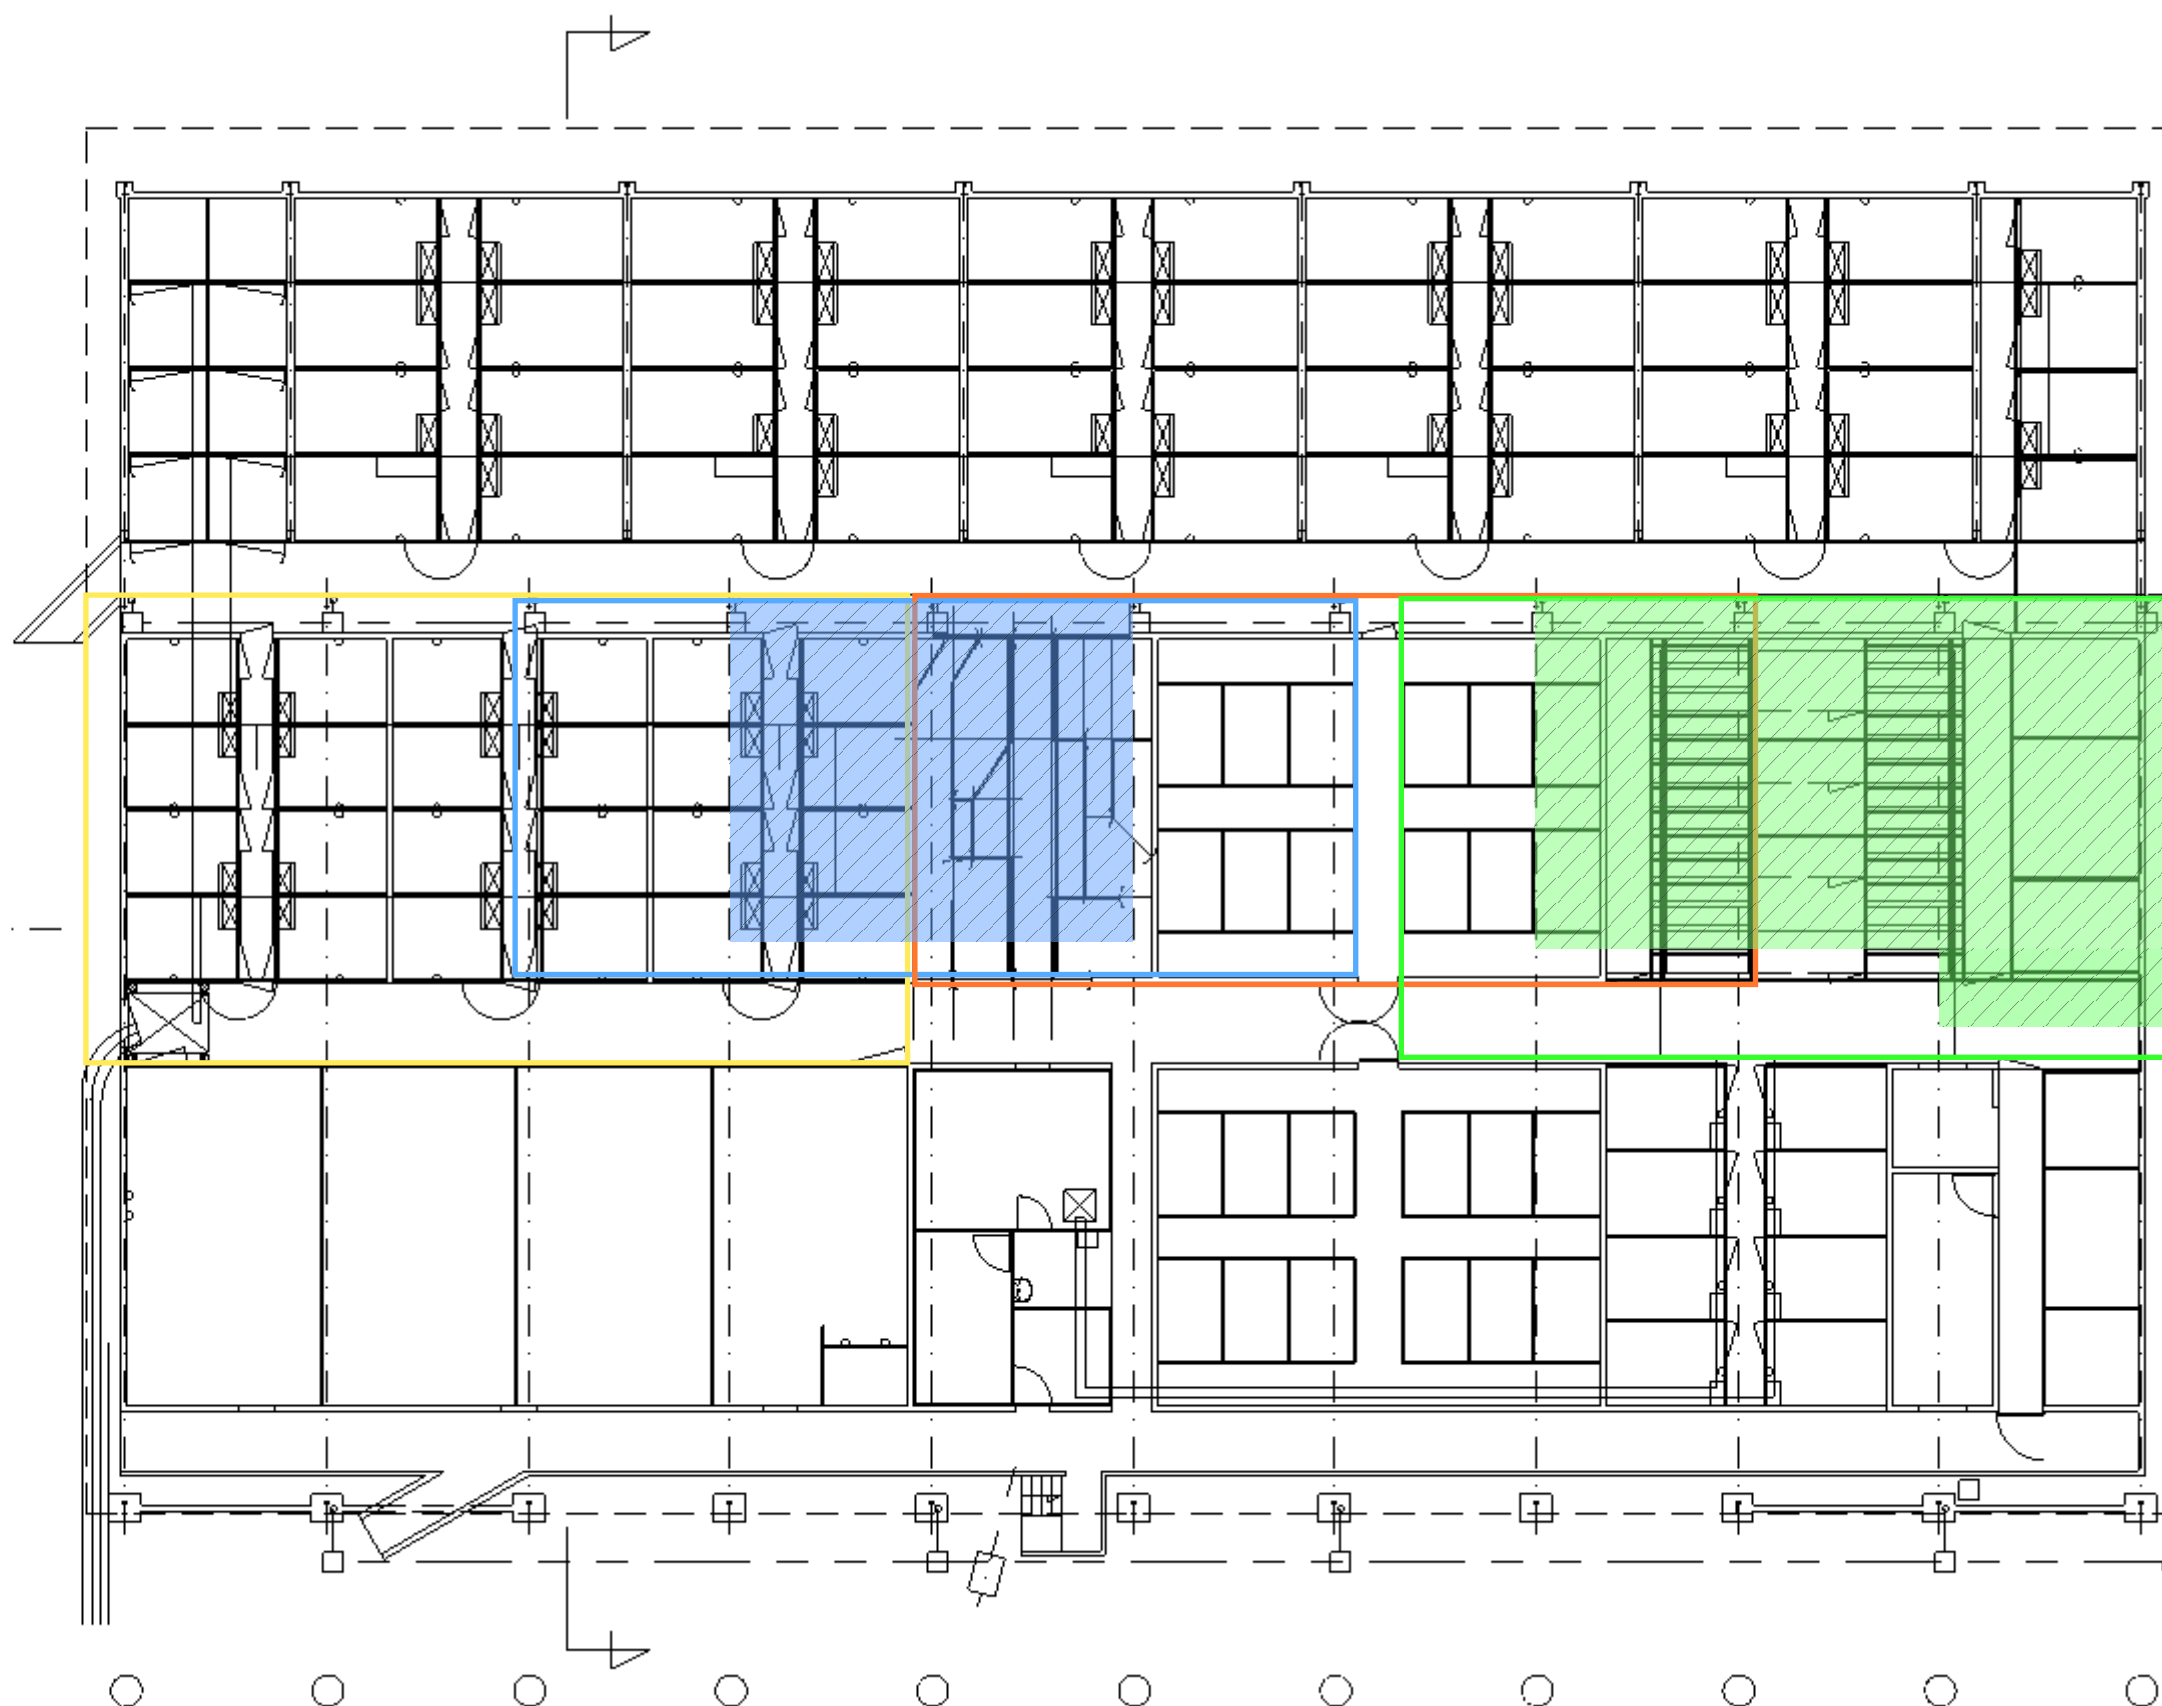

Couvreur :

Identification des zones immobilisées de 9 à 12

Immobilisée









- zone 9
- zone 10
- zone 11
- zone 12




Couvreur :

Identification des zones
travaillées dans les zones
immobilisées de 9 à 12







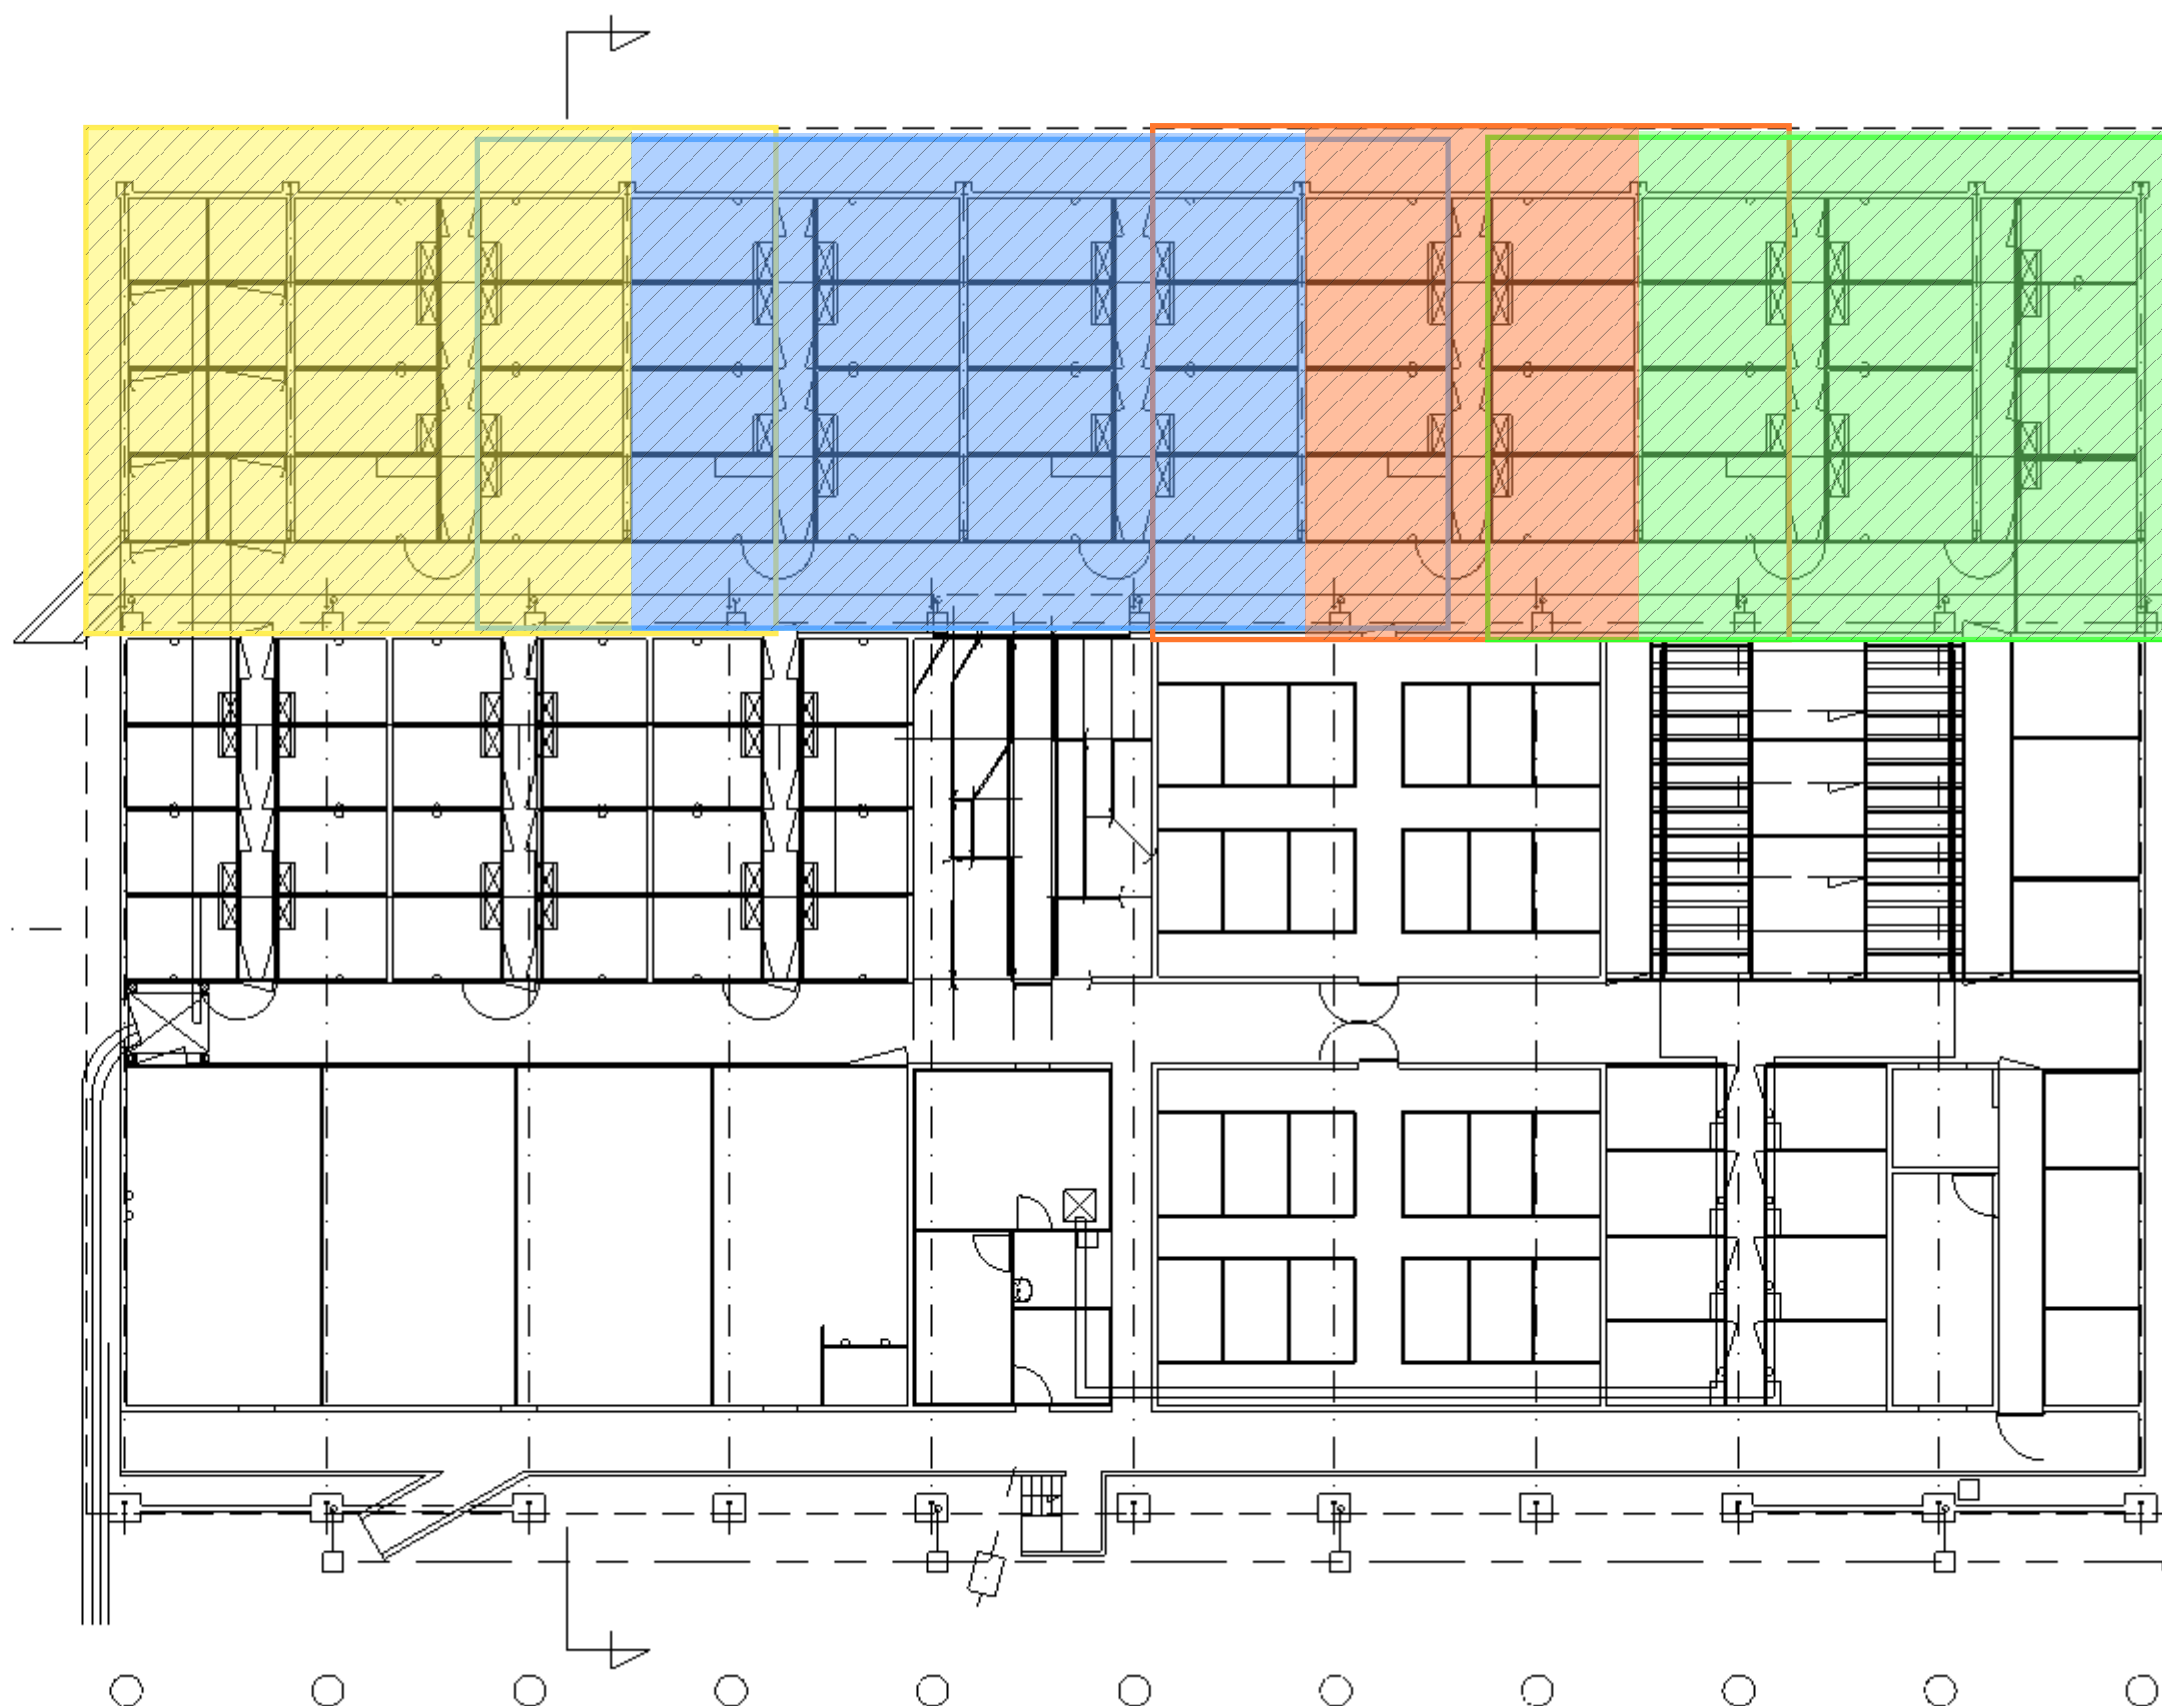

Immobilisée Travaillée

	zone 9	
	zone 10	
	zone 11	
	zone 12	



Couvreur :

Identification des zones
travaillées dans les zones
immobilisées de 9 et 11









Immobilisée		Travaillée
	zone 9	
	zone 10	
	zone 11	
	zone 12	



Couvreur :

Identification des zones
travaillées dans les zones
immobilisées de 10 et 12

Immobilisée Travaillée

	zone 9	
	zone 10	
	zone 11	
	zone 12	






Plan pour coordination des interventions Semaine 1

- Zone 1-1 Immobilisée
- Zone électricien
Installation chantier
- Zone électricien Dépose








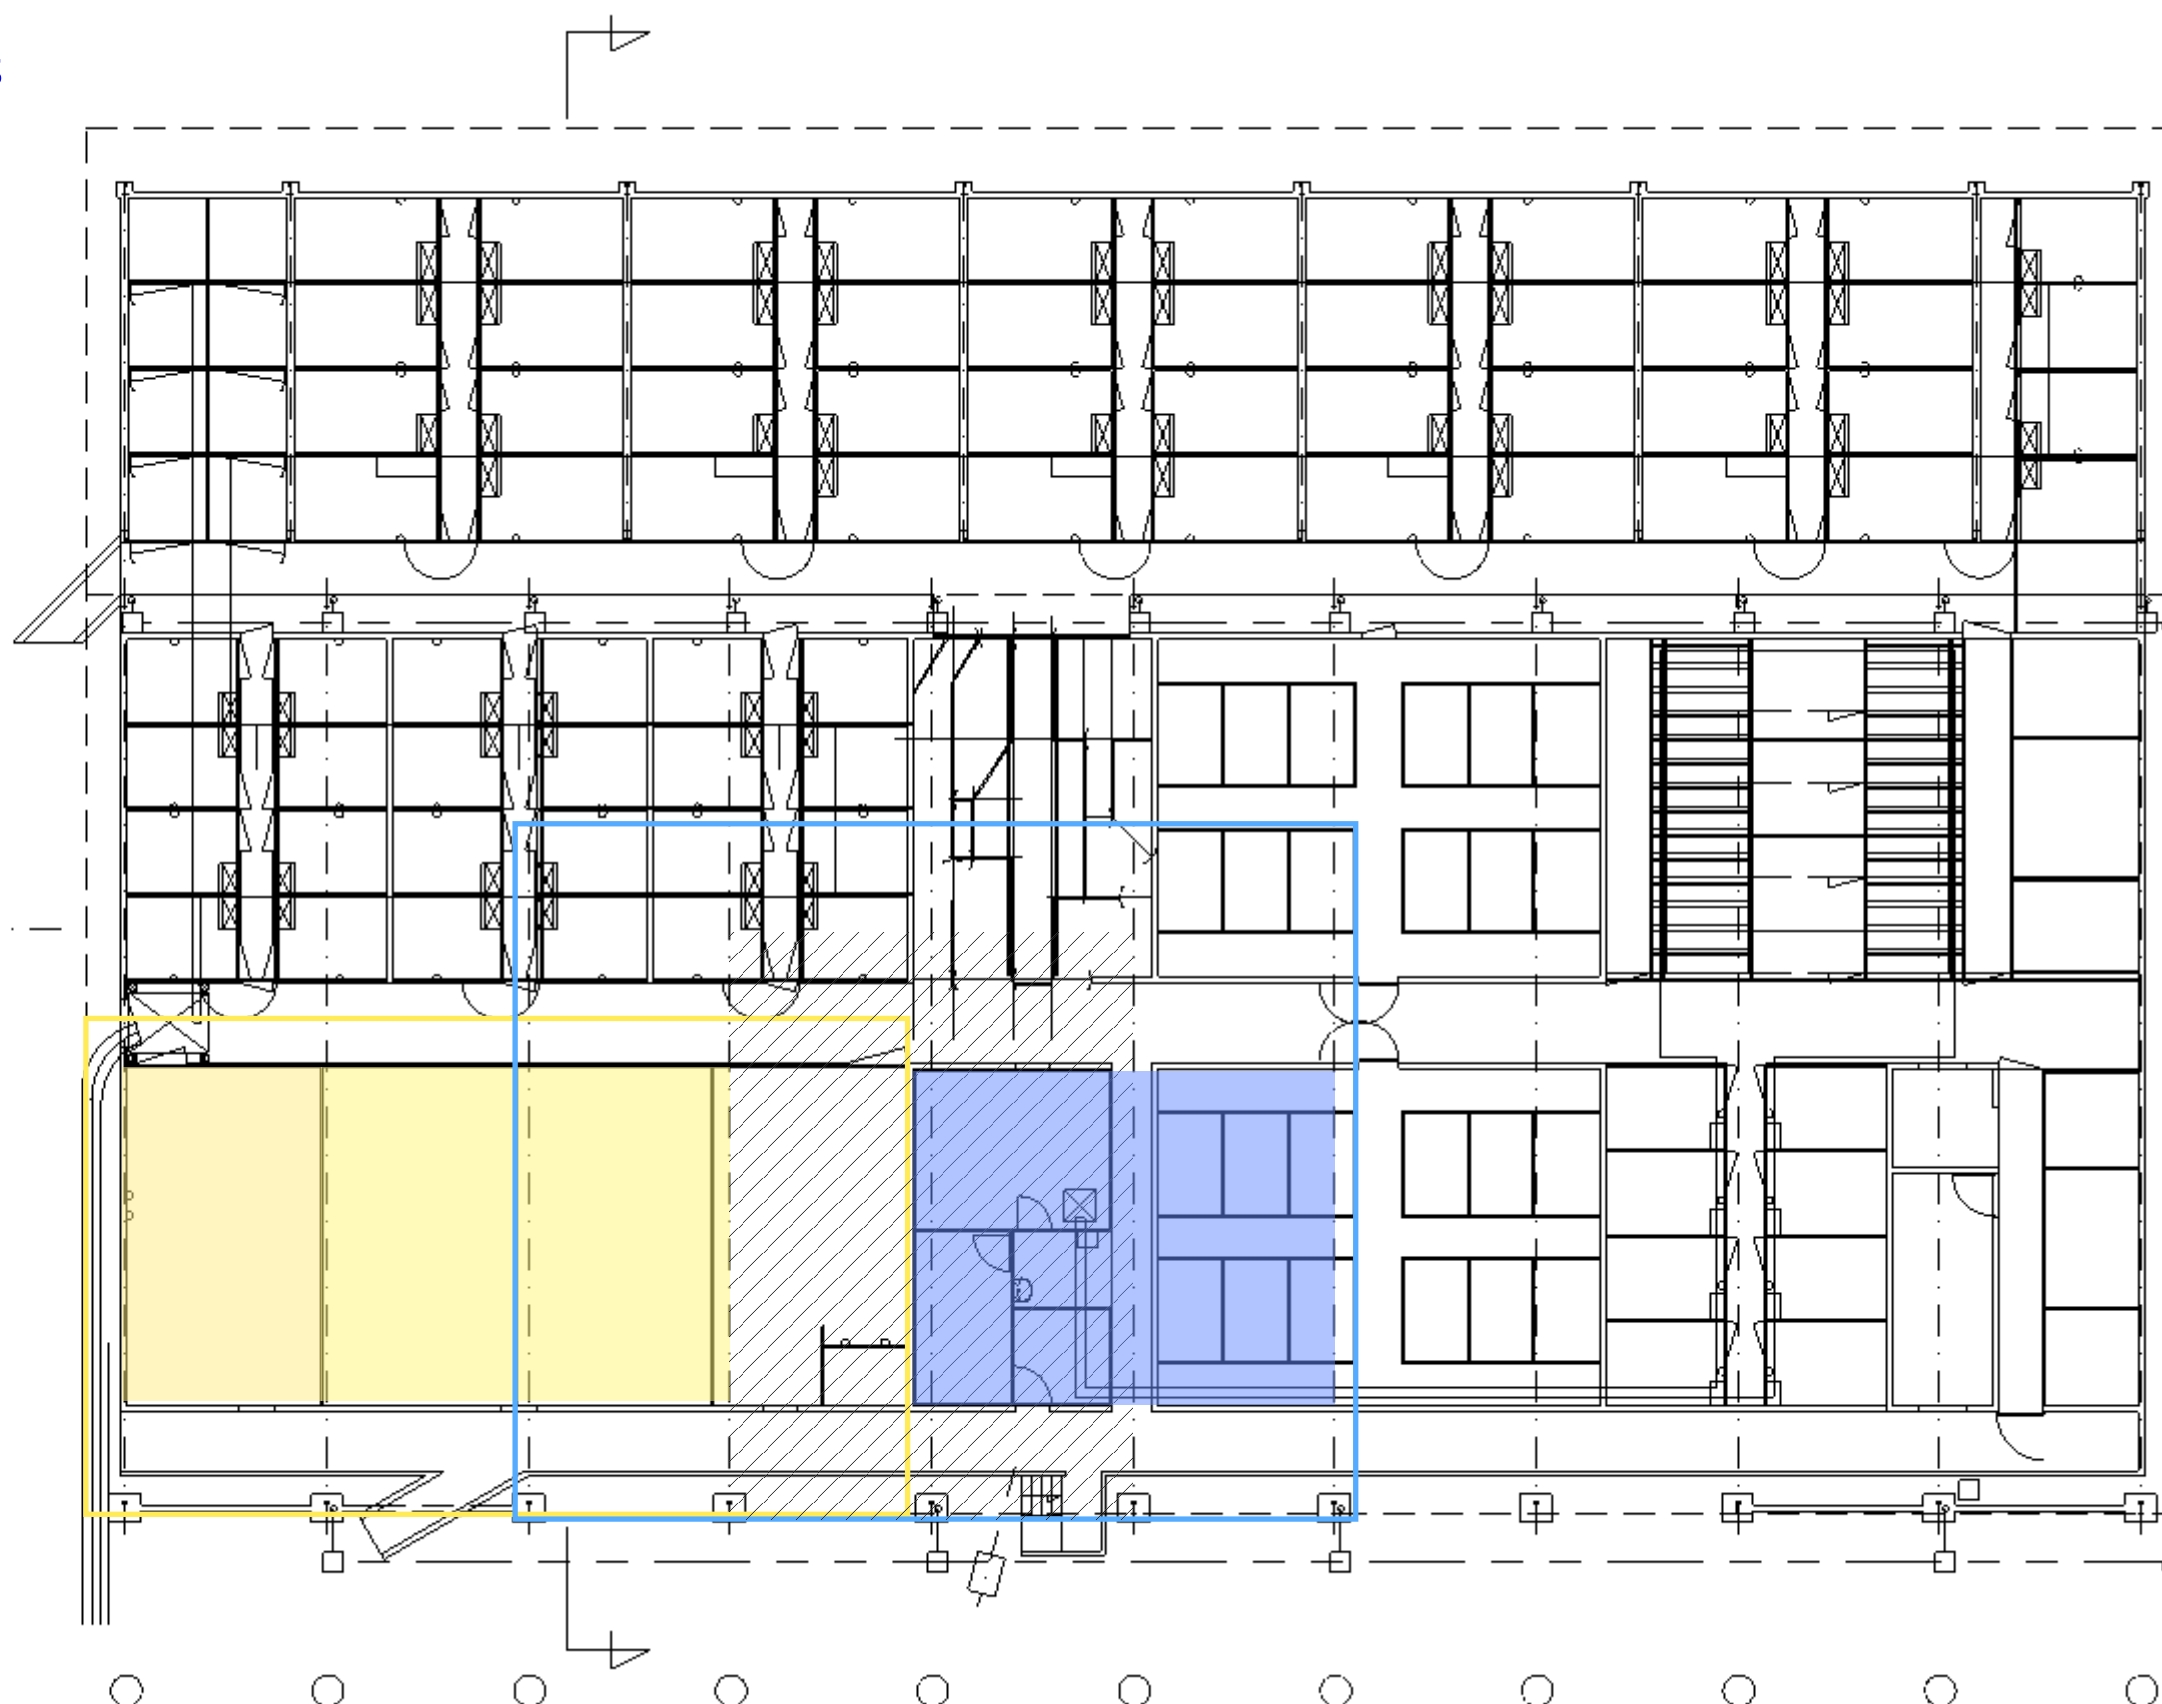
Plan pour coordination des interventions Semaine 2

-  Zone 1 Immobilisée
-  Zone charpentier
-  Zone électricien Dépose



Plan pour coordination des interventions Semaine 3

-  zone 2 Immobilisée
-  zone 1 Immobilisée
-  Zone charpentier
-  Zone électricien Dépose
-  Zone électricien Pose



Plan pour coordination des interventions Semaine 4

- zone 3 Immobilisée
- zone 2 Immobilisée
- Zone charpentier
- Zone électricien Dépose
- Zone électricien Pose








Plan pour coordination des interventions Semaine 5

- Zone 5-1 Immobilisée
- zone 4 Immobilisée
- zone 3 Immobilisée
- Zone charpentier
- Zone électricien Dépose
- Zone électricien Pose
- Zone électricien Dépose
- Zone électricien Installation chantier








Plan pour coordination des interventions Semaine 6

-  Zone 5 Immobilisée
-  zone 4 Immobilisée
-  Zone charpentier
-  Zone électricien Dépose
-  Zone électricien Pose








Plan pour coordination des interventions Semaine 7

-  Zone 6 Immobilisée
-  zone 5 Immobilisée
-  Zone charpentier
-  Zone électricien Dépose
-  Zone électricien Pose



Plan pour coordination des interventions Semaine 8


-  Zone 7 Immobilisée
-  Zone 6 Immobilisée
-  Zone charpentier
-  Zone électricien Dépose
-  Zone électricien Pose








Plan pour coordination des interventions

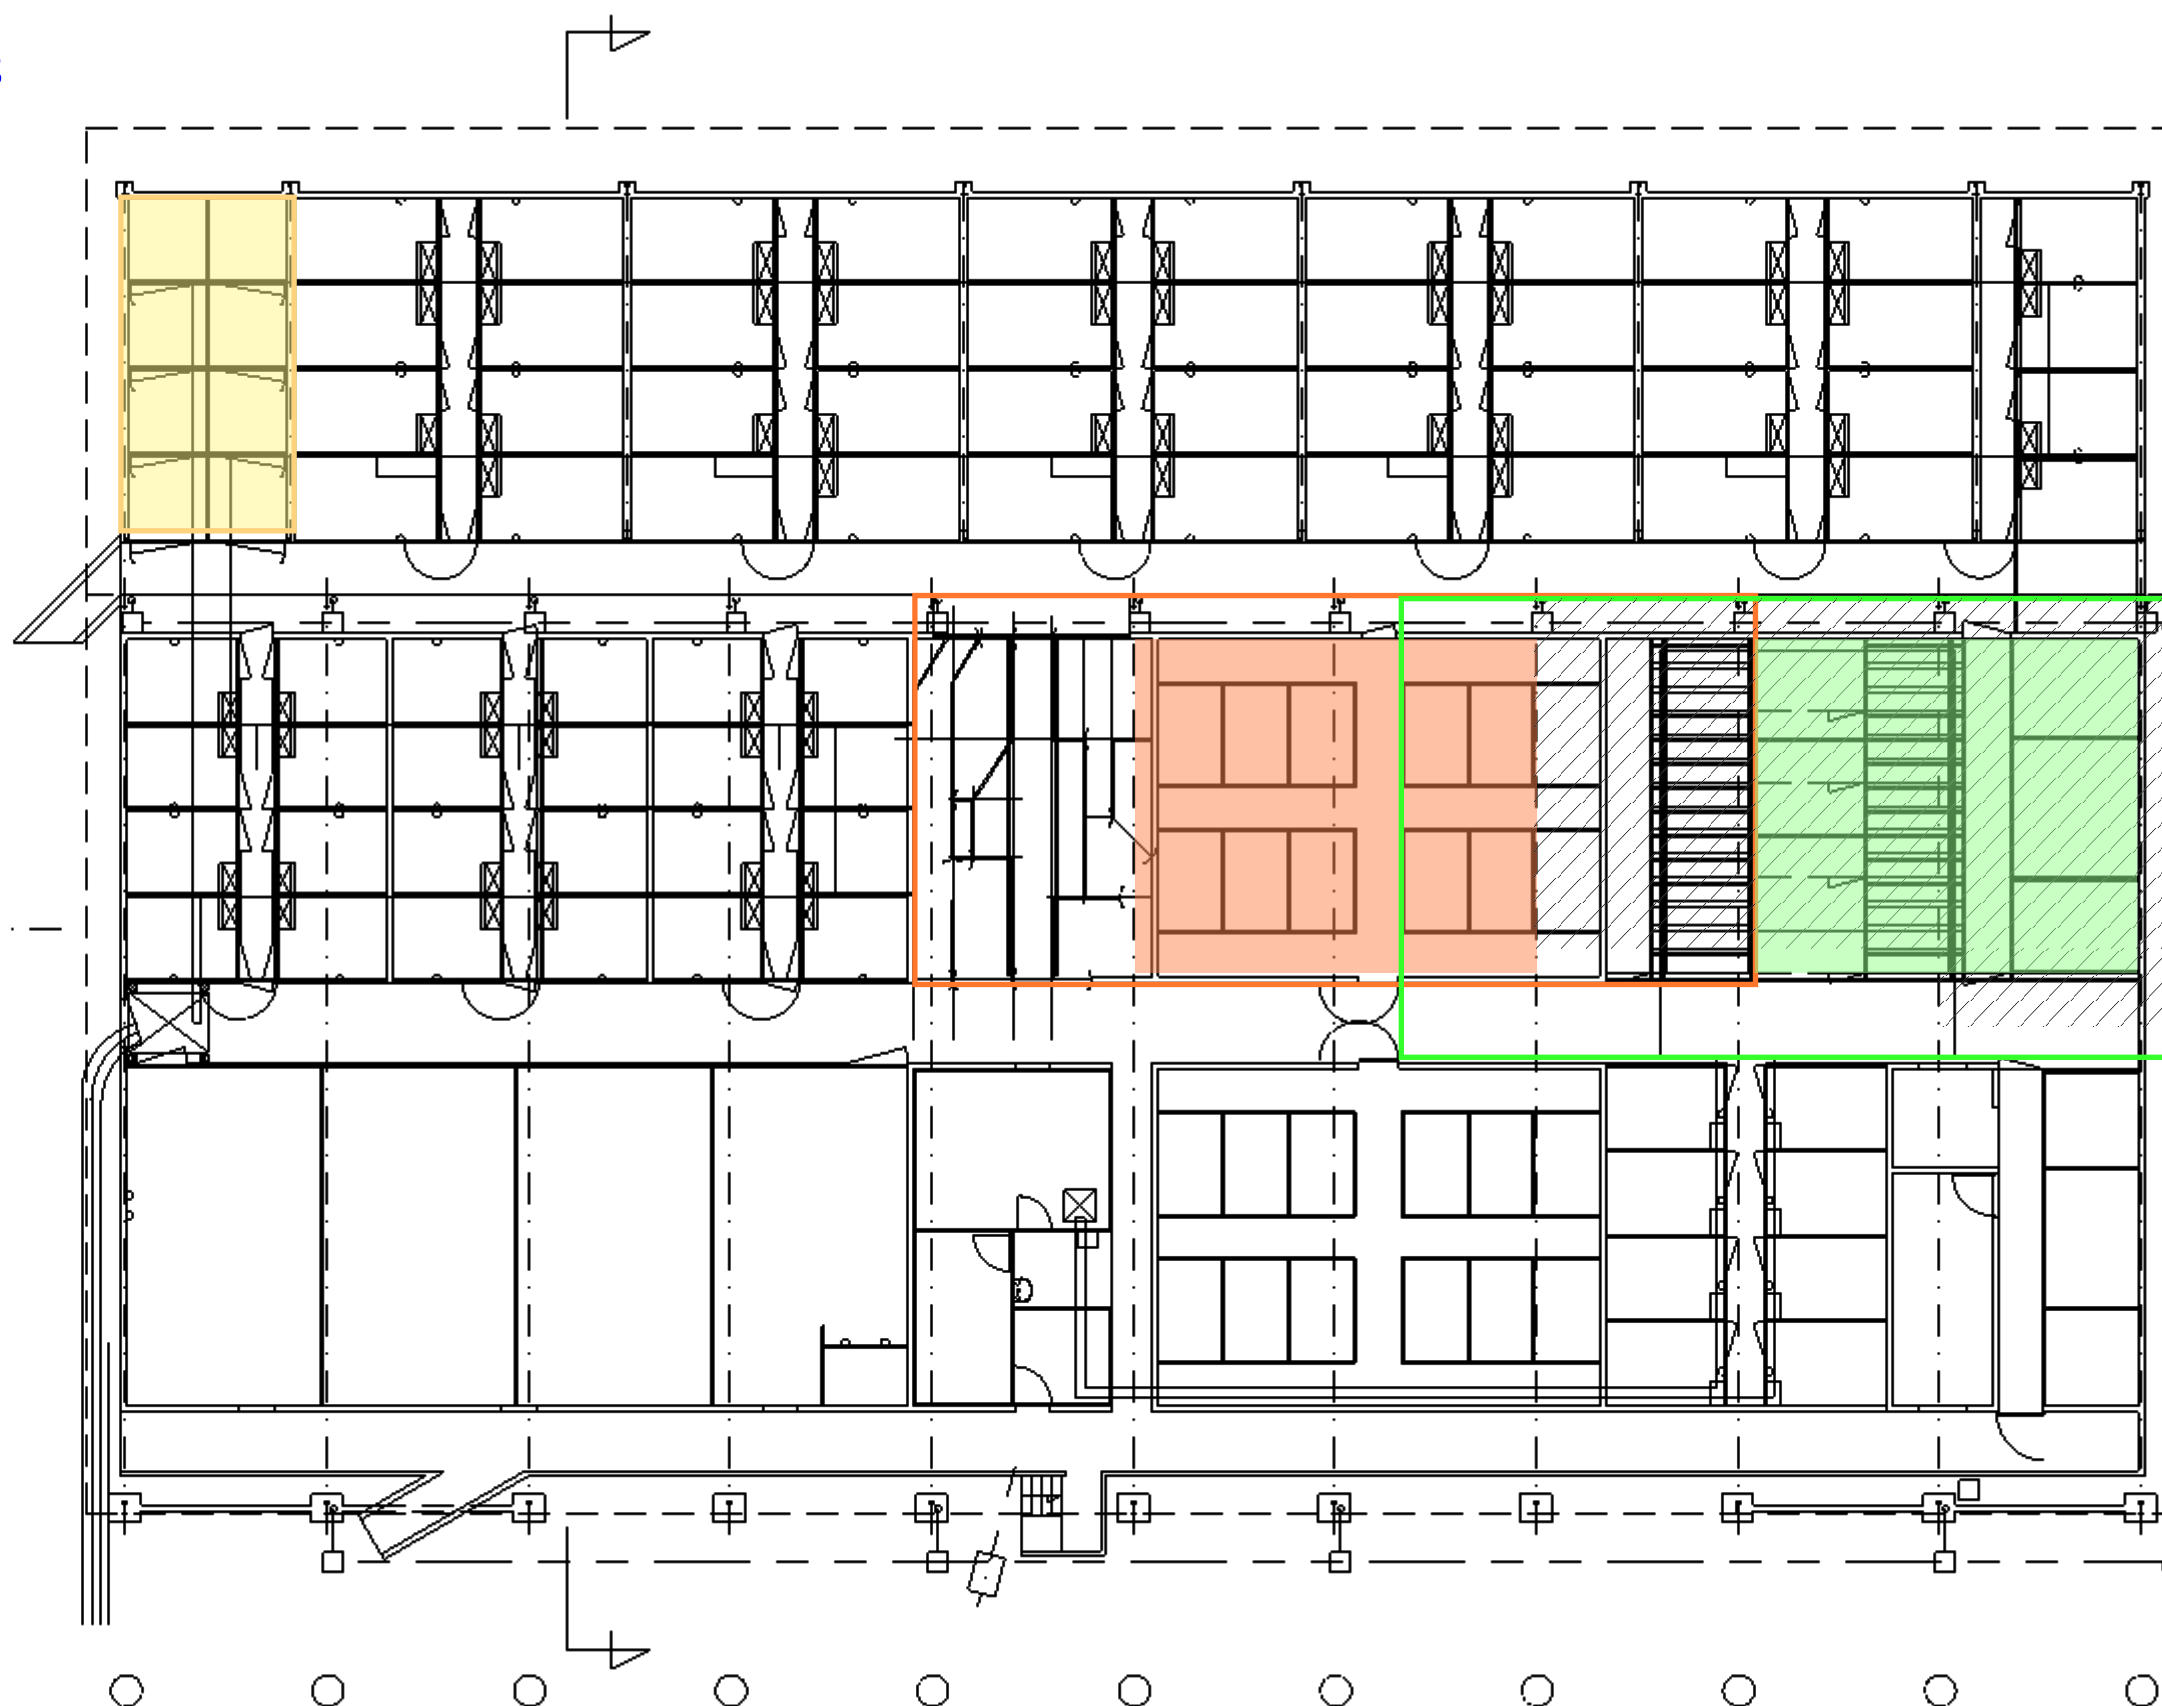Semaine 9

- Zone 9-1 Immobilisée
- Zone 8 Immobilisée
- Zone 7 Immobilisée
- Zone charpentier
- Zone électricien Dépose
- Zone électricien Pose
- Zone électricien Dépose









Plan pour coordination des interventions Semaine 10

-  Zone 9 Immobilisée
-  Zone 8 Immobilisée
-  Zone charpentier
-  Zone électricien Dépose
-  Zone électricien Pose







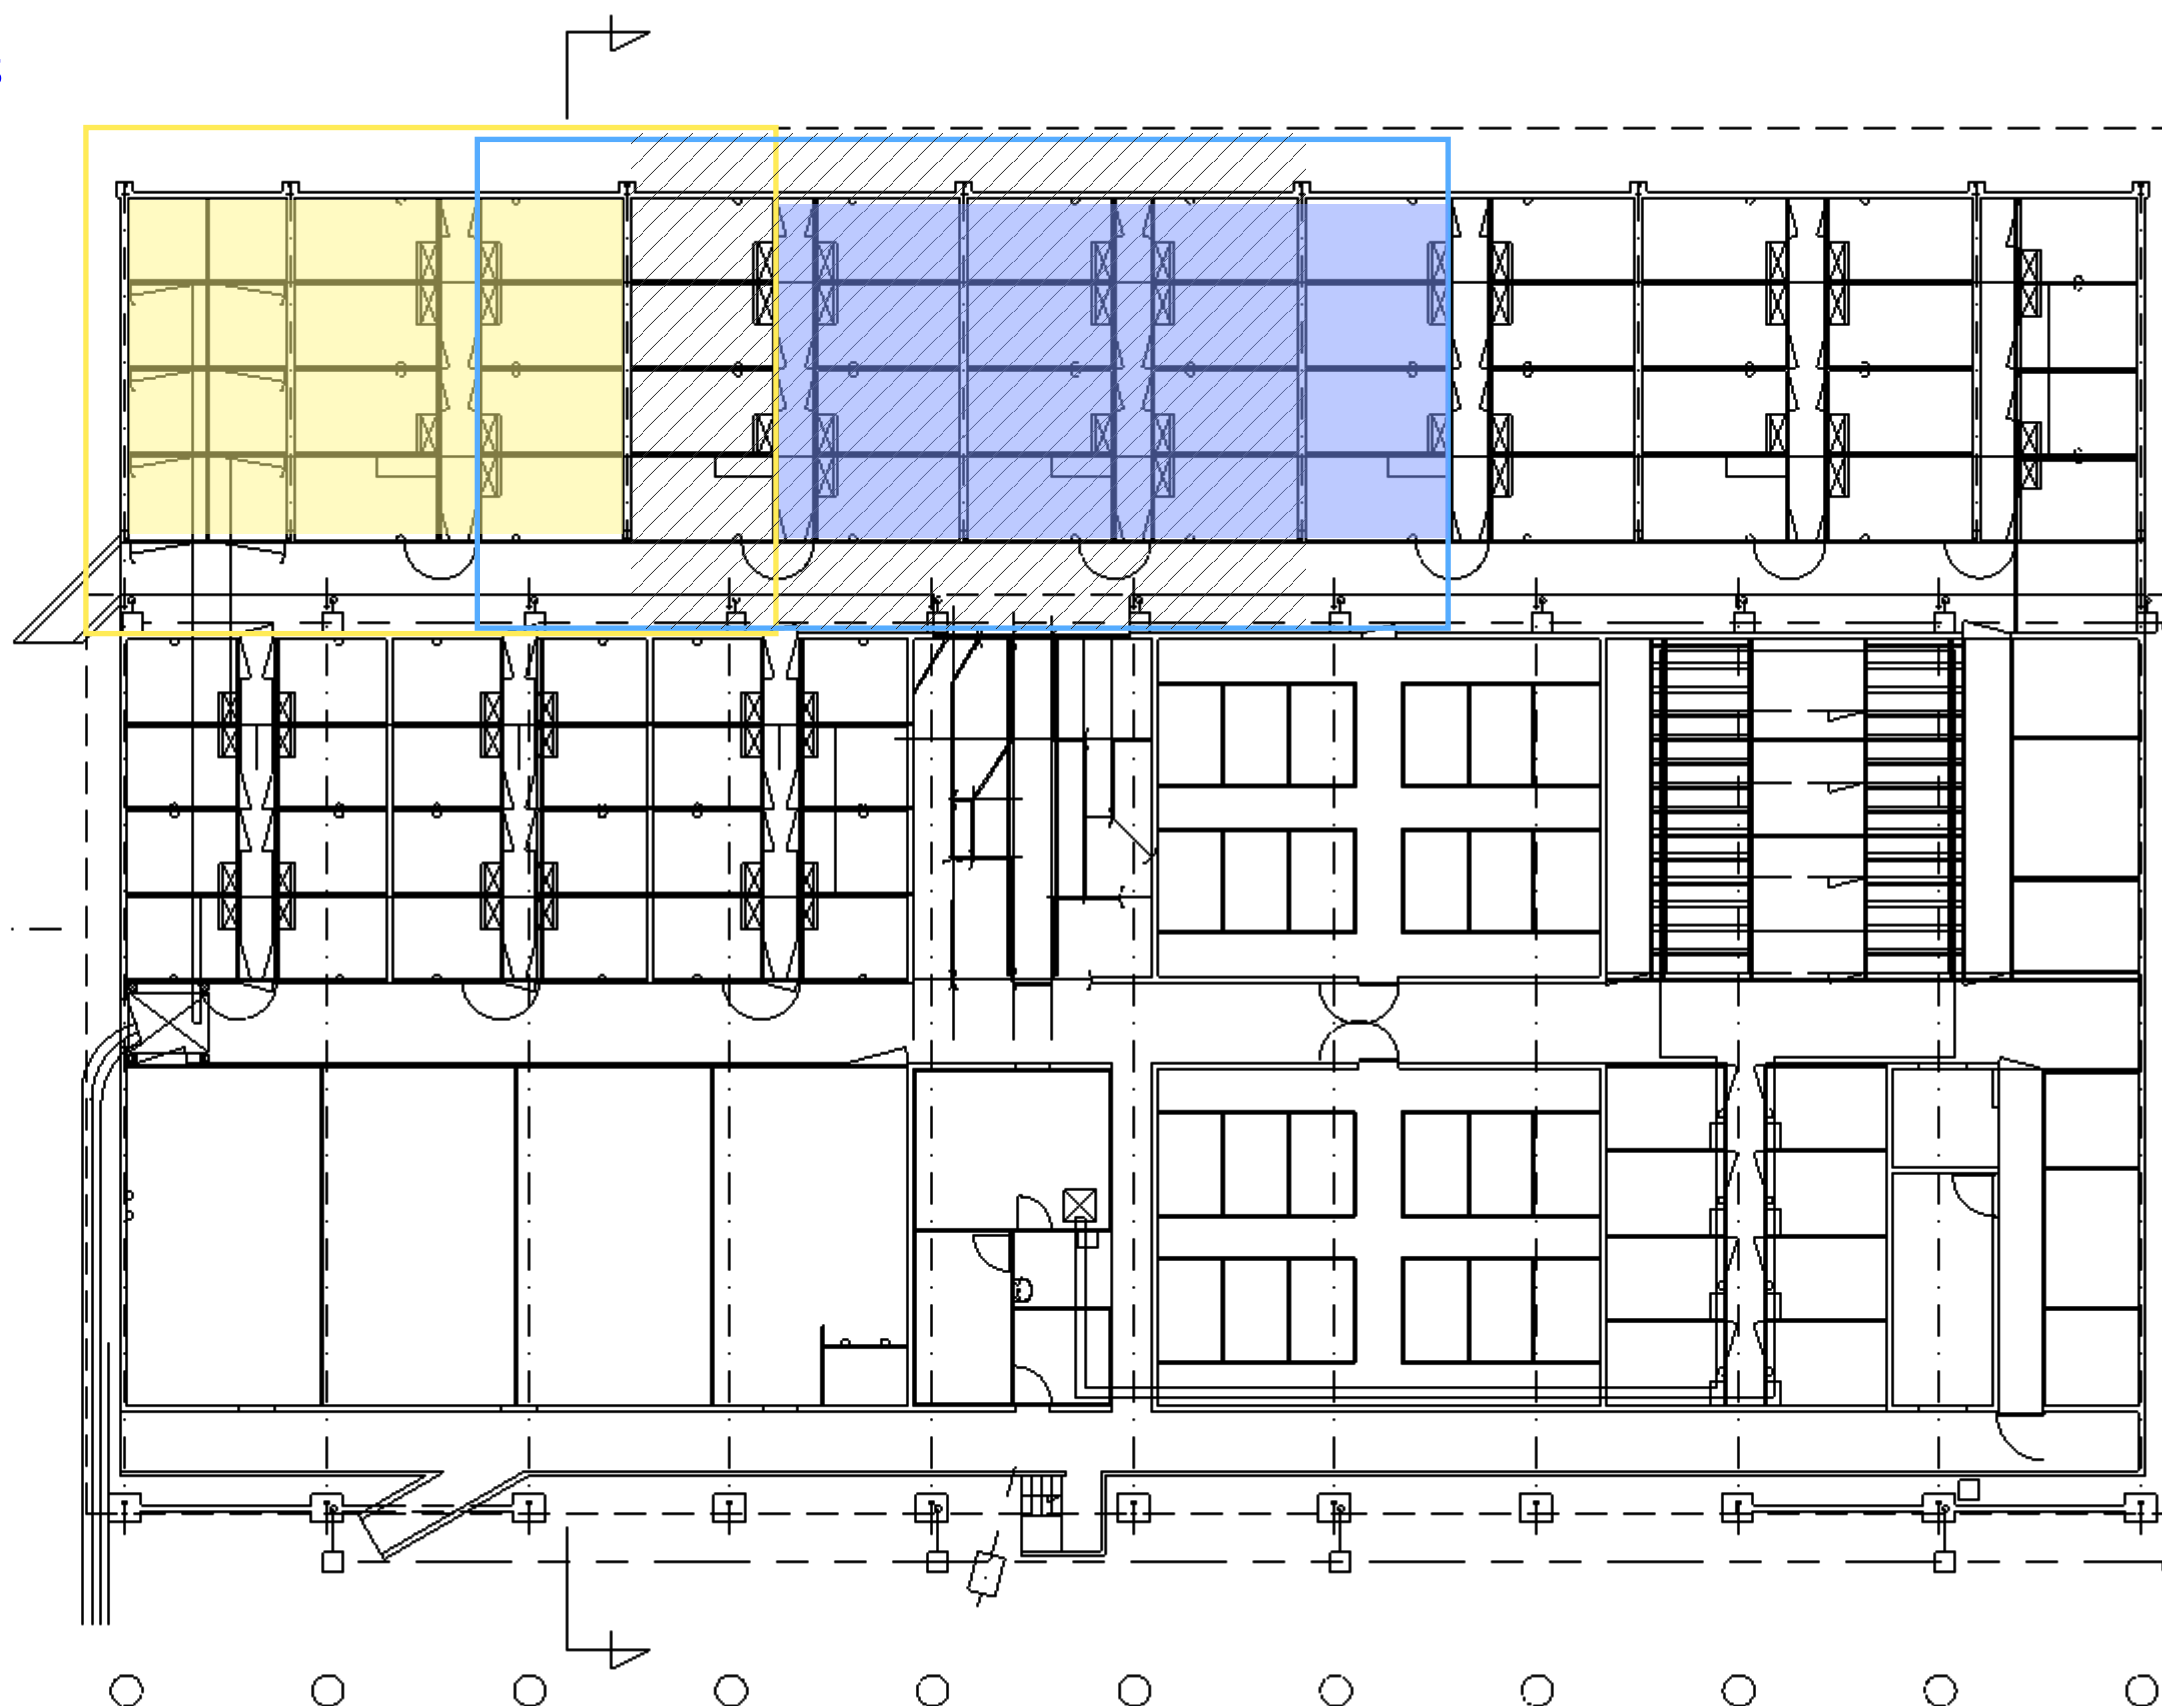
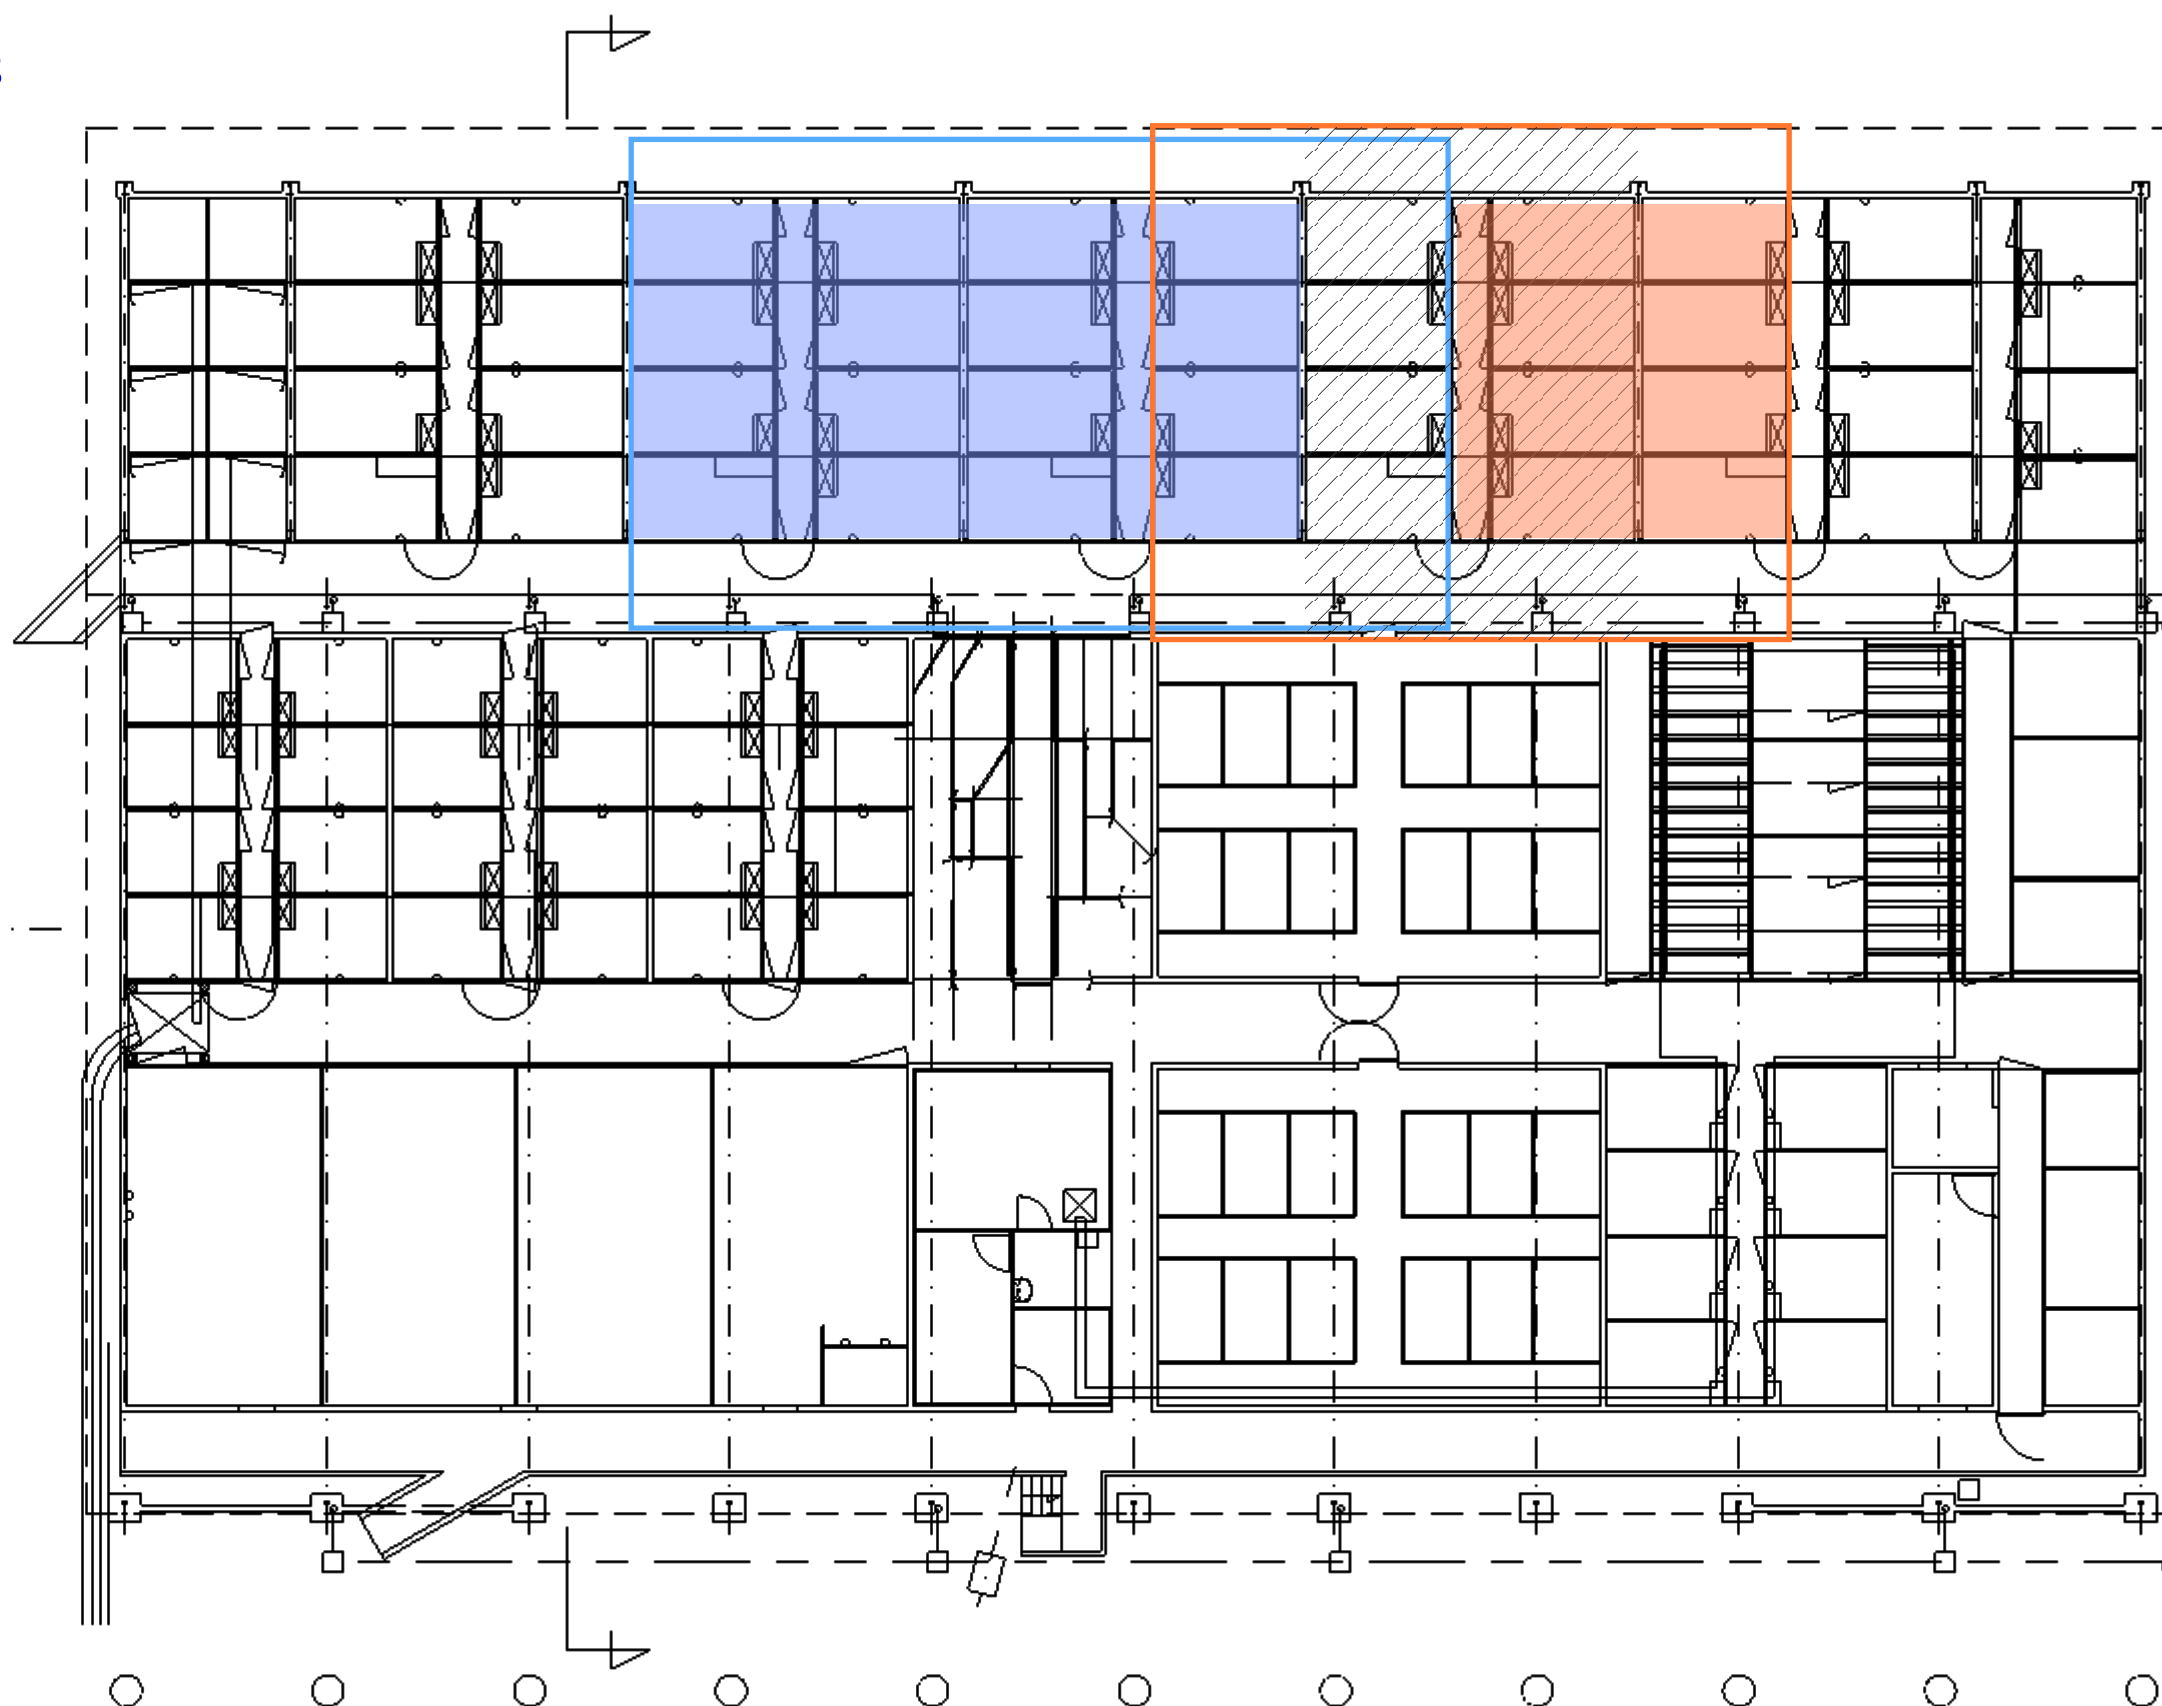
Plan pour coordination des interventions Semaine 11

-  Zone 10 Immobilisée
-  Zone 9 Immobilisée
-  Zone charpentier
-  Zone électricien Dépose
-  Zone électricien Pose








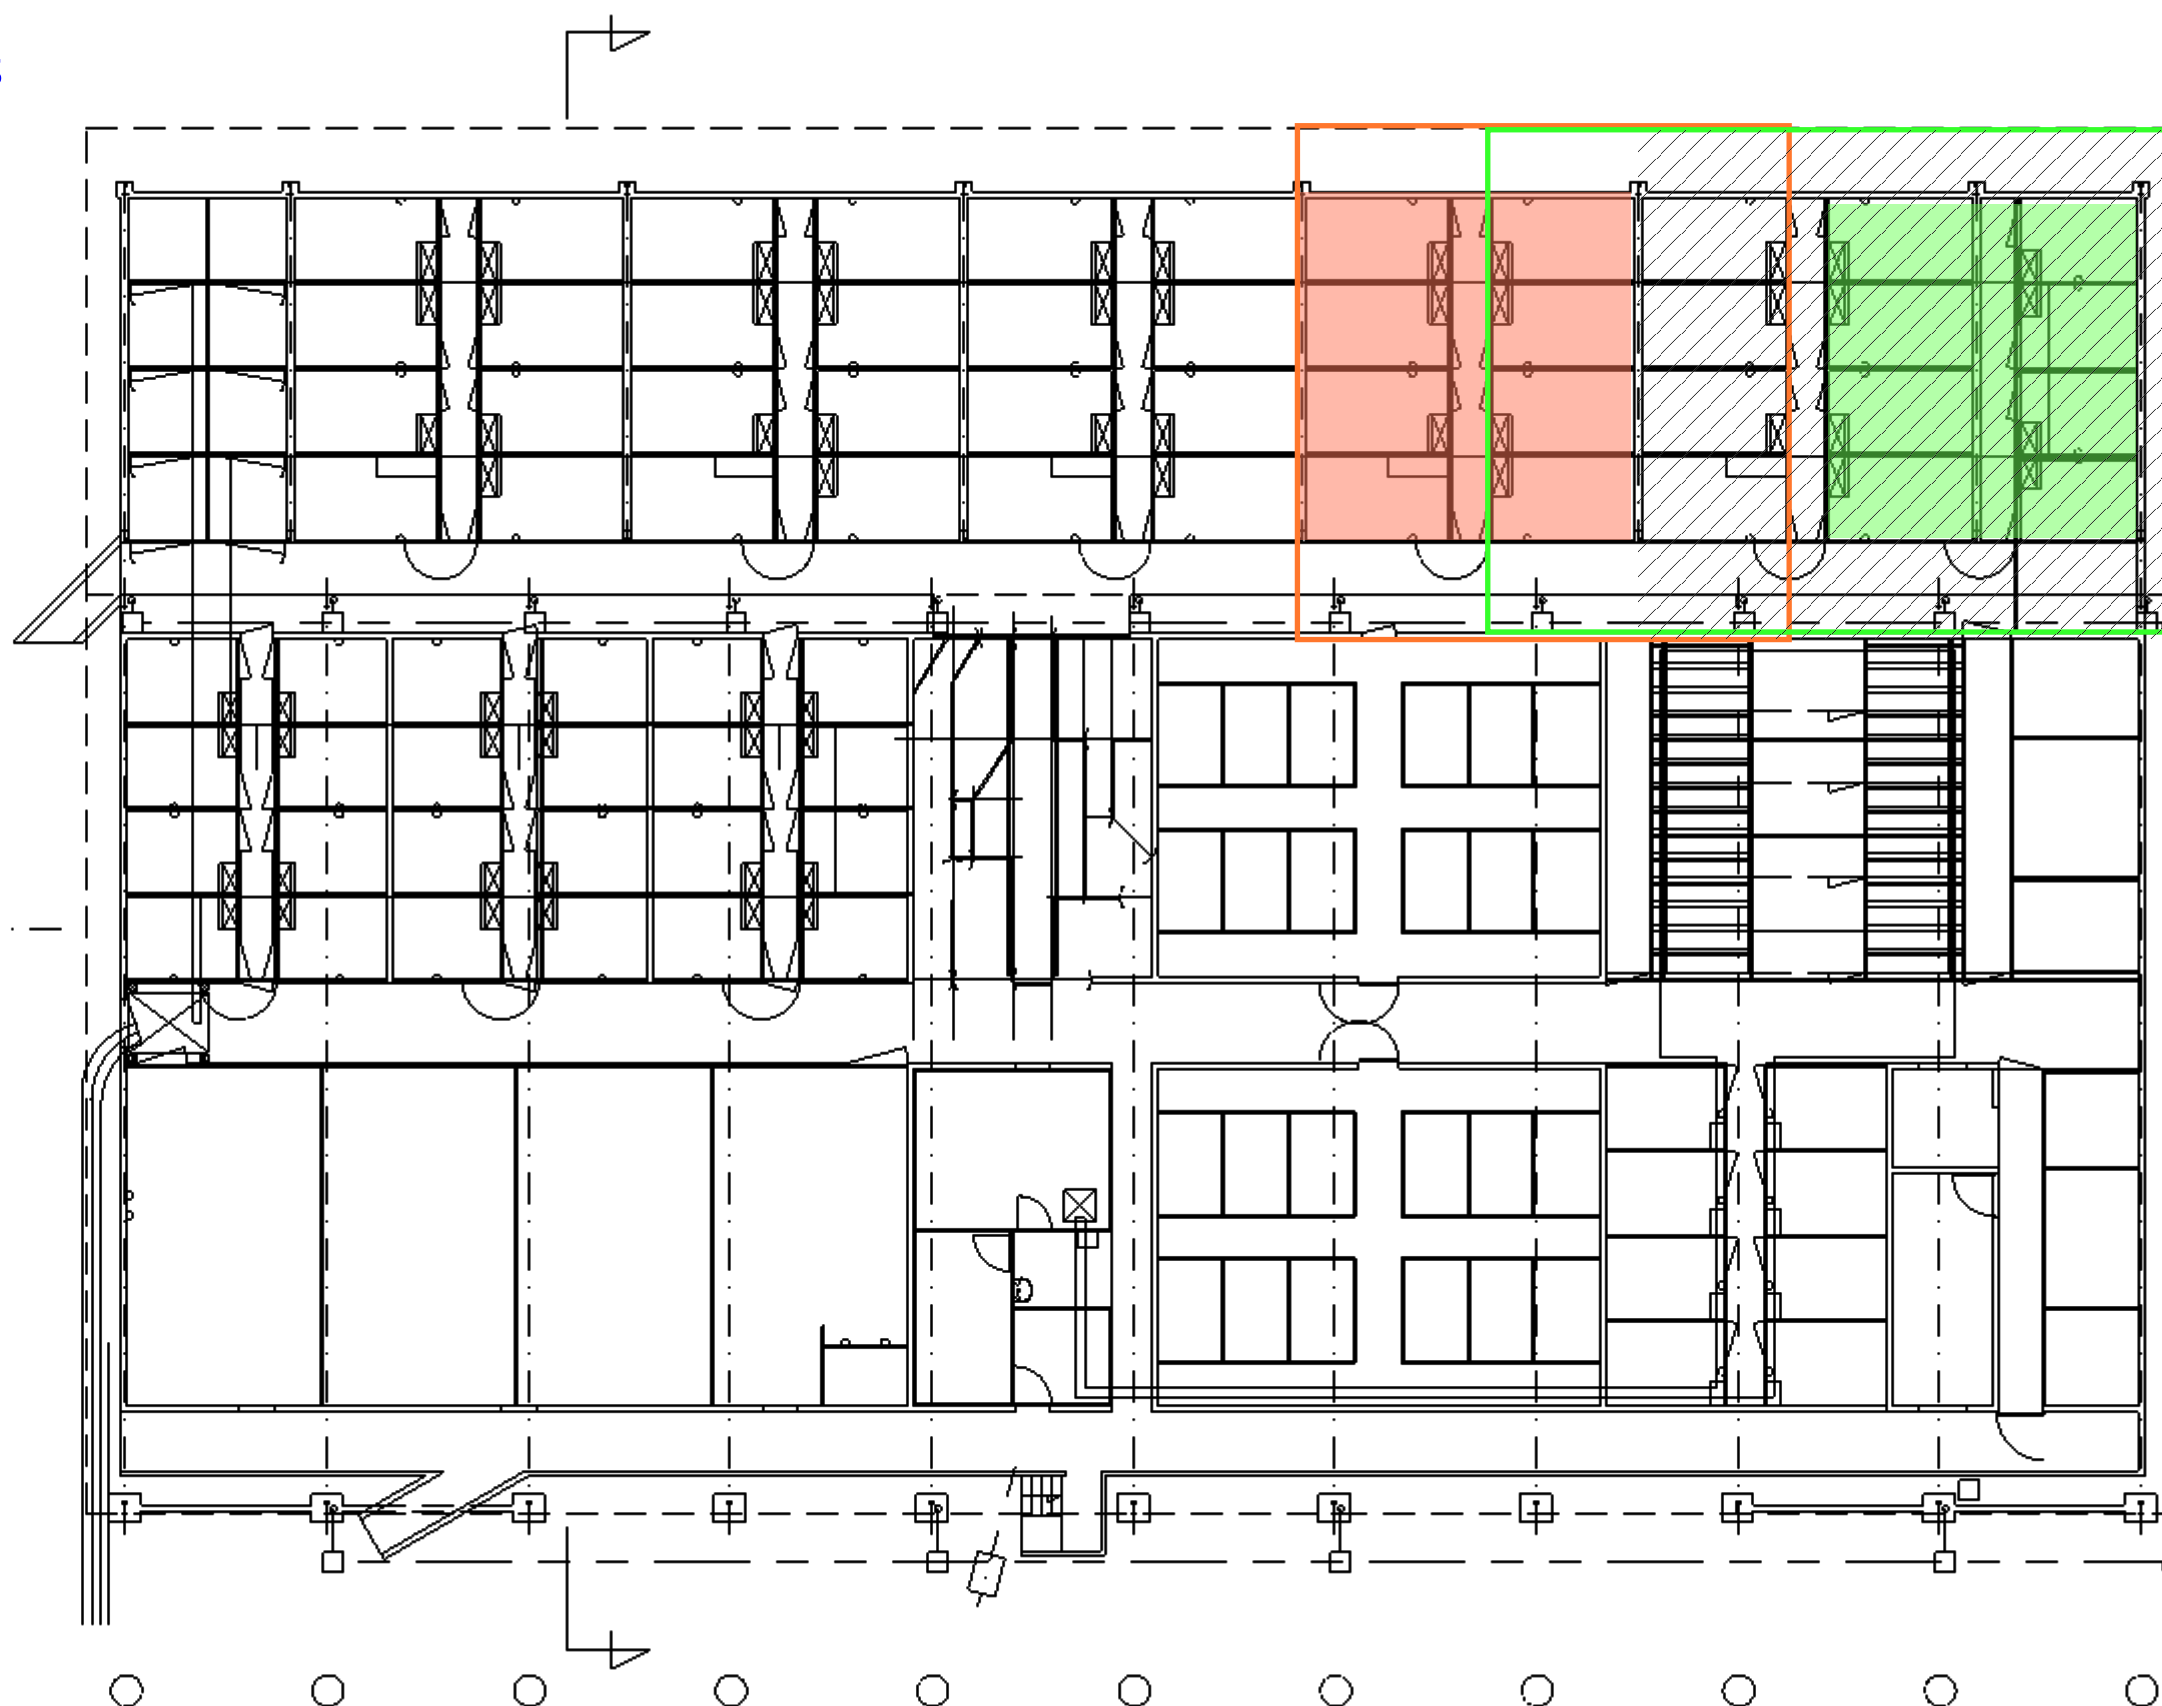
Plan pour coordination des interventions Semaine 12

-  Zone 11 Immobilisée
-  Zone 10 Immobilisée
-  Zone charpentier
-  Zone électricien Dépose
-  Zone électricien Pose






Plan pour coordination des interventions Semaine 13

-  Zone 12 Immobilisée
-  Zone 11 Immobilisée
-  Zone charpentier
-  Zone électricien Dépose
-  Zone électricien Pose



Plan pour coordination des interventions Semaine 14

-  Zone 12 Immobilisée
-  Zone électricien Pose
-  Zone électricien
Dépose des installations
de chantier et pose des
nouveaux équipements

