

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SERVICE D'ACCUEIL DES URGENCES ADULTES ET PÉDIATRIQUES HÔPITAL DELAFONTAINE

SAINT - DENIS (93)

B7 _ PLAN DE PHASAGE




- En activité
- Curage / démolition
- Construction

B7


PLAN DE PHASAGE
1B


PHASE 1b																			
2026				2027								2028							
Tri 4				Tri 1		Tri 2		Tri 3		Tri 4		Tri 1		Tri 2		Tri 3		Tri 4	
O	N	D		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A

ECHELLE 1 : 300

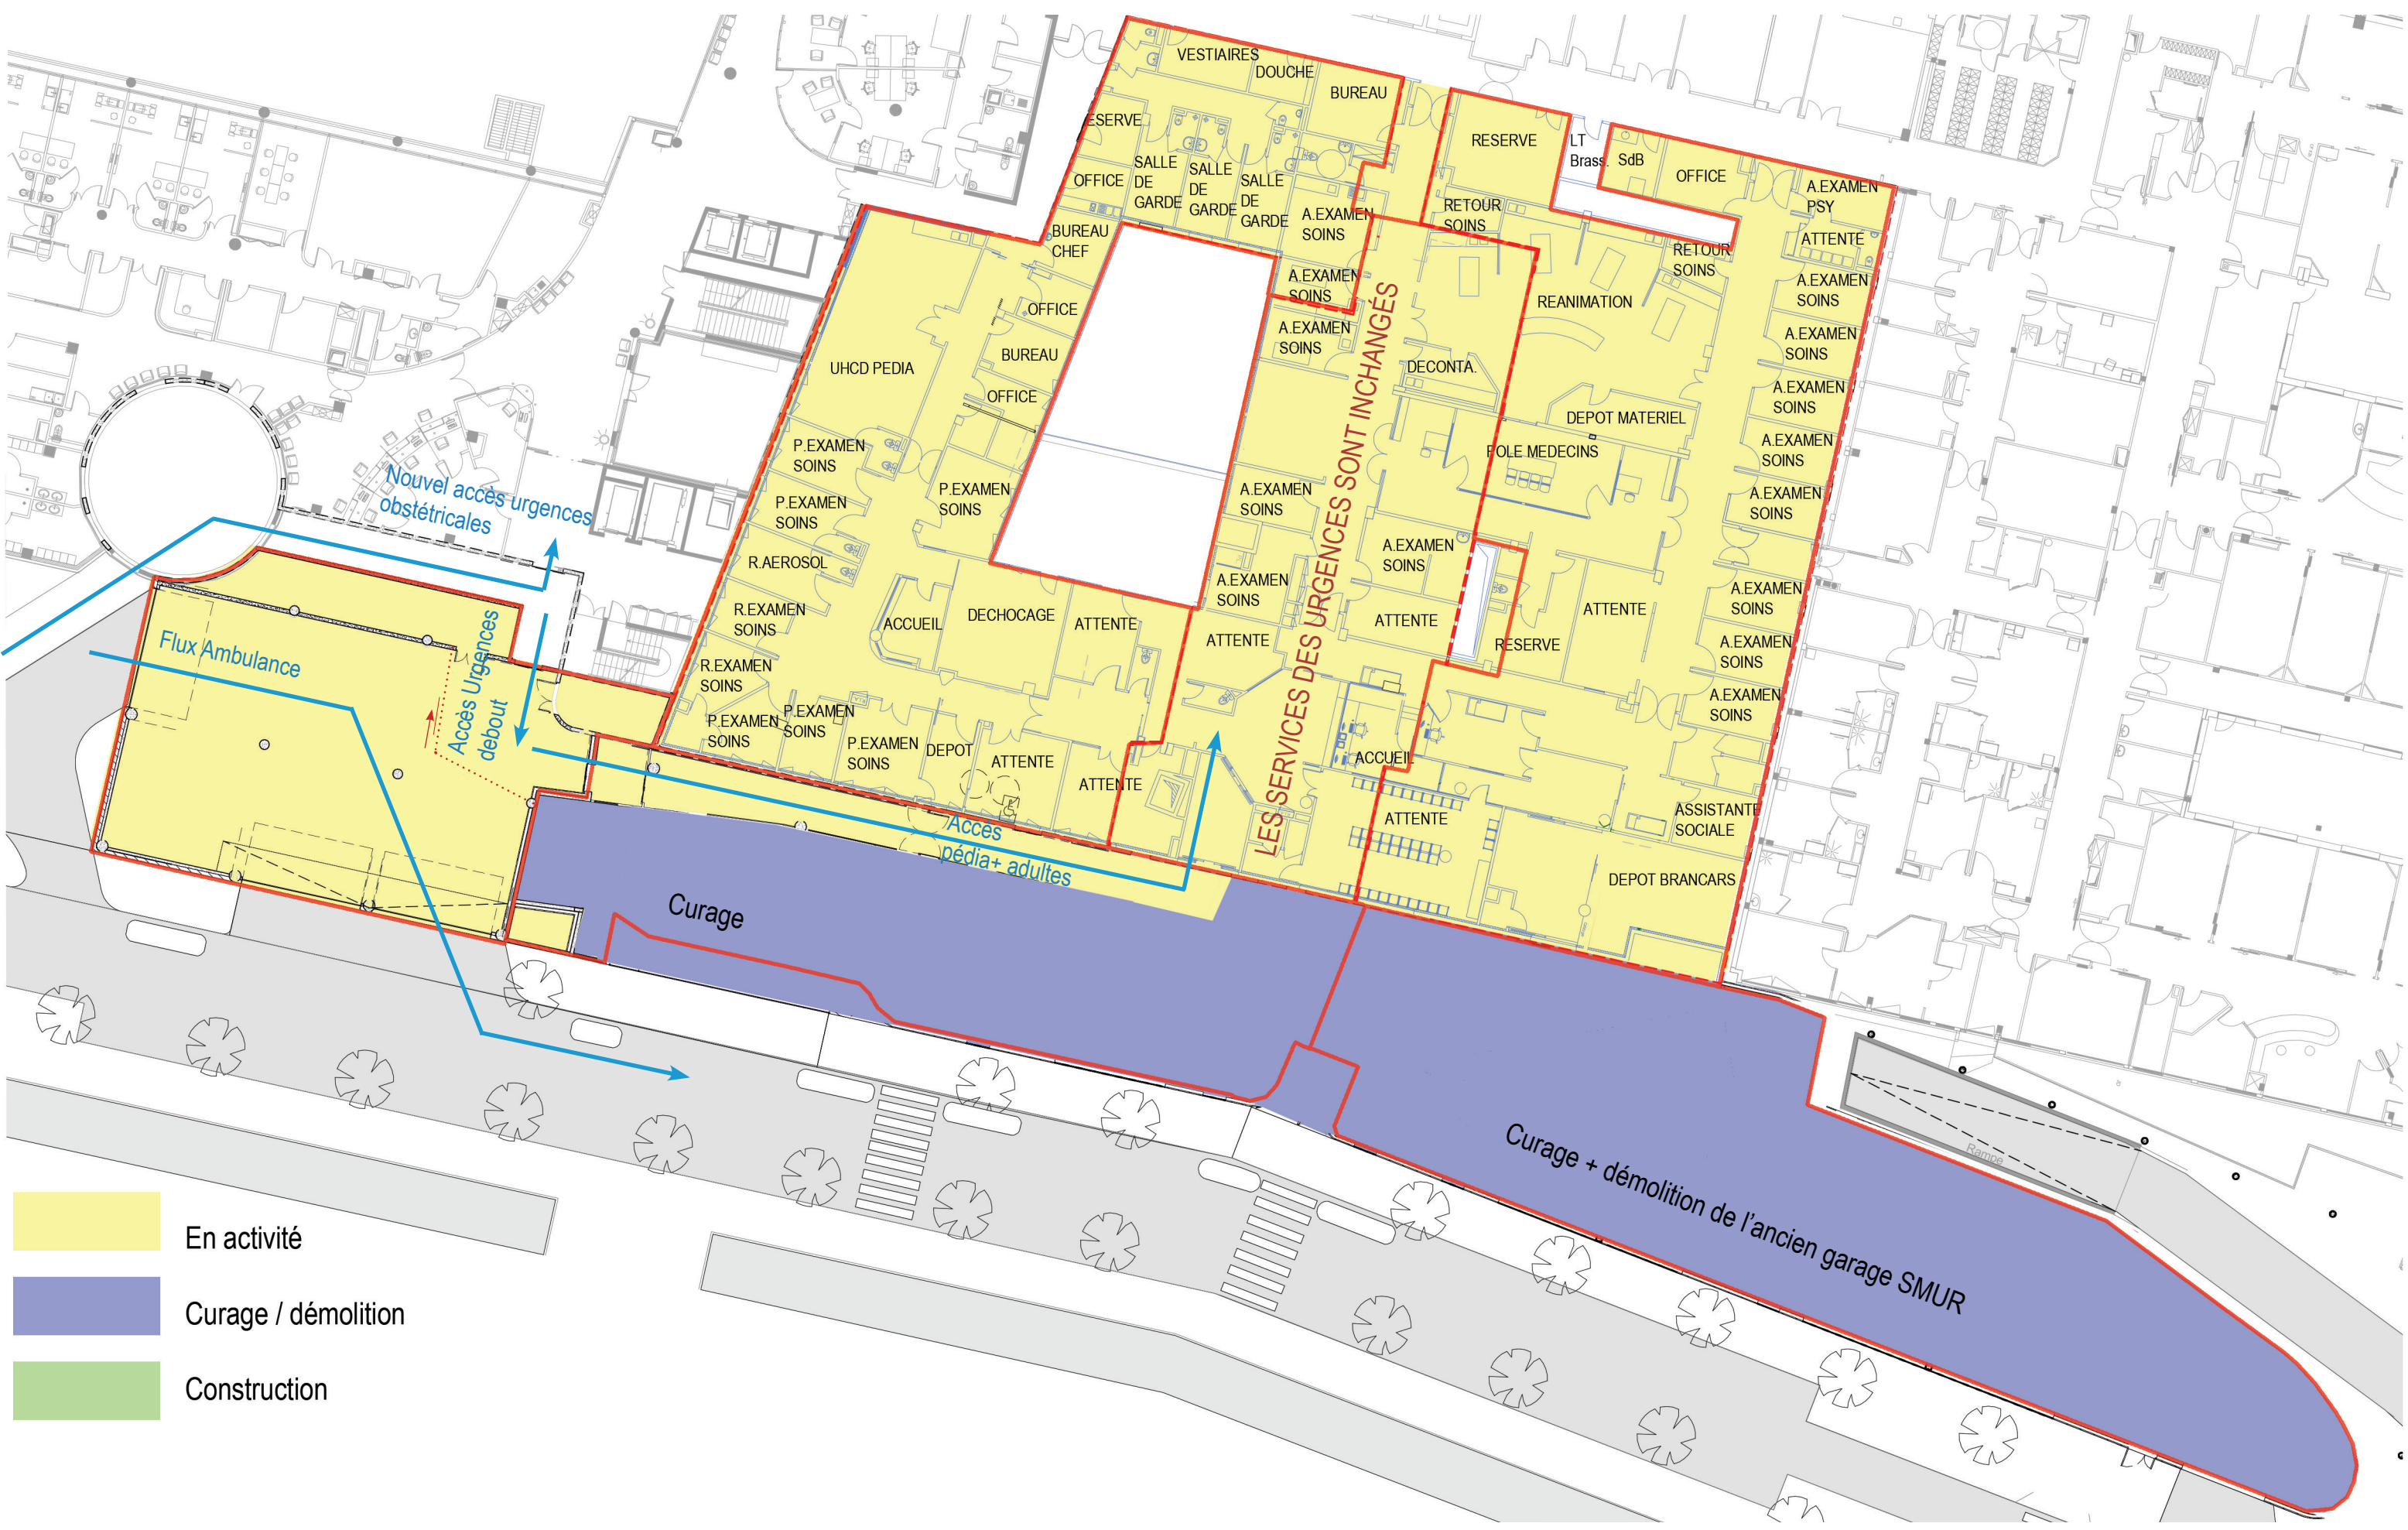

PHASE 1c																										
2026			2027										2028													
Tri 4			Tri 1			Tri 2		Tri 3			Tri 4		Tri 1			Tri 2			Tri 3			Tri 4				
O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

[illegible]

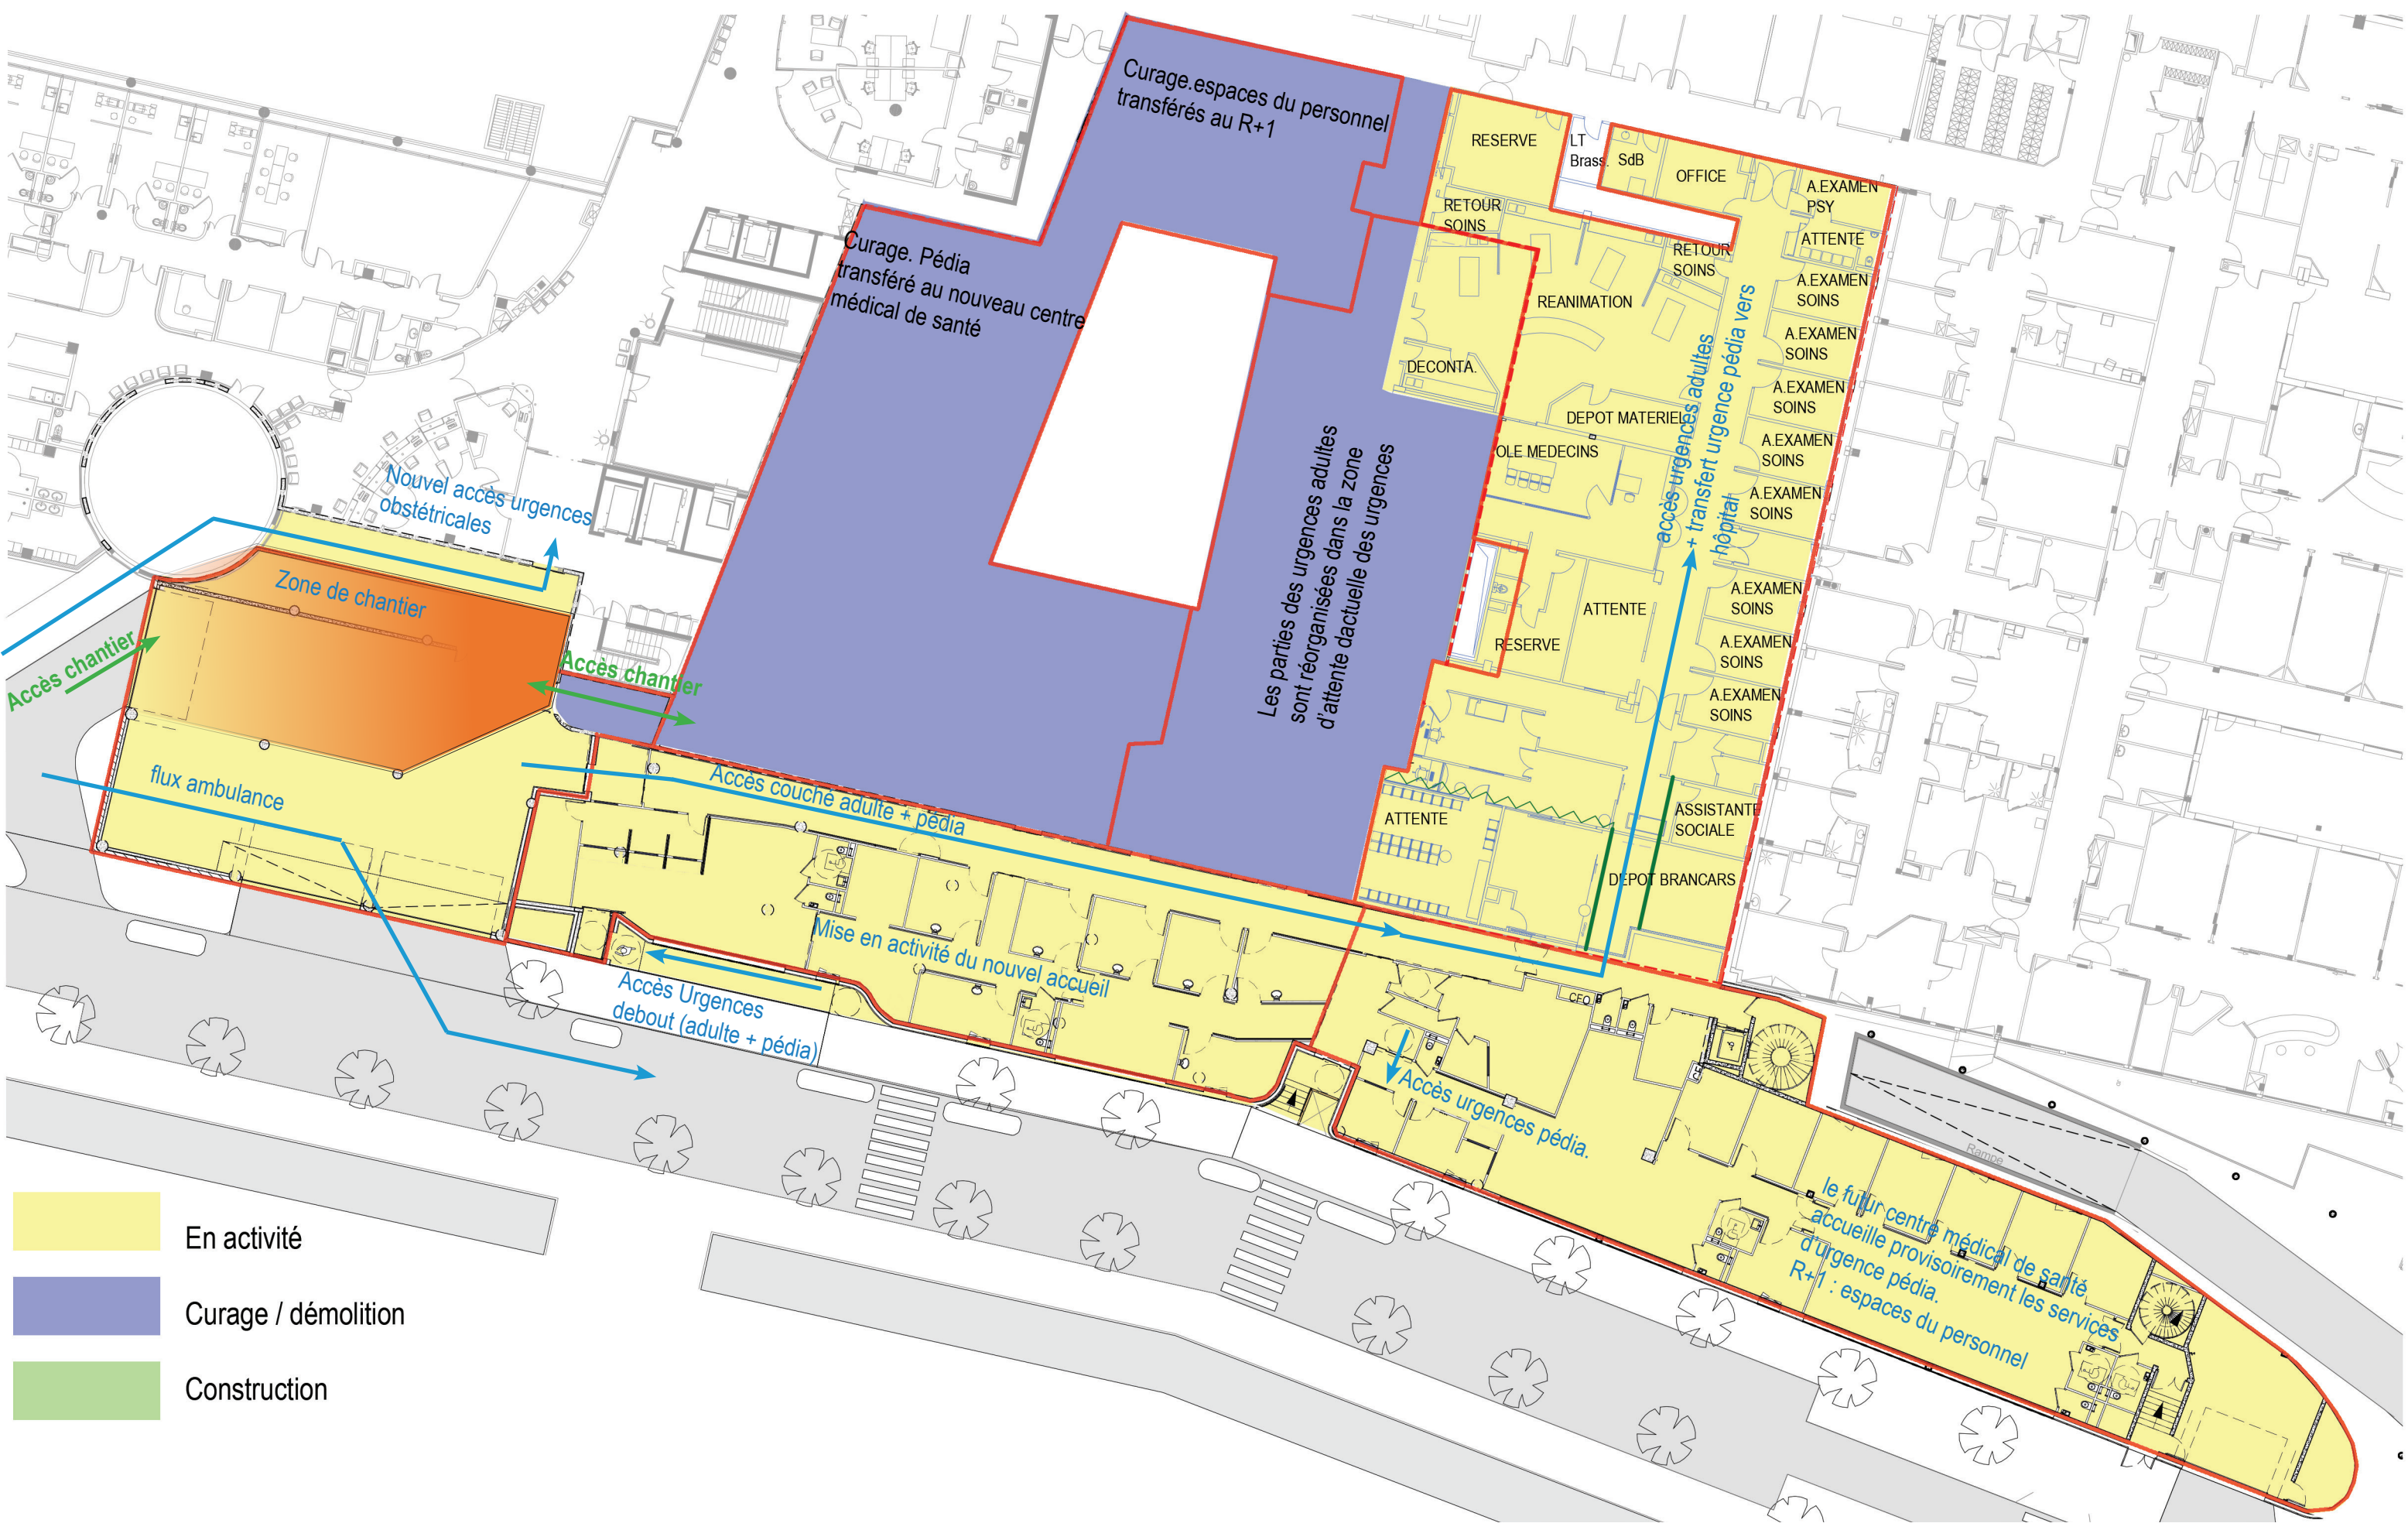

PHASE 2a															
2026				2027								2028			
Tri 4				Tri 1		Tri 2		Tri 3		Tri 4		Tri 1		Tri 2	
O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J



- En activité
- Curage / démolition
- Construction

B7

PLAN DE PHASAGE 2B


PHASE 2b															
2026				2027								2028			
Tri 4				Tri 1		Tri 2		Tri 3		Tri 4		Tri 1		Tri 2	
O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J

ECHELLE 1 : 300



1/ Les espaces du personnel en RDC déplacés lors du transfert des services seront réaffectés au R+1.

Les espaces du personnels seront mis en activités dès la construction du CMS et de l'accueil et orientation.

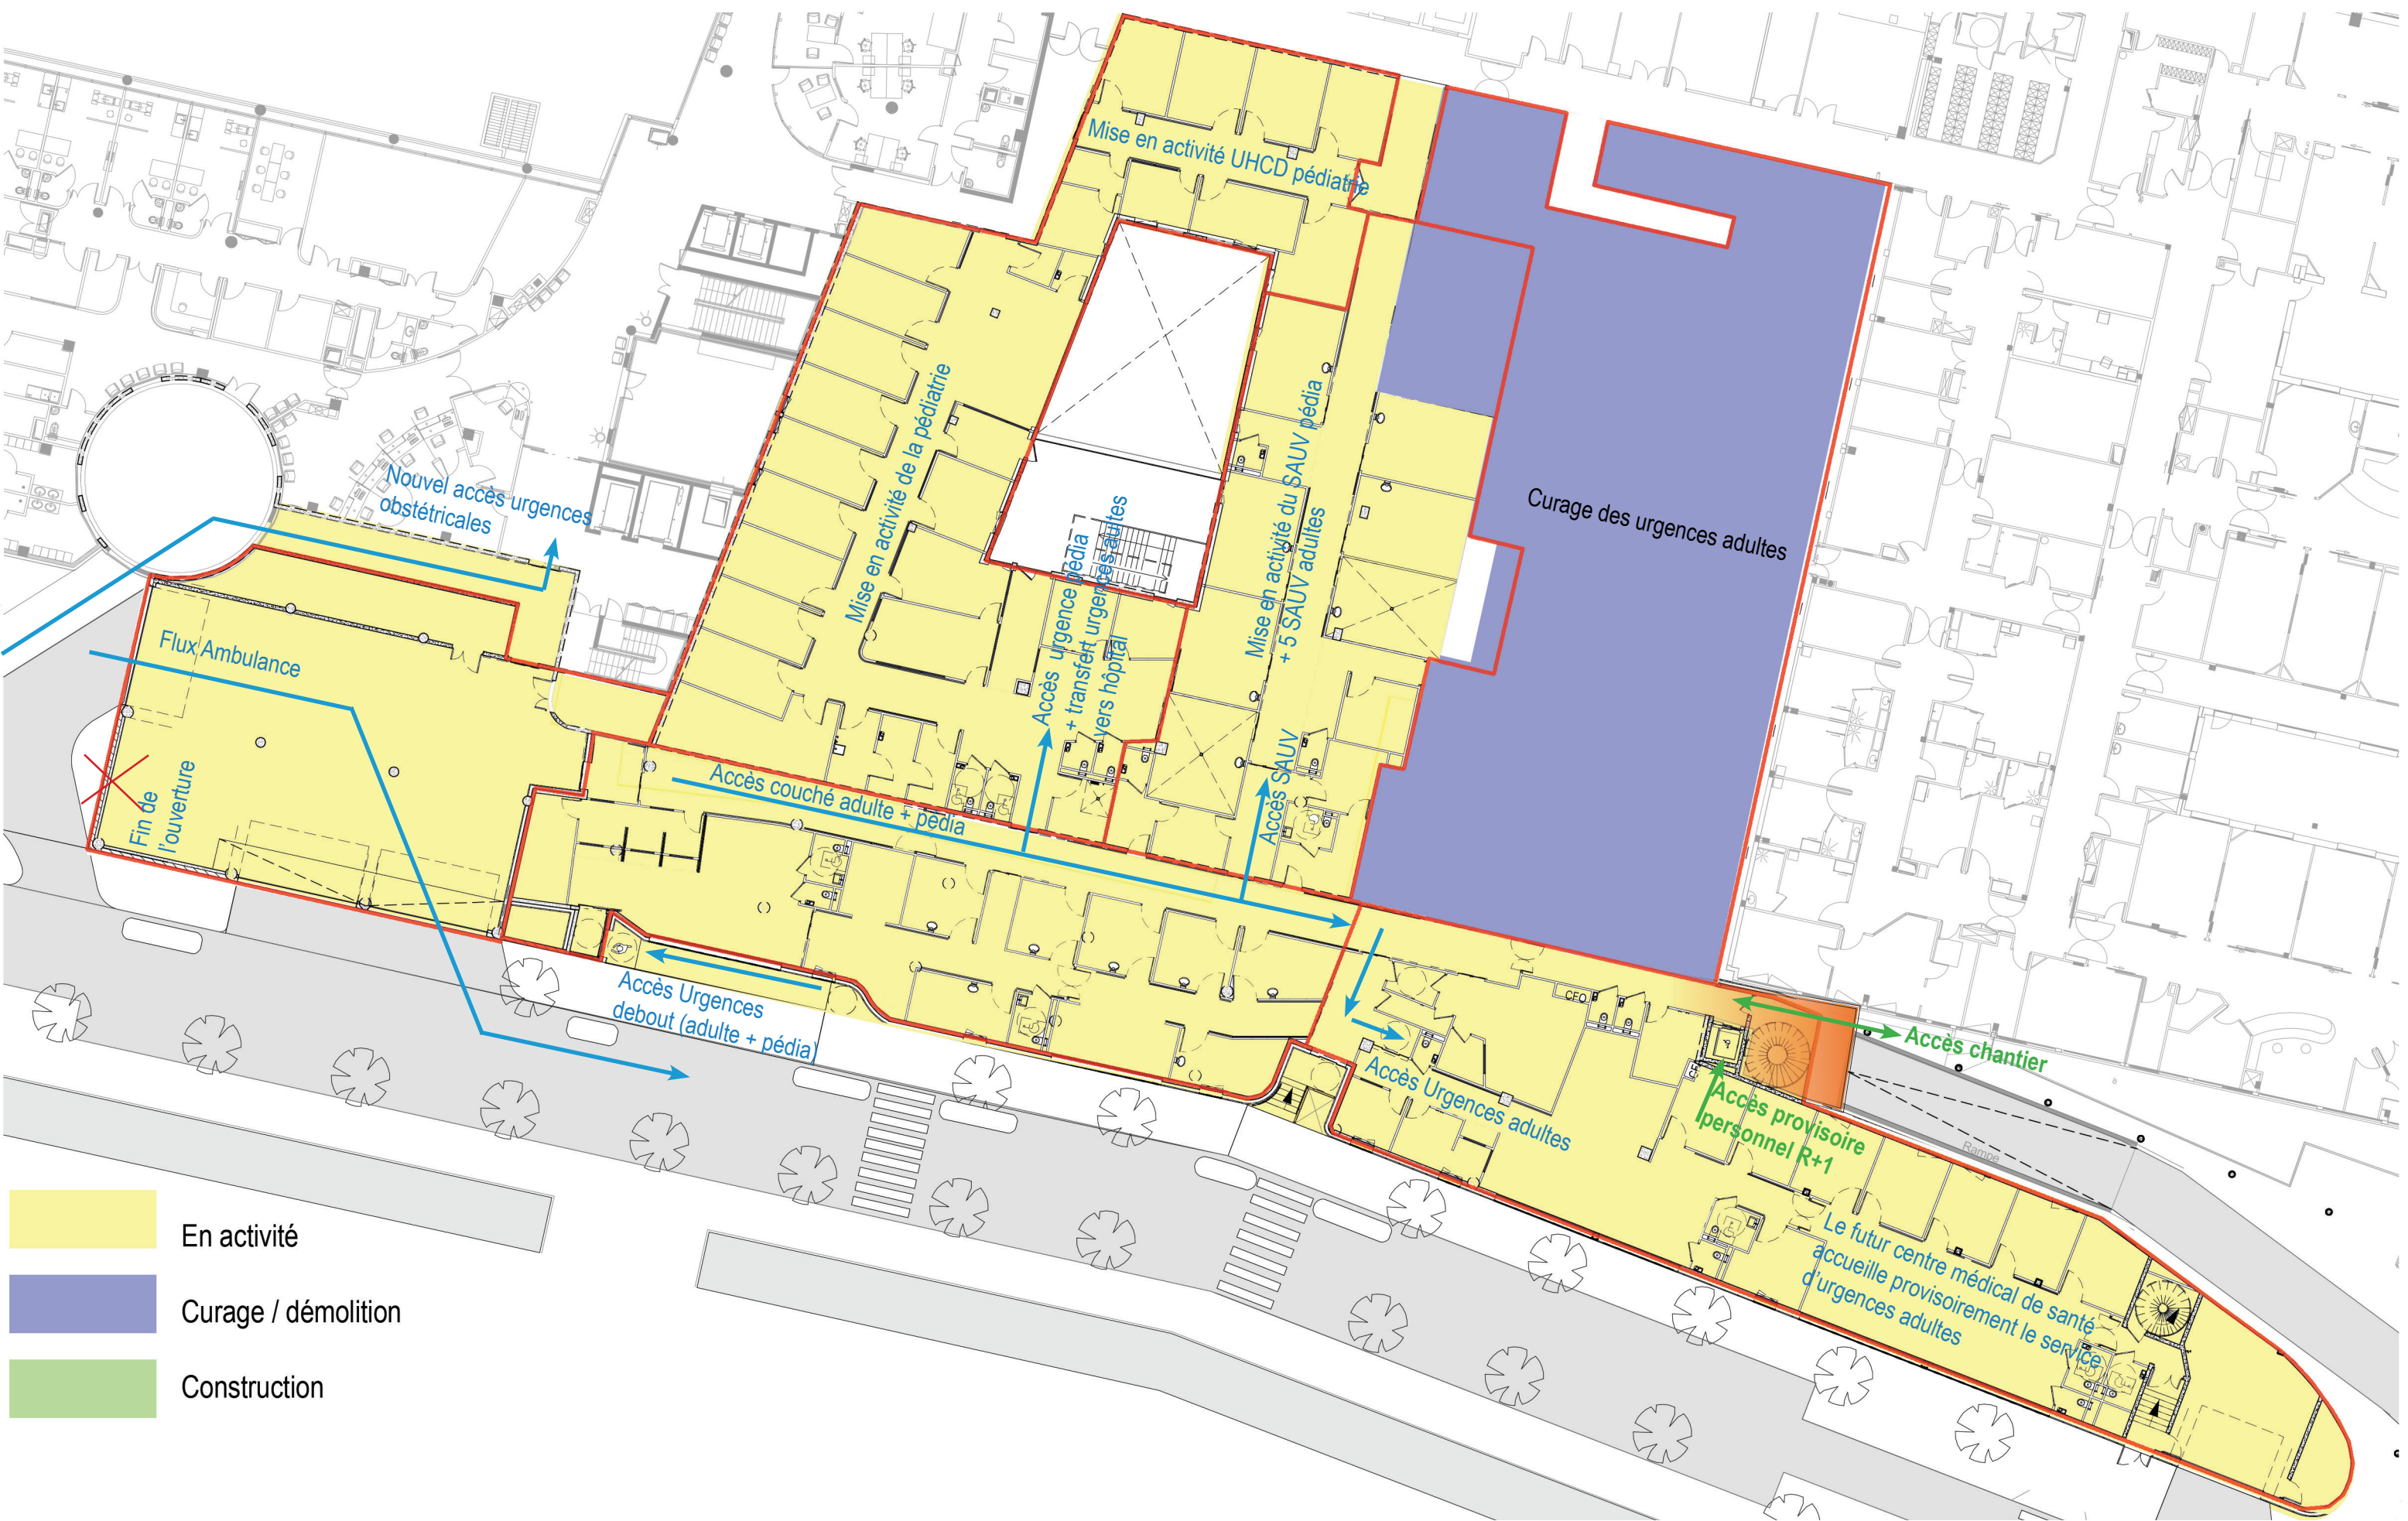

- En activité
- Curage / démolition
- Construction

B7

PLAN DE PHASAGE
3A

PHASE 3a															
2026				2027								2028			
Tri 4				Tri 1		Tri 2		Tri 3		Tri 4		Tri 1		Tri 2	
O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J

ECHELLE 1 : 300



- En activité
- Curage / démolition
- Construction

B7

PLAN DE PHASAGE
3B

PHASE 3b																			
2026				2027								2028							
Tri 4				Tri 1		Tri 2		Tri 3		Tri 4		Tri 1		Tri 2		Tri 3		Tri 4	
O	N	D	J	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A

ECHELLE 1 : 300

DÉPLACEMENT DU SERVICE ADULTES DANS LE CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ



1/ 11 salles d'examens sur 15 sont transférées dans le nouveau CMS, rajout possible de salles d'examens dans les box IOA du nouvel accueil

2/ Un cloisonnement mobile ou amovible préexistant au premier transfert sert de partition.

3/ Le R+1 est en activité, identiquement au premier transfert, son accès se fait provisoirement par le service des urgences adultes transféré

4/ Le nouveau service pédiatrique est fonctionnel.

Le nouveau SAUV est à 90% actif avec 2 salles pédiatriques et 5 salles adultes.

La 6^{eme} salle est construite en même temps que les urgences adultes.

Pour rappel, dès que le transfert des urgences adultes effectué dans le CMS, le curage de la zone ainsi que la construction du nouveau service d'urgences adultes est entrepris.

A ce moment du projet, l'ensemble du site excepté les urgences adultes est livré et en service.

Le transfert Urgences adultes vers les autres services hospitaliers transitent provisoirement par le service des urgences pédiatriques.

