



Etablissement support :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON BOURGOGNE

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET LOGISTIQUES

5 Boulevard Jeanne d'Arc

B.P 77908

21079 DIJON CEDEX

Téléphone : 03 80 29 33 80

Fax : 03 80 29 35 00

Filière opacité thoracique
Restructuration partielle du service existant
d'oncologie thoracique
Bâtiment B62 – Aile Ouest – Niveau R+3

PRESENTATION DE L'OPERATION



1. CONTEXTE

Constat

Le service est actuellement organisé avec, à l'entrée, des chambres d'hospitalisation de personnes en traitement voir en fin de vie, et au centre du service se situe l'hôpital de jour. Cette organisation impose un flux de patients important dans la circulation centrale du service devant les chambres des patients hospitalisés sur le long terme, ce qui représente une gêne au quotidien pour ces derniers et une organisation des soins non optimale.

Enjeux

La restructuration partielle du service avec la mise en place des salles de consultation de l'hôpital de jour en début de service et le déplacement des chambres d'hospitalisation au cœur du service permettra de mieux répondre aux problématiques rencontrées actuellement par les soignants et les patients du service.


2. PROJET

Le projet de restructuration partielle du service d'oncologie thoracique prévoit donc l'aménagement des locaux existants en site occupé et avec la continuité de service. C'est pourquoi les travaux devront se dérouler par « phases » au sens « zones » afin de permettre cette continuité de service au maximum.

Les interventions prévues dans le cadre du projet sont les suivantes :

- Zones travaux 1 et 3 :
 - Transformation de 8 chambres individuelles à l'entrée du service en 7 salles de 3 fauteuils pour l'hôpital de jour et 1 salle de consultation
- Zone travaux 2 :
 - Déplacement de la salle de soins à la place d'une salle de consultation
 - Déplacement du bureau des internes dans la salle de soins actuelle
 - Création d'une chambre en lieu et place d'un bureau médical
 - Création d'une chambre à 2 lits en lieu et place d'une chambre d'HJ
 - Création d'une chambre à 2 lits en lieu et place d'une salle à 4 fauteuils
 - Agrandissement d'un local stockage en ouvrant sur sanitaire existant à supprimer
- Zone travaux 4 :
 - Création d'une salle de consultation en lieu et place de local linge sale + local déchets
 - Agrandissement du bureau cadre actuel pour création du secrétariat 4 postes
 - Création du bureau cadre dans l'espace restant


Cette opération est montée en marché accord cadre CHU. La procédure retenue pour la passation du marché est en bon de commande ou en marché subséquent.

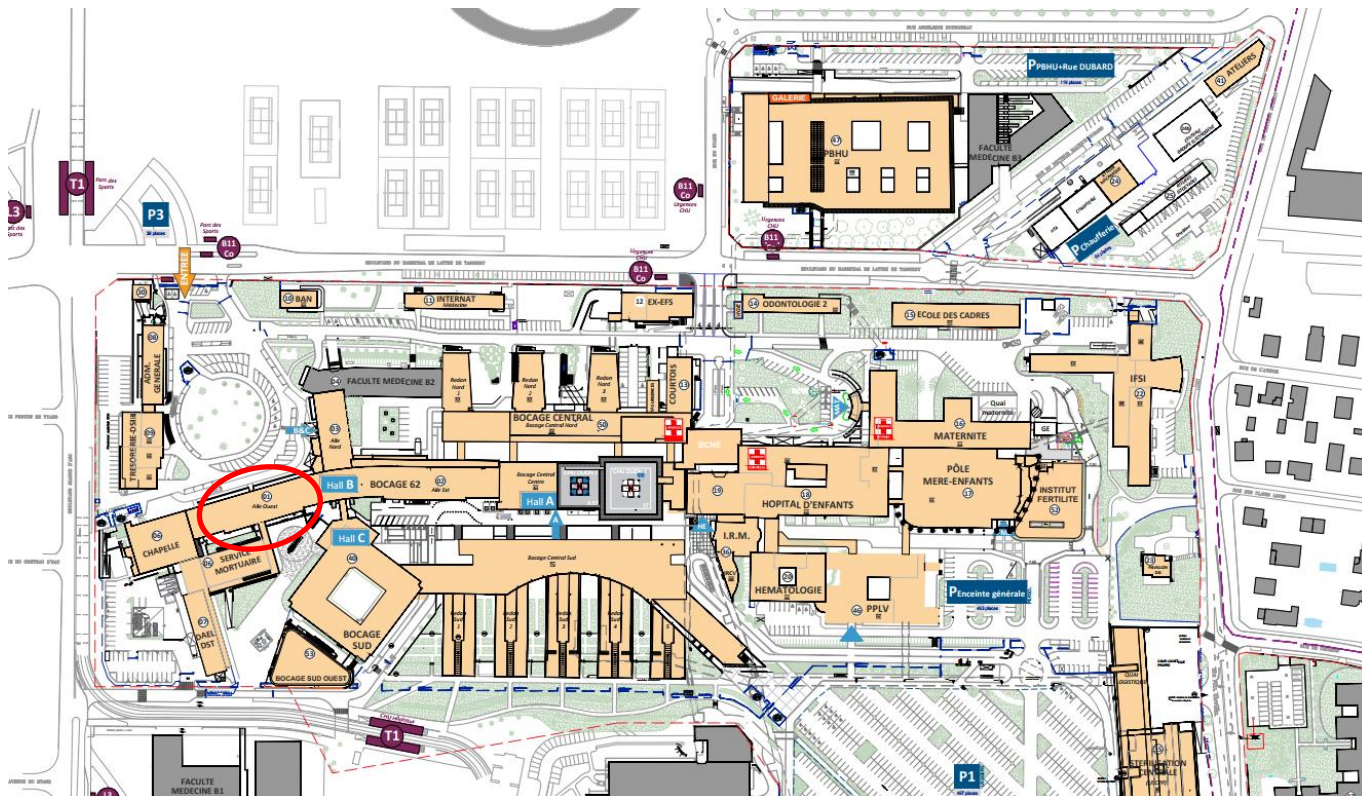

Plan de masse site Bocage

Phasage travaux

- PHASE TRAVAUX 1
- PHASE TRAVAUX 2
- PHASE TRAVAUX 3
- PHASE TRAVAUX 4

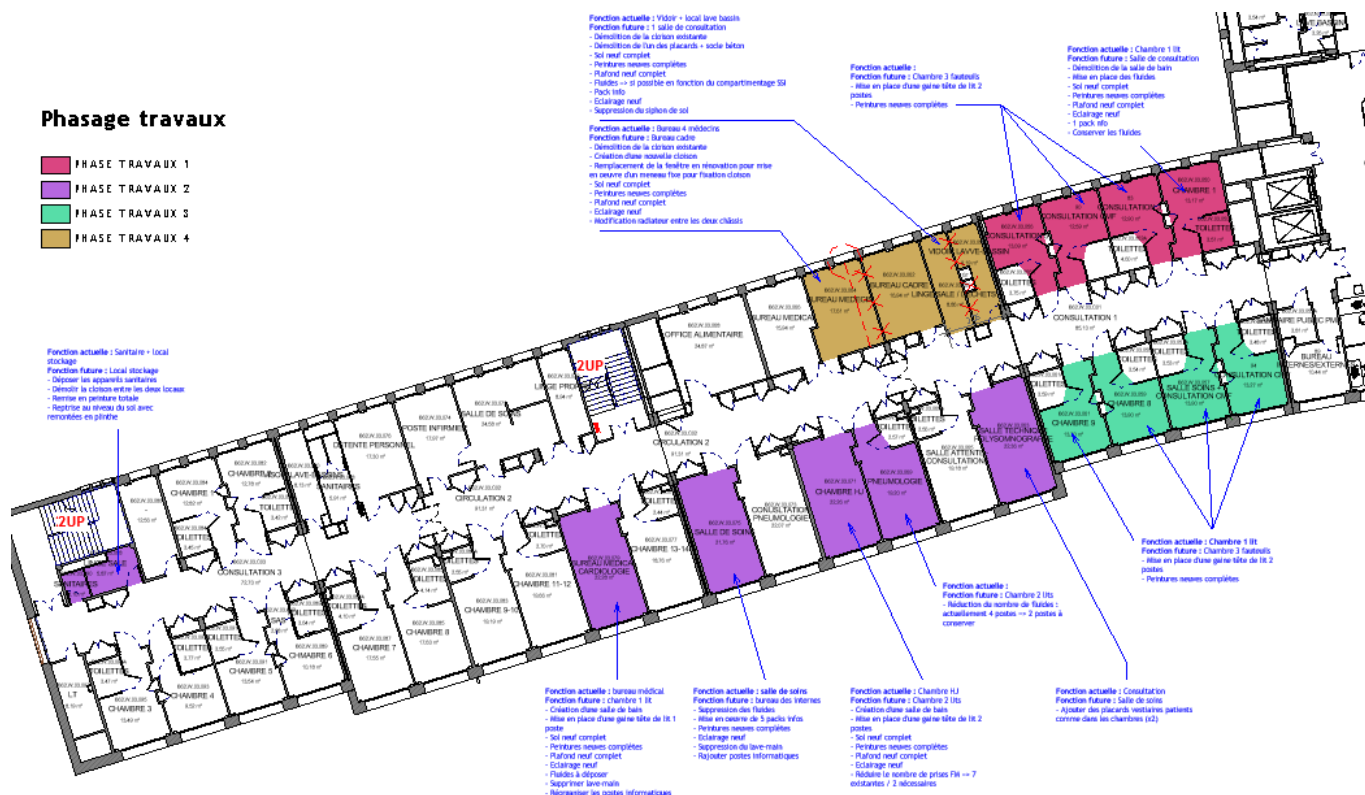

Surfaces projetées en pré dimensionnement

3. CHIFFRES ET CALENDRIER

Surface

- Réhabilitation : 280 m² SDO

Coût Travaux :

- Coût Travaux : 300 000 € HT

Calendrier

- Début des études : Mai 2026
- Début des travaux : selon proposition MOE dans le cadre du présent Accord Cadre
- Réception Zone 1 : selon proposition MOE dans le cadre du présent Accord Cadre
- Réception Zone 2 : selon proposition MOE dans le cadre du présent Accord Cadre
- Réception Zone 3 : selon proposition MOE dans le cadre du présent Accord Cadre
- Réception Zone 4 : selon proposition MOE dans le cadre du présent Accord Cadre

4. ANNEXES

1. Plan de l'existant
