

**PROJET RJH**  
**INSTRUCTIONS GENERALES DE CHANTIER**  
**GESTION DES LIVRAISONS**

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Date d'approbation

## SOMMAIRE

<b>0</b>	<b>DESCRIPTION DES INDICES .....</b>	<b>3</b>
0.1	DESCRIPTION DES INDICES .....	3
0.2	DOCUMENTS DE REFERENCE.....	3
0.3	TERMINOLOGIE .....	3
<b>1</b>	<b>OBJET .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>REGLES GENERALES .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>MODE OPERATOIRE .....</b>	<b>5</b>
3.1	PREALABLE A EXPEDITION .....	5
3.2	CONTROLE DE CONFORMITE .....	6
<b>4</b>	<b>PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITE POUR LE CAS 1 .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITE POUR LE CAS 2 .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITE POUR LE CAS 3 .....</b>	<b>9</b>

## 0 DESCRIPTION DES INDICES

### 0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Indice	Date	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
A	/	D. FONTAINE	G. CADIOU	JP. DUPUY
B	/	R. BURGAT	M. PHILIPPON	JP. DELAMOTTE
C	23/06/2011	A. LAGARRIGUE	M. PHILIPPON	JP. DELAMOTTE
D	11/06/2019	A. LAGARRIGUE	A. BOURELLY M. COLLET	B. GOUGIS
E	11/06/2021	G. VILLARD	R. BONNET	A. LAGARRIGUE

#### Description des indices :

- Indice D :
  - Mise à jour du document au format Technicatome,
  - Mise à jour des paragraphes 3.1, 3.2,
- Indice E :
  - Mise à jour suivant la nouvelle organisation de l'Equipe projet RJH. L'Equipe Projet RJH est l'entité CEA assurant les missions de Maîtrise d'Ouvrage (MOA) et Maîtrise d'œuvre (MOE).
  - Distinction des cas de livraison et clarification des annexes attendues avec le protocole de livraison
  - Mention de l'inspection dans processus d'acceptation des livraisons
  - Prise en compte de l'analyse 8D relative au PVR usine
- Indice F :
  - Introduction de mentions dérogatoires,

### 0.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

[1]	Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé	EXT-581698*
[2]	Règlement de chantier	TA-577121*
[3]	Projet RJH – IGC – Formalités d'accès	TA-578148*
[4]	LCQ 24 – Modalités des recettes usines avec réserve avant livraison sur le site RJH	TA-6143336
[5]	Spécification de Management Applicable aux Fournisseurs	TA-604107 *

\* Indice en vigueur

### 0.3 TERMINOLOGIE

CII : Constat Immédiat d'Inspection

IGC : Instructions Générales de Chantier

FNC : Fiche de Non-Conformité  
LOMC : Liste des Opérations de Montage et de Contrôle  
PVR : Procès-Verbal de Recette Usine  
RCE : Responsable Corps d'Etat  
RL : Responsable de lot  
SSC : Superviseur Sécurité Chantier

## 1 **OBJET**

La présente instruction a pour objet de définir, les conditions de livraison sur le chantier RJH des fournitures et matériels à installer dans le cadre des contrats de réalisation et montage site.

## 2 **REGLES GENERALES**

Trois cas sont à distinguer lorsqu'il est question de livraison sur site :

- Cas 1 : Matériels et fournitures nécessitant une recette documentaire de la part du CEA ;
- Cas 2 : Produits, matériels et matériaux d'approvisionnement du commerce, de type « catalogue », visserie ou n'ayant pas fait l'objet d'une recette documentaire de la part du CEA conformément à son plan de surveillance ;
- Cas 3 : Produits, matériels et matériaux provisoires non voués à rester dans l'ouvrage (ex : outillages, consommables, etc.). Ce cas ne concerne pas le matériel soumis à un montage à blanc sur site avant retour en usine.

### Mentions dérogatoires :

- Concernant les équipements non classés, le retour d'expérience du CEA sur la surveillance des réalisations précédentes d'équipements classés, peut conduire à l'allègement de la surveillance sur ces équipements non classés. Le Constat Immédiat d'Inspection (CII) ainsi que le Procès-Verbal de Recette (PVR) des équipements classés mentionneront cet allègement autorisant ainsi la livraison des équipements non classés suivants sans fourniture de nouveaux CII et PVR.
- Concernant les équipements de série, le retour d'expérience du CEA sur la surveillance des réalisations précédentes peut conduire à un allègement de cette surveillance. Le Constat Immédiat d'Inspection (CII) ainsi que le Procès-Verbal de Recette (PVR) mentionneront cet allègement autorisant ainsi la livraison des séries suivantes sans fourniture de nouveaux CII et PVR.

Lors des réunions de pilotage hebdomadaires, les titulaires de lots communiquent à l'Equipe Projet RJH leurs programmes de livraison à 3 semaines pour tous les cas cités ci-dessus.

Les programmes de livraison font apparaître clairement les dates des recettes usines ainsi que les matériels ou fournitures concernés. Ils permettent de tenir informé l'Equipe Projet RJH de l'avancement des points suivants :

- Prévisions des recettes en usine,
- Prévisions des livraisons sur site

Il n'est pas nécessaire de faire figurer dans ces programmes de livraison les produits, matériels et matériaux du cas 3.

Le titulaire de lot habilité (ou son représentant) doit être présent lors de la livraison des matériels sur le site.

En cas de non-respect des règles de livraison, le titulaire s'expose à un refus d'accéder sur le chantier. Si tel est le cas, le titulaire assume l'entière responsabilité de cette situation et de ses conséquences, qu'elles soient d'ordre planning ou de coûts.

Il est interdit d'introduire sur site RJH des matériels sans fournir au préalable les justificatifs détaillés ci-dessous.

### **3 MODE OPERATOIRE**

#### **3.1 PREALABLE A EXPEDITION**

Les documents suivants sont nécessaires pour livraison sur le chantier RJH :

- Cas 1 :
  - Protocole de sécurité ou Accès permanent suivant IGC [3] ;
  - Liste de colisage et/ou Bon de Livraison ;
  - Procès-Verbal de Réception usine (PVR) délivré par l'Inspection du projet RJH (peut être le PVR d'une tête de série).

En cas d'absence du PVR, la livraison est refusée, sauf dérogation écrite de l'inspecteur Site du projet RJH du Lot concerné.

#### **Rappel :**

Dans le cadre des recettes usines avec réserve, une dérogation à la fourniture du PVR avant la livraison du matériel sur site est possible, sous réserve que les conditions de la LCQ n°24 [4] soient respectées. Dans ce cas, le Titulaire fournit la FNC portant la liste des réserves approuvée par le CEA à la place du PVR. Lorsque l'ensemble des réserves auront été levées, le PVR sera établi.

- Cas 2 :
  - Protocole de sécurité ou Accès permanent suivant IGC [3] ;
  - Liste de colisage et/ou Bon de Livraison ;
  - Déclaration de conformité du titulaire à la commande CEA ou le Tableau de suivi des Certificats Matières / Déclarations de conformité à émettre complété <sup>(1)</sup> .

<sup>(1)</sup> Le Titulaire peut ne pas être en mesure de réaliser une déclaration de conformité à la commande CEA avant la livraison sur site. Dans ce cas, le Titulaire s'engage à fournir ces certificats matière et/ou Déclarations de conformités au plus tard dans les 3 mois suivant la livraison sur site des équipements. Pour cela, il tiendra à jour un tableau de suivi des certificats matière et/ou Déclarations de conformités à émettre qu'il transmettra à chaque cas rencontré.

Le Titulaire devra d'autre part transmettre un recueil de ces certificats matières et/ou Déclarations de conformités trimestriellement, accompagné de ce tableau de suivi mis à jour et de sa propre déclaration de conformité à la commande CEA couvrant la période.

- Cas 3 :
  - Protocole de sécurité ou Accès permanent suivant IGC [3].

Rappel :

Le jour de la livraison, le transporteur doit être en possession du protocole. Sans cela la livraison sur site sera refusée par les agents de gardiennage.


### 3.2 CONTROLE DE CONFORMITE

Le contrôle de conformité suite à livraison reste de la responsabilité du Titulaire ou son représentant et doit être tracé à travers le PQR / LOMC par des points de notification de l'inspection.


Rappel :

Les délais de prévenance, pour les notifications de l'inspection site et usine, sont indiqués dans la note [5].

#### 4 PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITE POUR LE CAS 1

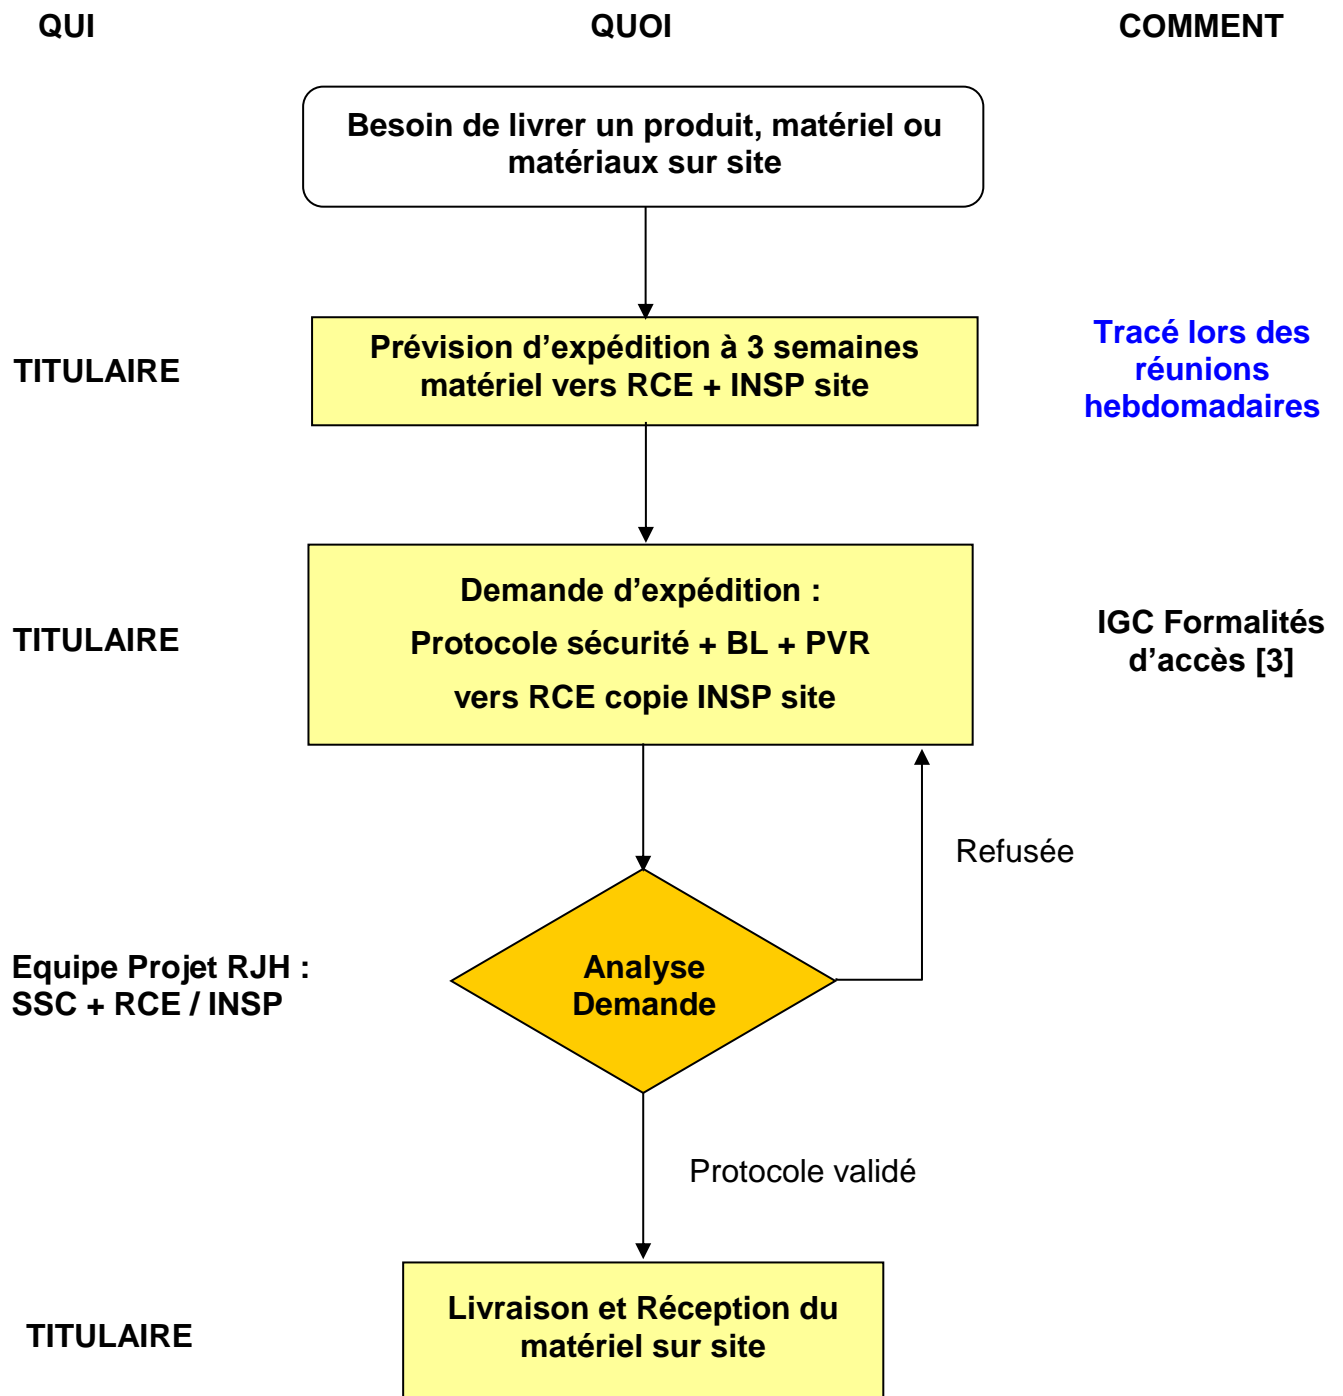


## 5 PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITE POUR LE CAS 2

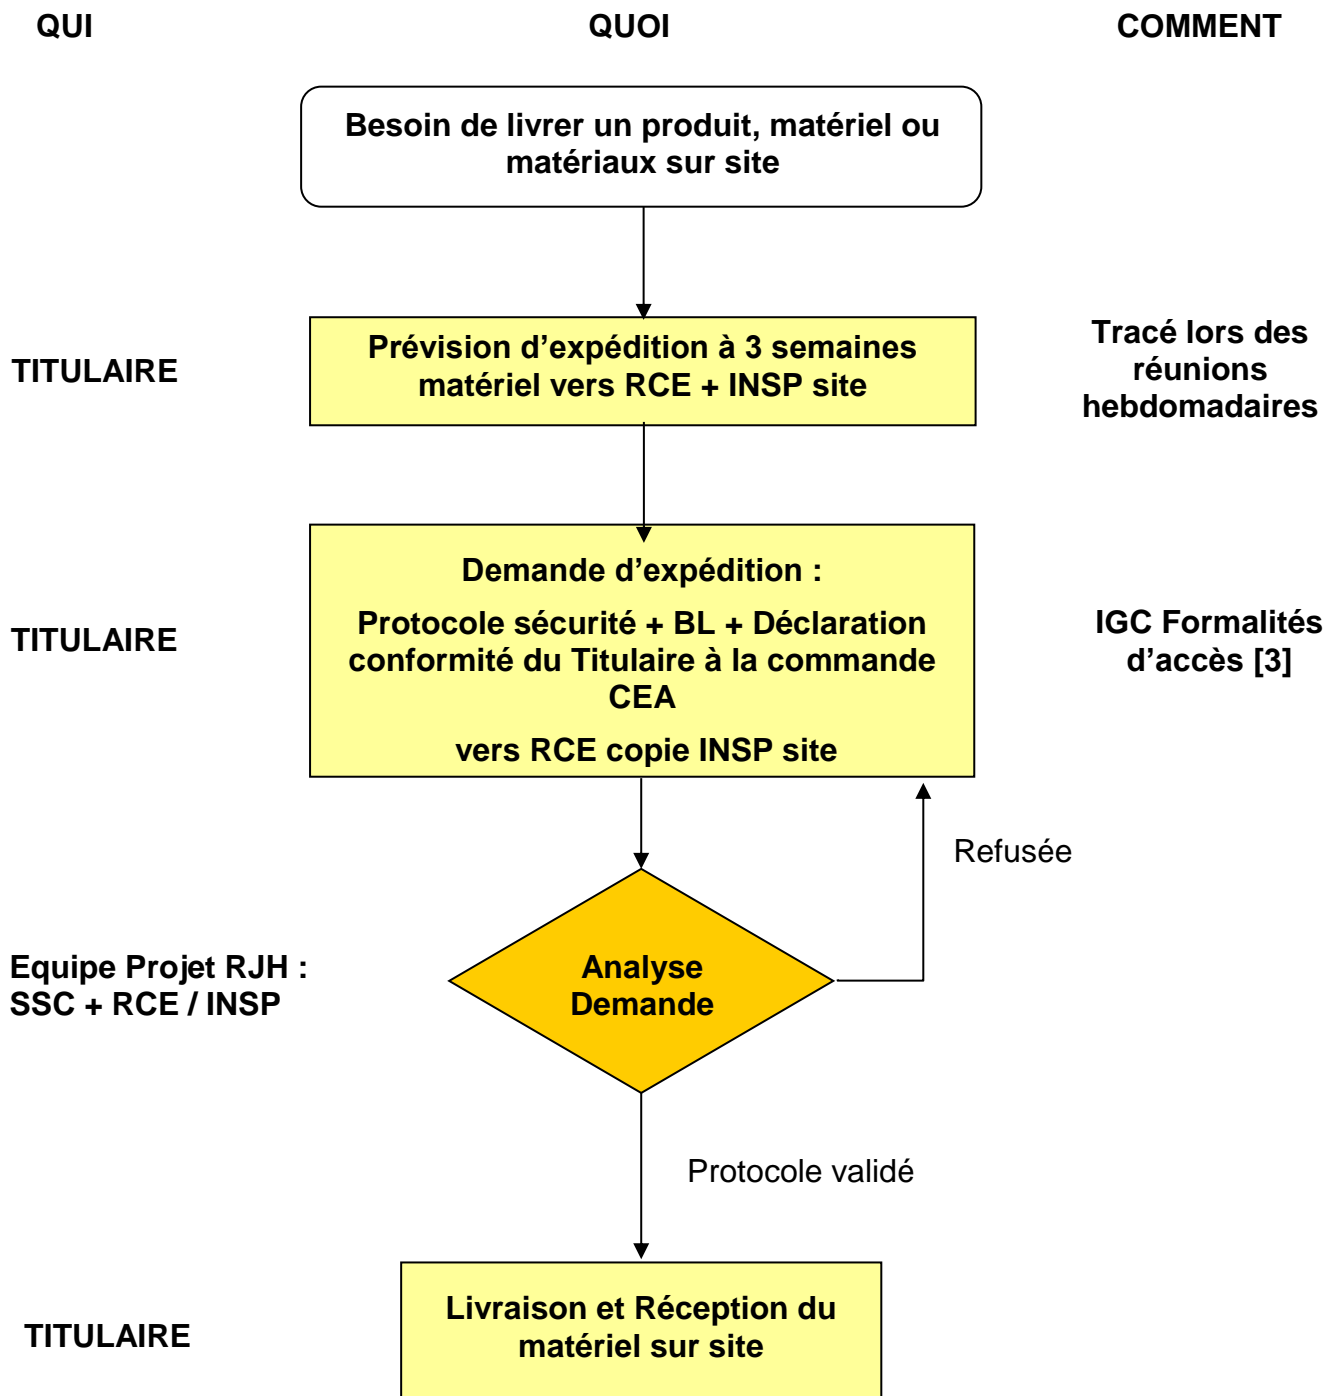



## 6 PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITE POUR LE CAS 3

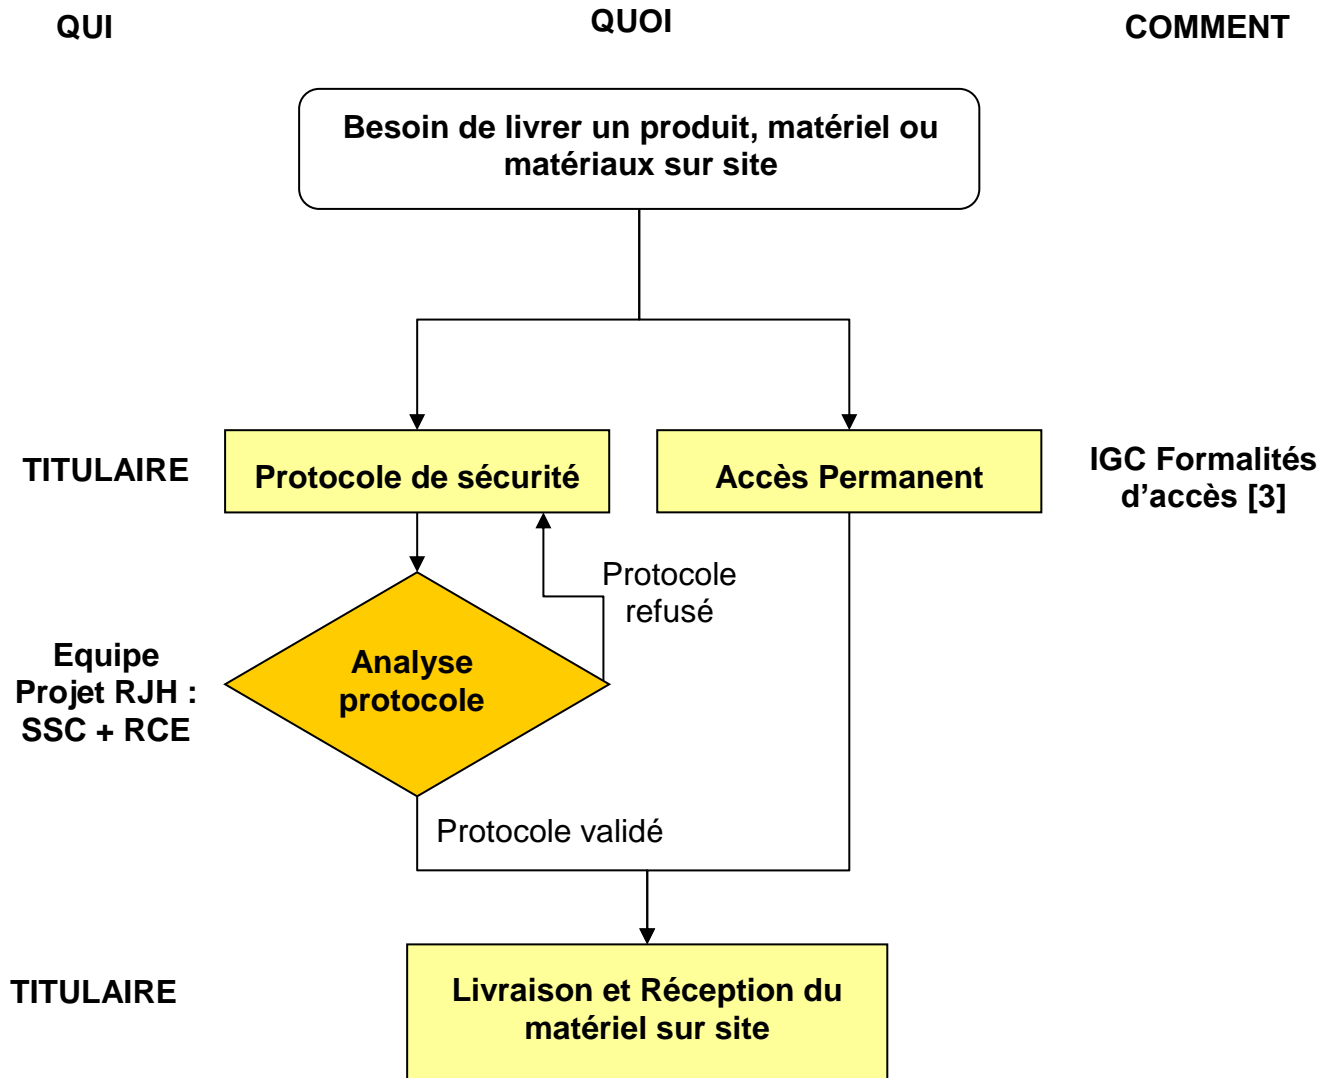

*Nota : Dans le cas d'une commande de fourniture de l'Equipe projet RJH, le processus est le même, sauf que l'Equipe Projet RJH réceptionne le matériel à l'arrivée, avec le transporteur.*
