


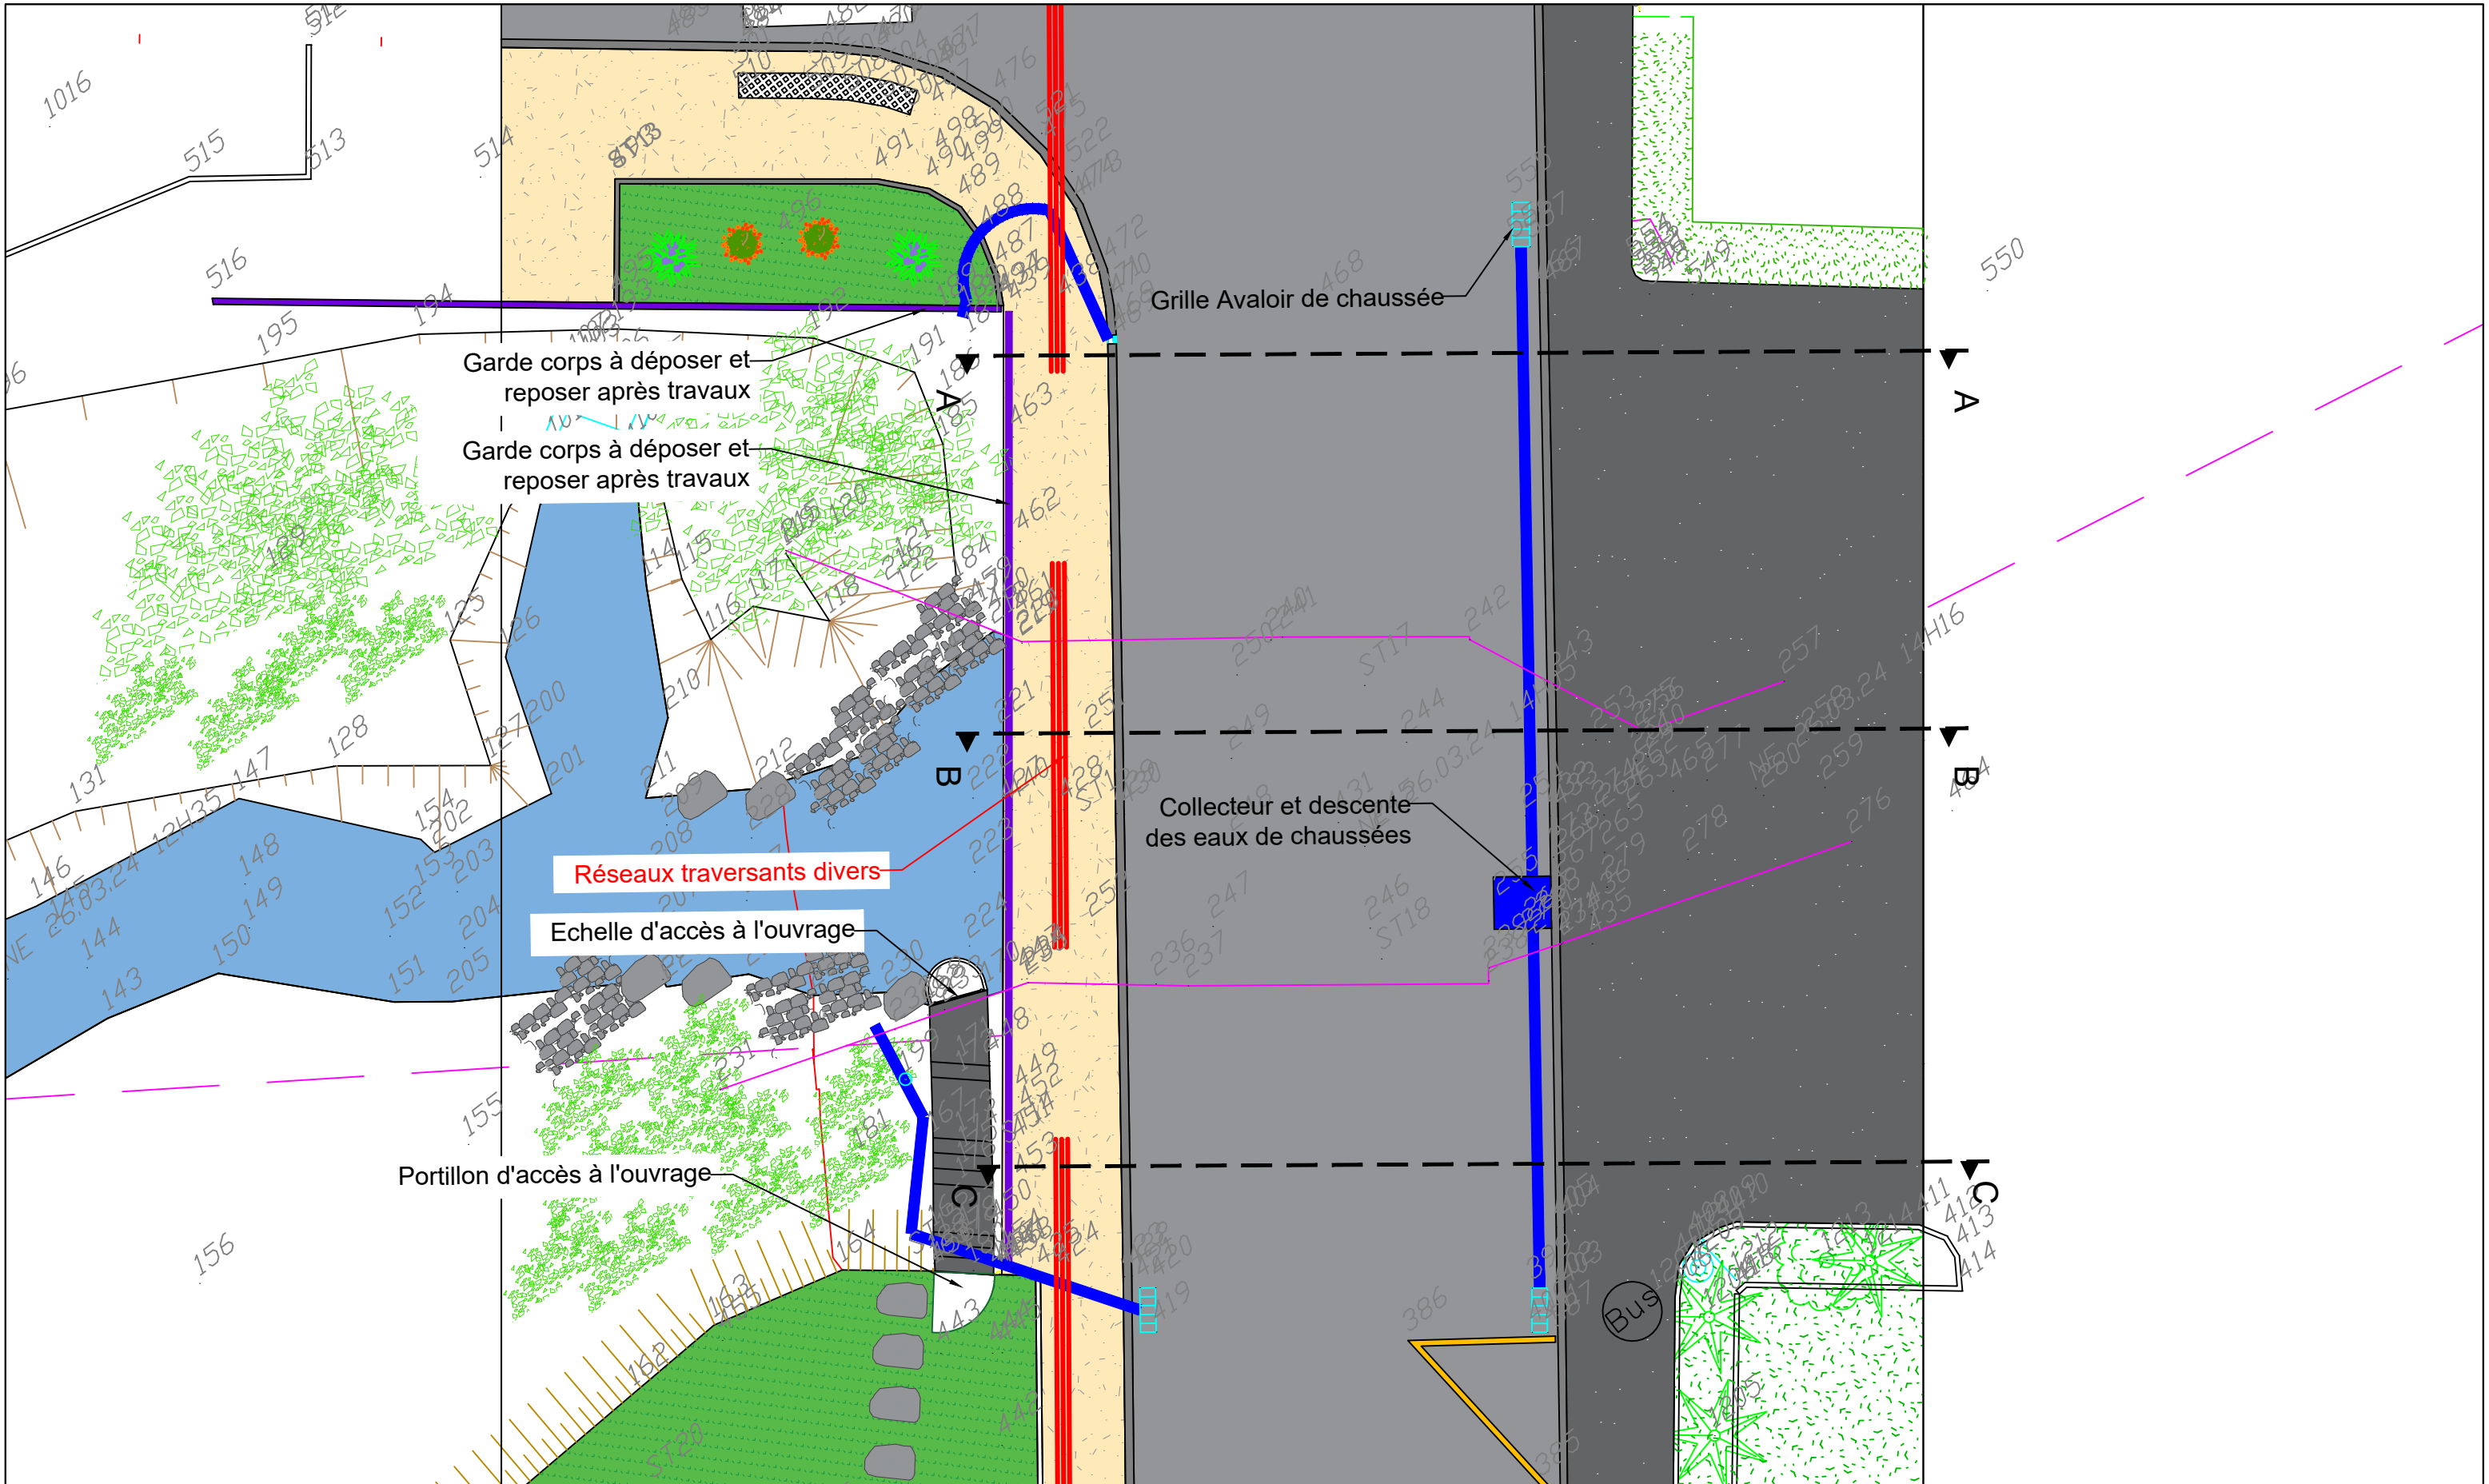

P(r)48/66 - PR30+505 - Pont de la Feigne


Réhabilitation du pont voûte à Saint-Maurice-sur-Moselle -
Ruisseau de la Feigne

PLAN D'ENSEMBLE DES TRAVAUX

C	Fev. 2025	Modifications			
B	Déc. 2024	Modifications			
A	Nov. 2023	Création du document			
ind.	DATE	MODIFICATIONS			
N° Affaire :	4.63.4332	Etabli par : SPS	Vérifié par : OTN	N° plan 0	Indice C
Phase :	PRO	Date : 27/02/2025	Date : 27/02/2025		
Echelle :		Visa :	Visa :		



<div>MAITRE D'OUVRAGE : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES EST / SERVICE OA / POLE OA</div> <div>MAITRE D'OEUVRE / BUREAU D'ETUDES : AGENCE DE STRASBOURG Espace Européen de l'Entreprise 15 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM TEL: 03 88 04 04 00 - www.arteliagroup.com</div>	<div> MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE <small>Liberté Égalité Fraternité</small></div> <div></div>	Travaux de réhabilitation du pont de la feigne	Phasage - Vue en Plan	N° Offre	463 4332	Etabli par : SPS	Vérifié par : OTN	N° Plan	Indice	Format
				Phase	PRO	Date : 27/02/25	Date : 27/02/25	1	C	A3
				Echelle	1/100	Fichier : 4332_RUISSEAU_FEIGNE_Phasage Travaux_2025_02_26_OTN_v2.dwg				

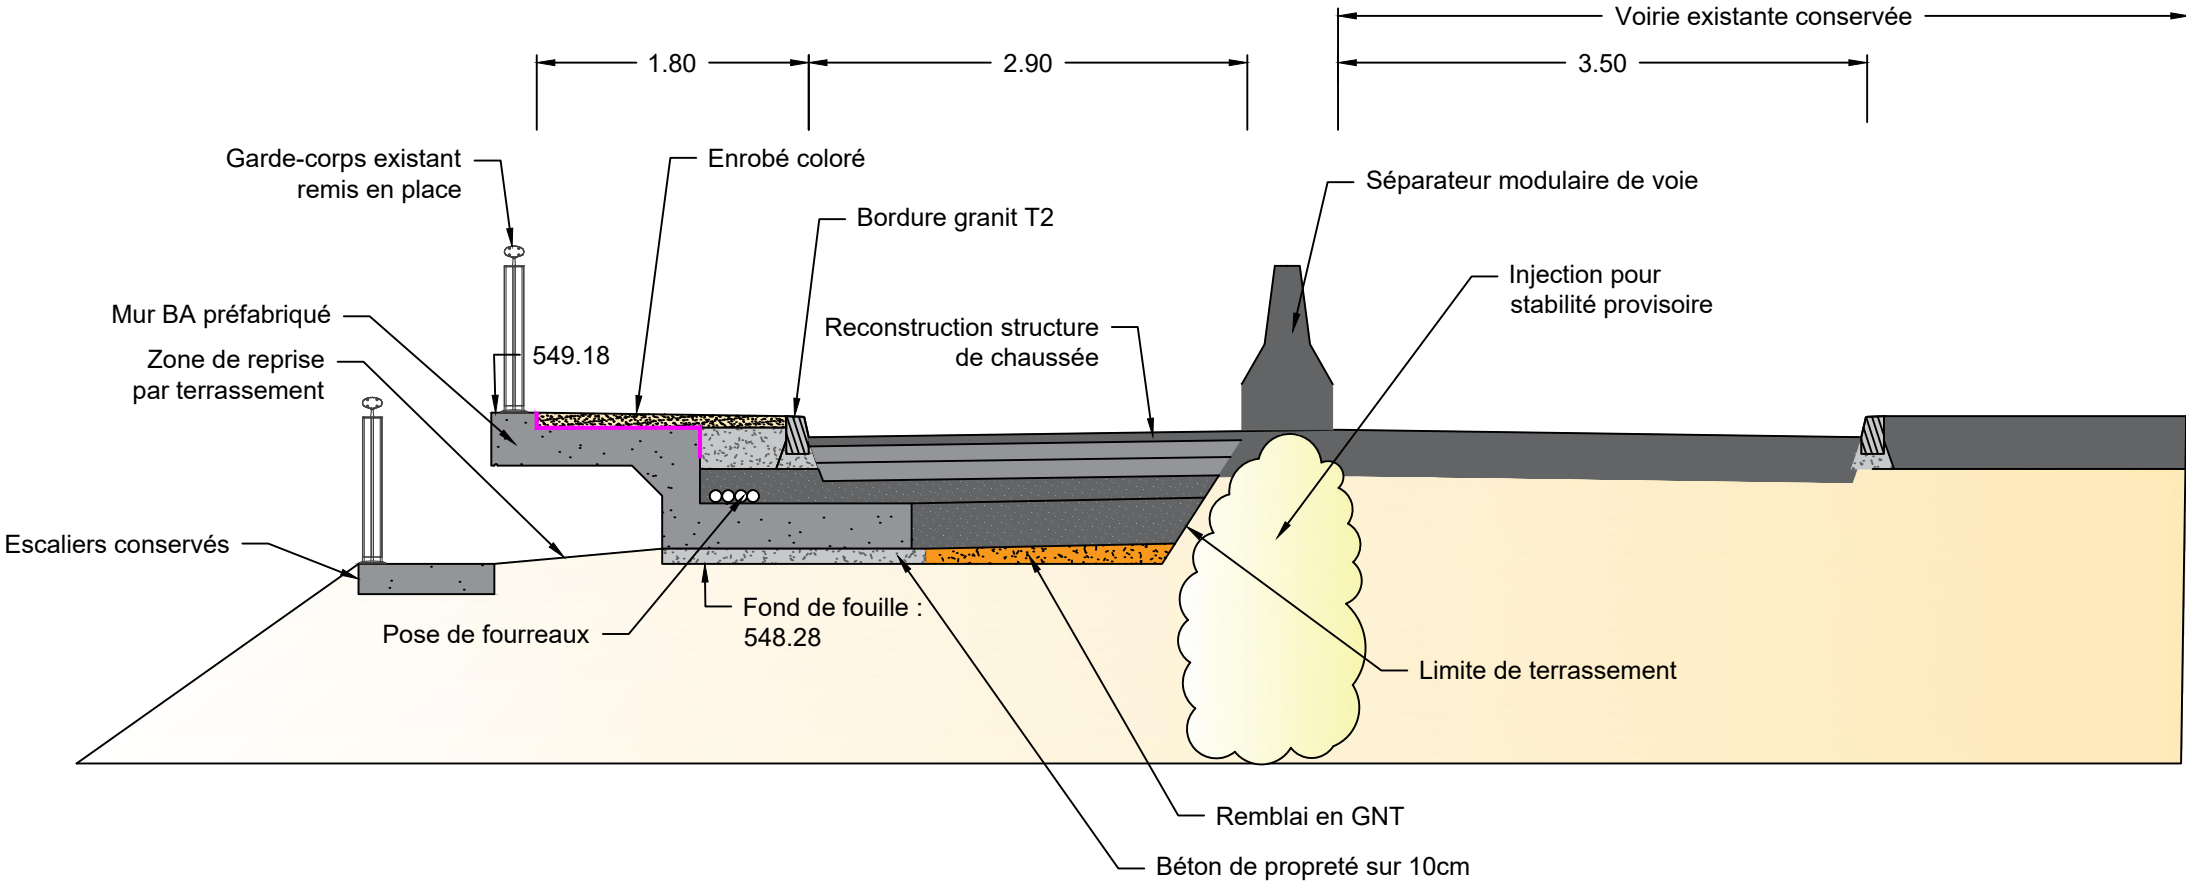


<div>MAITRE D'OUVRAGE :</div> <div>DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES EST / SERVICE OA / POLE OA</div> <div><div><div><div></div></div><div>MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE</div><div>Liberté Égalité Fraternité</div></div></div>	<div>Travaux de réhabilitation du pont de la feigne</div>	N° Offre	463 4332	Etabli par : SPS	Vérifié par : OTN	N° Plan	Indice	Format
		Phase	PRO	Date : 27/02/25	Date : 27/02/25	4	C	A3
		Echelle	1/50	Fichier : 4332_RUISSEAU_FEIGNE_Phasage Travaux_2025_02_26_OTN_v2.dwg				
<div>MAITRE D'OEUVRE / BUREAU D'ETUDES :</div> <div>AGENCE DE STRASBOURG Espace Européen de l'Entreprise 15 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM TEL: 03 88 04 04 00 - www.arteliagroup.com</div> <div></div>	<div>Coupe C-C</div>							

Coupe A - A

Phase 1 :


- Mise en place d'un alternat
- Dépose des équipements
- Décaissement structure de chaussée
- Injection pour stabilité provisoire

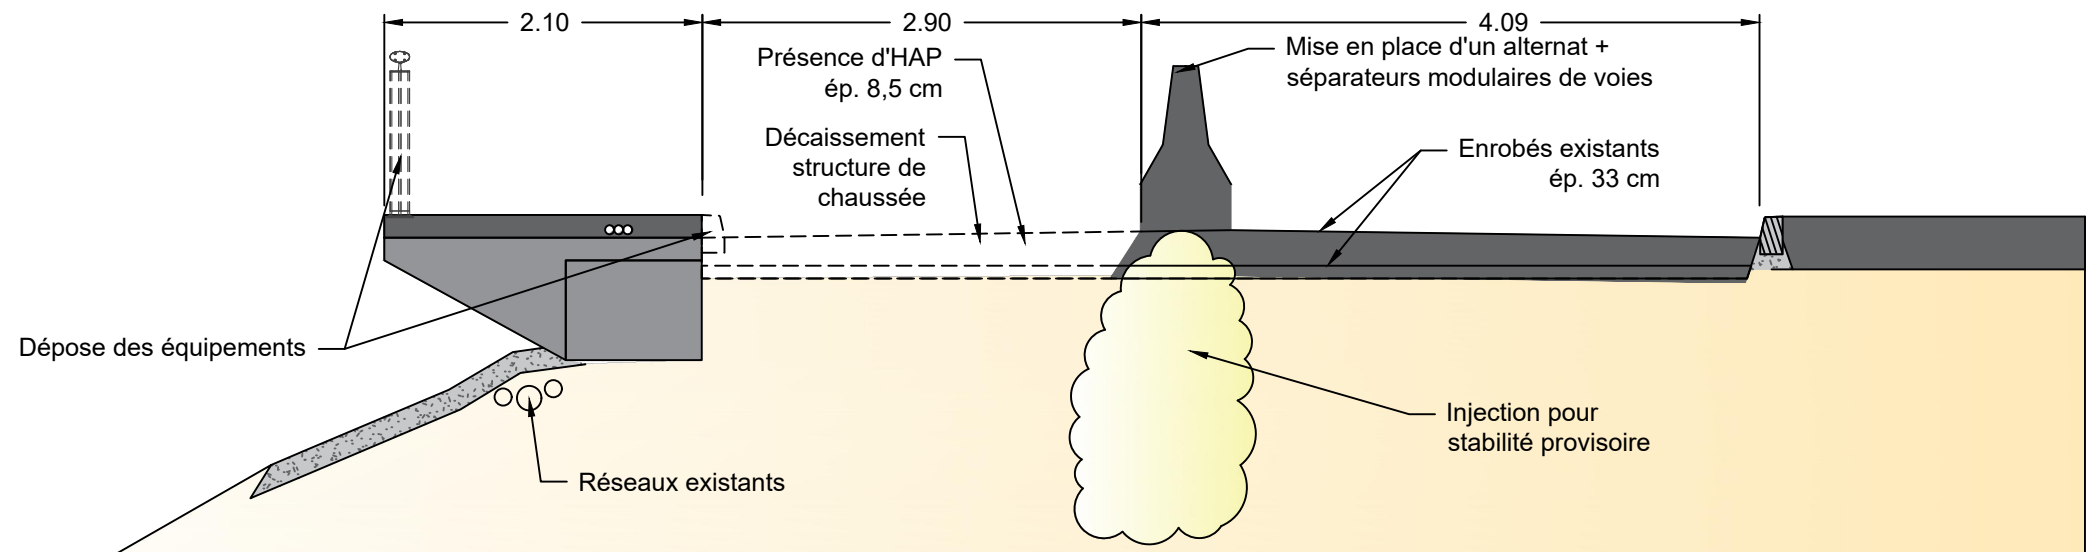

Coupe B - B

Phase 1 :


- Mise en place d'un alternat
- Dépose des équipements
- Décaissement structure de chaussée
- Injection pour stabilité provisoire

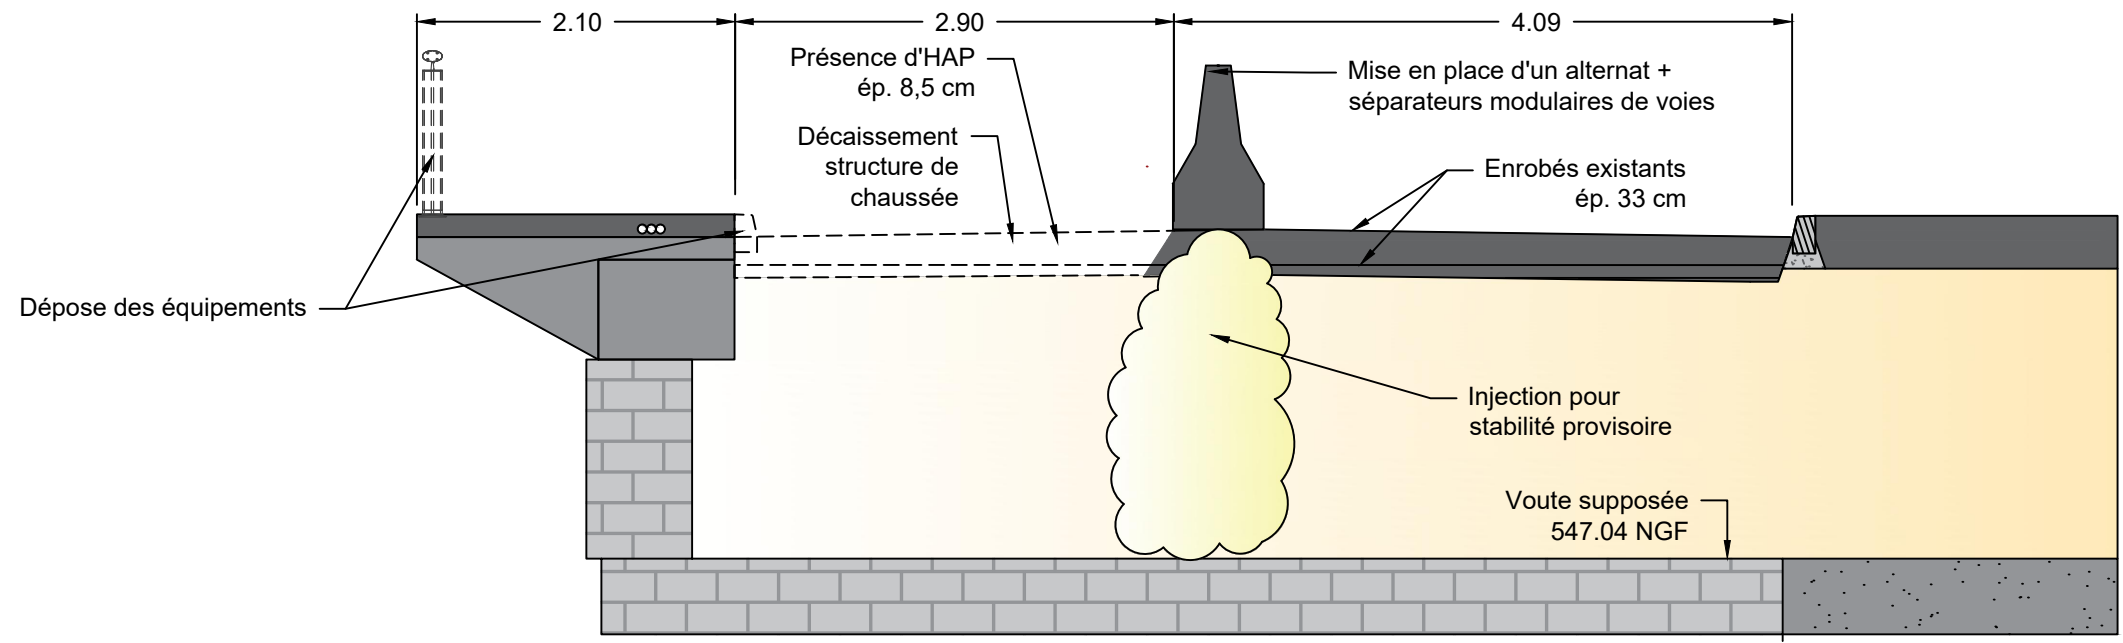

Coupe C - C

Phase 1 :

- Mise en place d'un alternat
- Dépose des équipements
- Décaissement structure de chaussée
- Injection pour stabilité provisoire

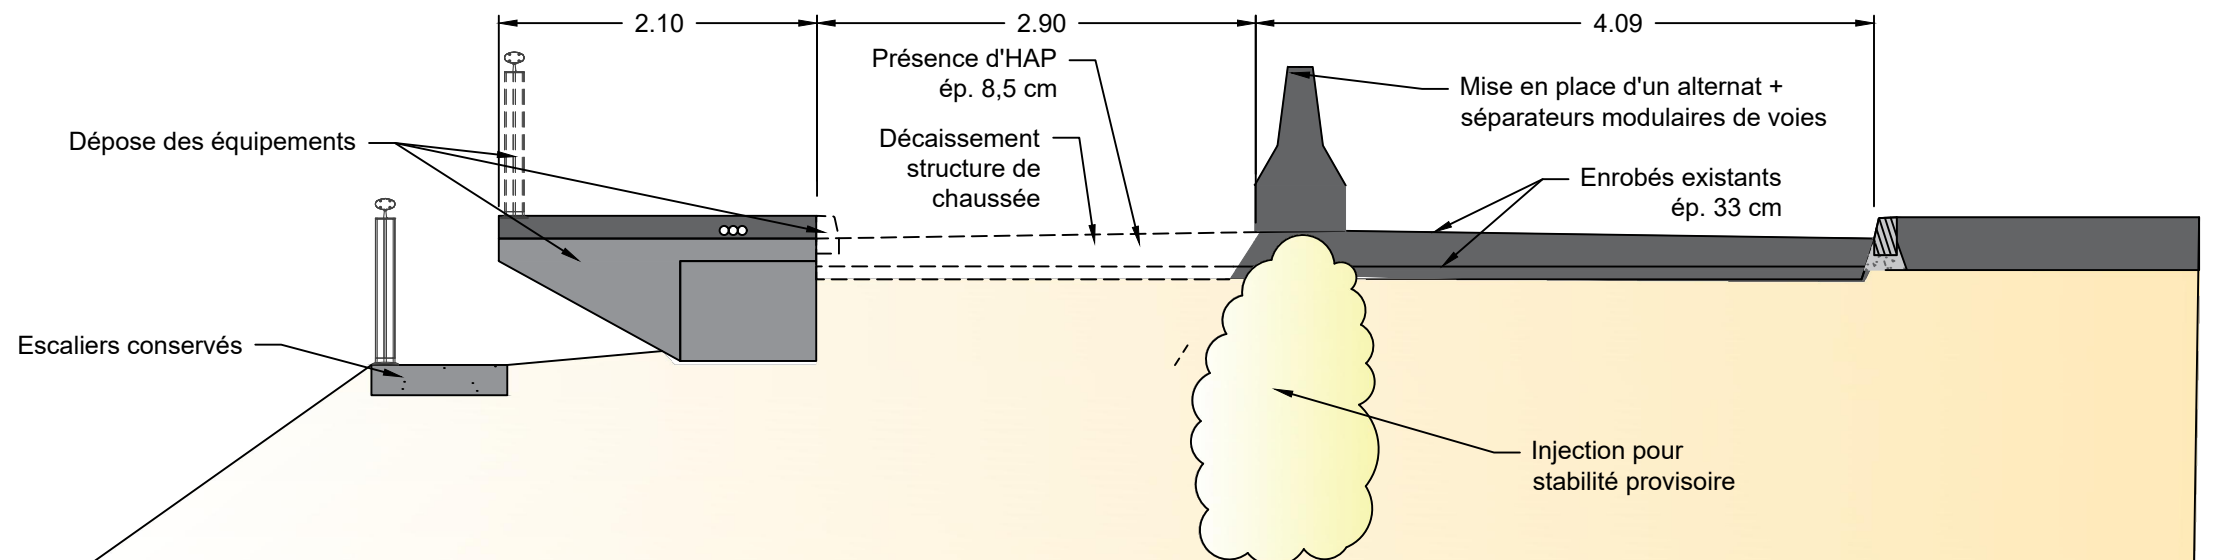

MAITRE D'OUVRAGE :
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES
ROUTES EST / SERVICE OA / POLE OA



Travaux de réhabilitation du pont de la feigne

N° Offre

463 4332

Etabli par : SPS

Vérifié par : OTN

N° Plan

Indice

Format

Phase

PRO

Date : 27/02/25

Date : 27/02/25

6

C

A3

Echelle

1/50

Fichier : 4332_RUISSEAU_FEIGNE_Phasage Travaux_2025_02_26_OTN_v2.dwg

MAITRE D'OEUVRE / BUREAU D'ETUDES :
AGENCE DE STRASBOURG
 Espace Européen de l'Entreprise
 15 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM
 TEL: 03 88 04 04 00 - www.arteliagroup.com




Phasage des Travaux - PHASE 1

Coupe A - A

Phase 2 :


- Déblais de la chaussée
- Démolition du trottoir existant
- Démolition du gros béton sur talus
- Démolition culée en béton armé

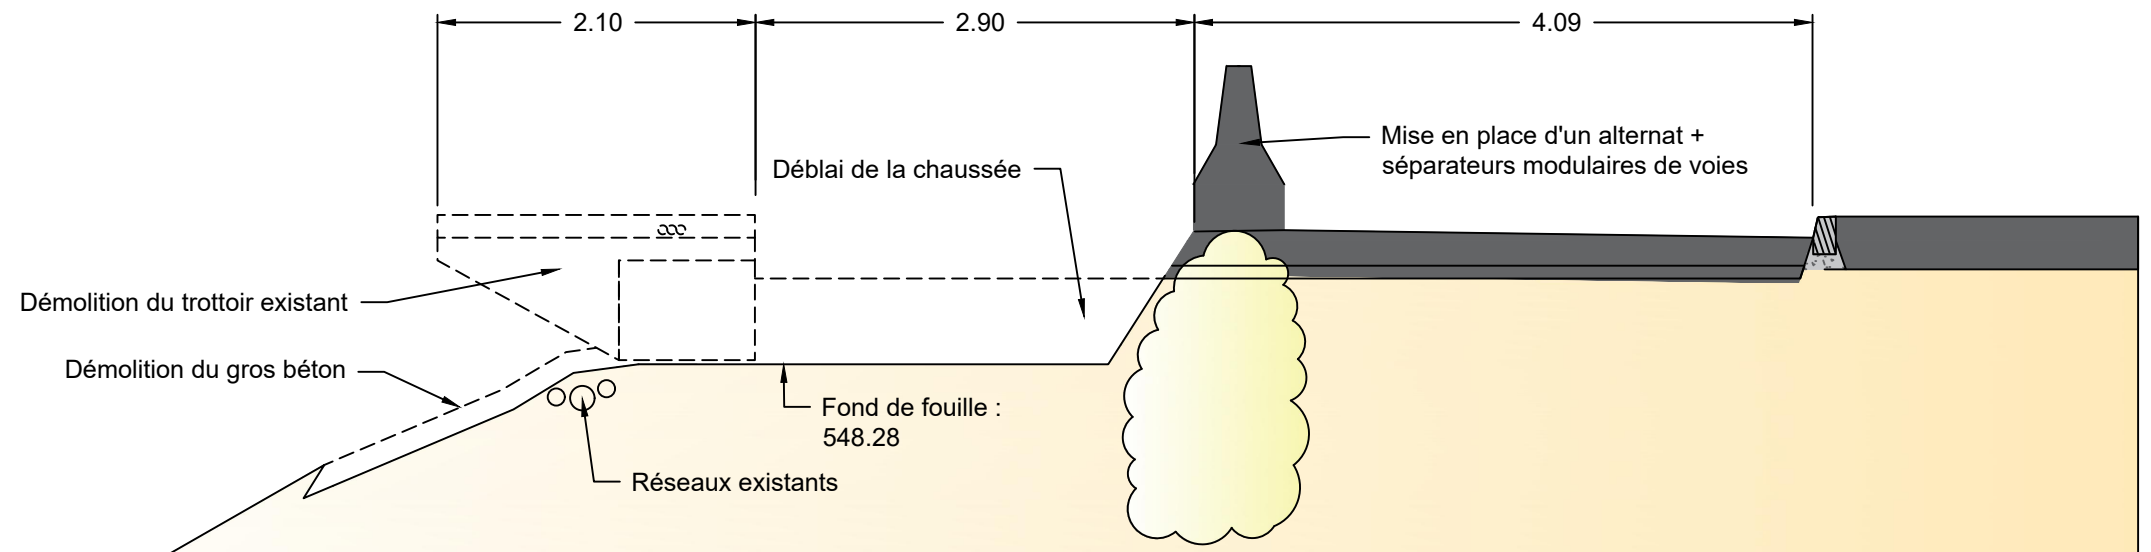

Coupe B - B

Phase 2 :


- Déblais de la chaussée
- Démolition du trottoir existant
- Démolition de la maçonnerie du tympan

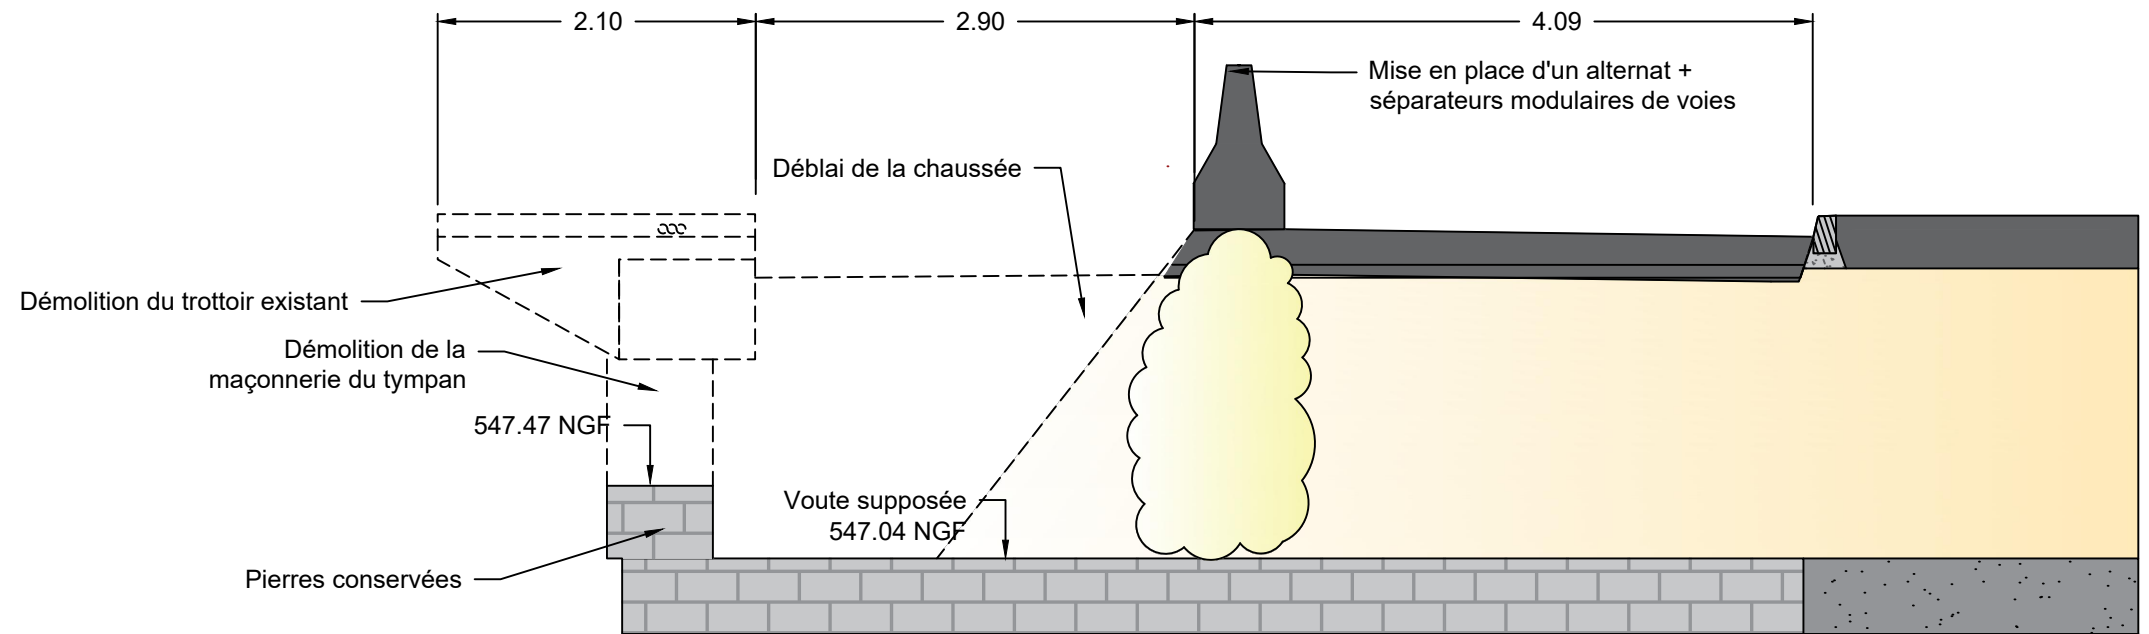

Coupe C - C

Phase 2 :

- Déblais de la chaussée
- Démolition du trottoir existant
- Démolition du gros béton sur talus
- Démolition culée en béton armé

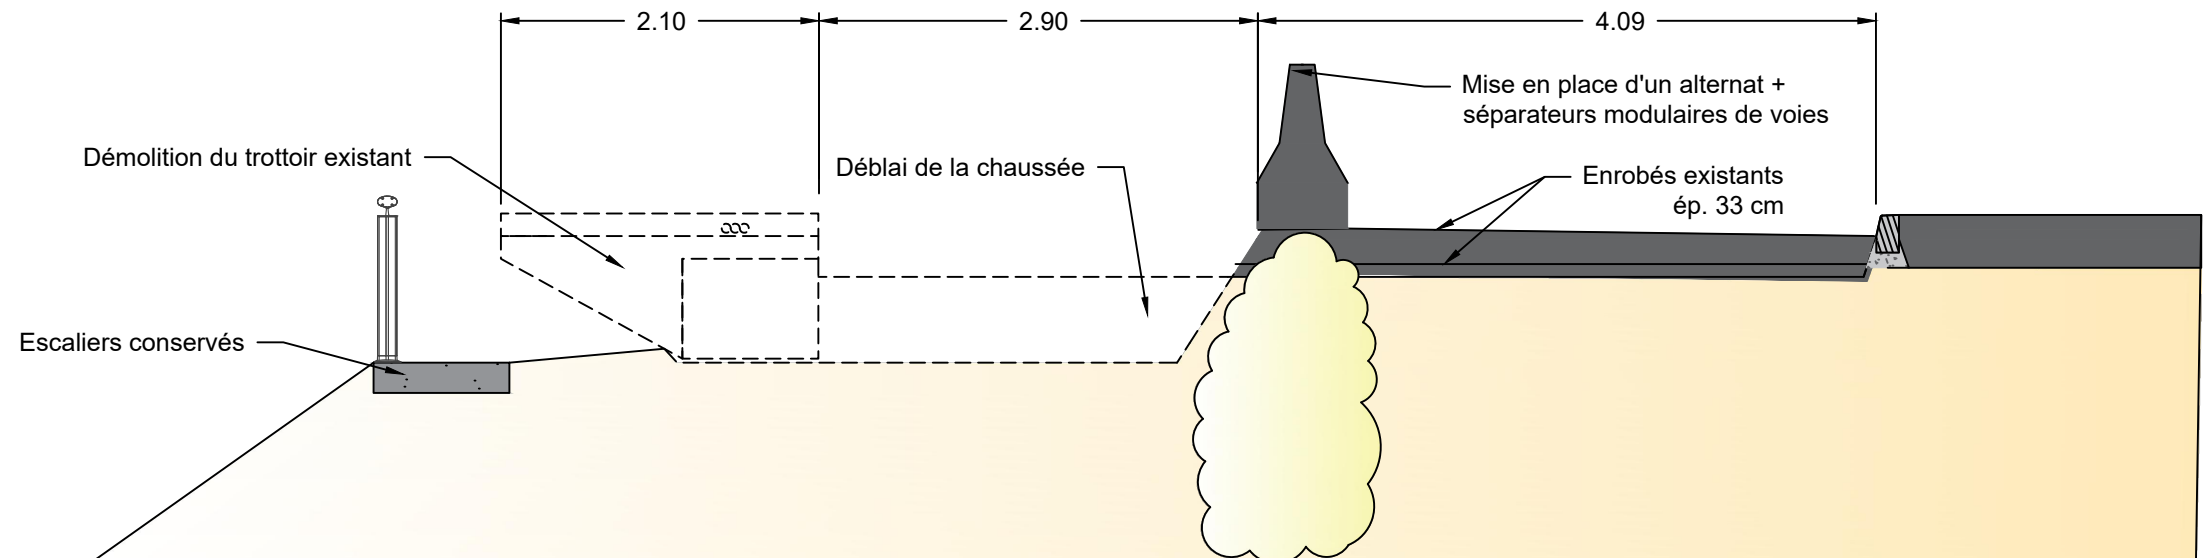

MAITRE D'OUVRAGE :
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES
ROUTES EST / SERVICE OA / POLE OA



Travaux de réhabilitation du pont de la feigne

N° Offre

463 4332

Etabli par : SPS

Vérifié par : OTN

N° Plan

Indice

Format

Phase

PRO

Date : 27/02/25

Date : 27/02/25

7

C

A3

Echelle

1/50

Fichier : 4332_RUISSEAU FEIGNE Phasage Travaux_2025_02_26_OTN v2.dwg

MAITRE D'OEUVRE / BUREAU D'ETUDES :
AGENCE DE STRASBOURG
 Espace Européen de l'Entreprise
 15 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM
 TEL: 03 88 04 04 00 - www.arteliagroup.com




Phasage des Travaux - PHASE 2

Coupe A - A

Phase 3 :


- Mise en place du béton de propreté
- Pose du mur en béton armé
- Clavetage des murs
- Pose des bordures
- Remblaiement
- Pose des fourreaux
- Garde-corps provisoire

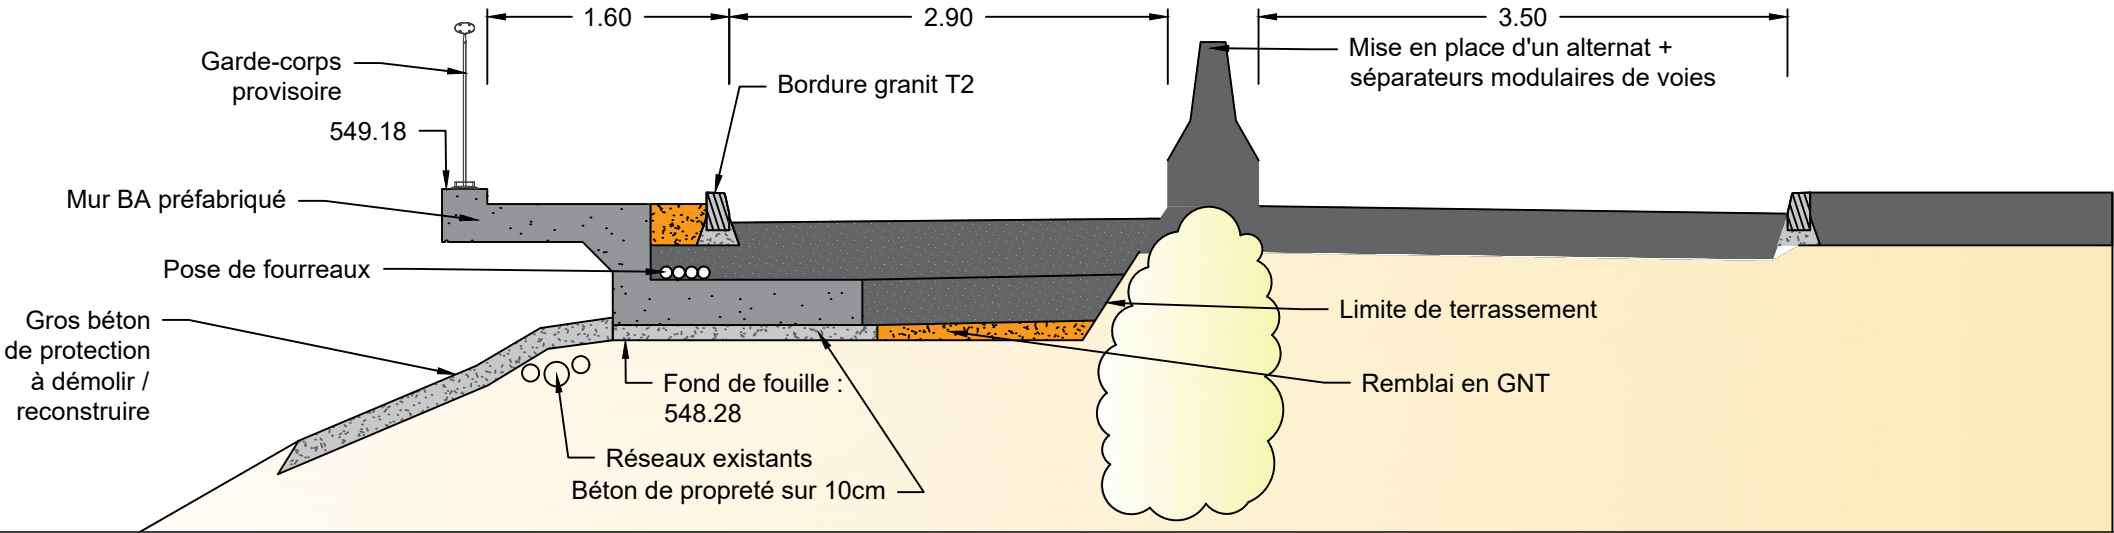

Coupe B - B

Phase 3 :


- Mise en place du béton de propreté
- Pose du mur en béton armé
- Clavetage des murs
- Pose des bordures
- Remblaiement
- Pose des fourreaux
- Garde-corps provisoire

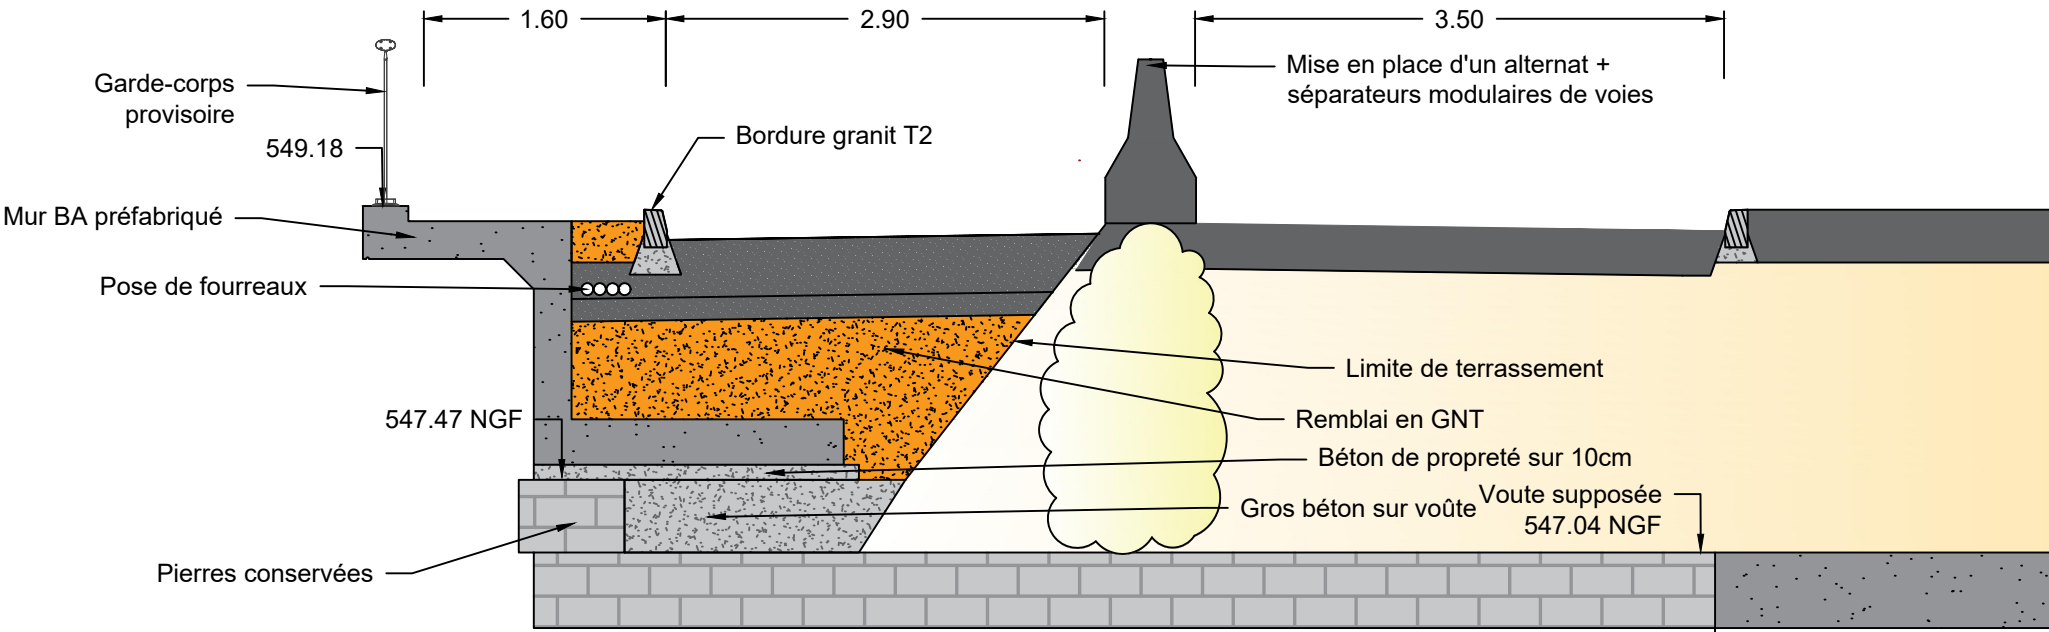



Coupe C - C

Phase 3 :

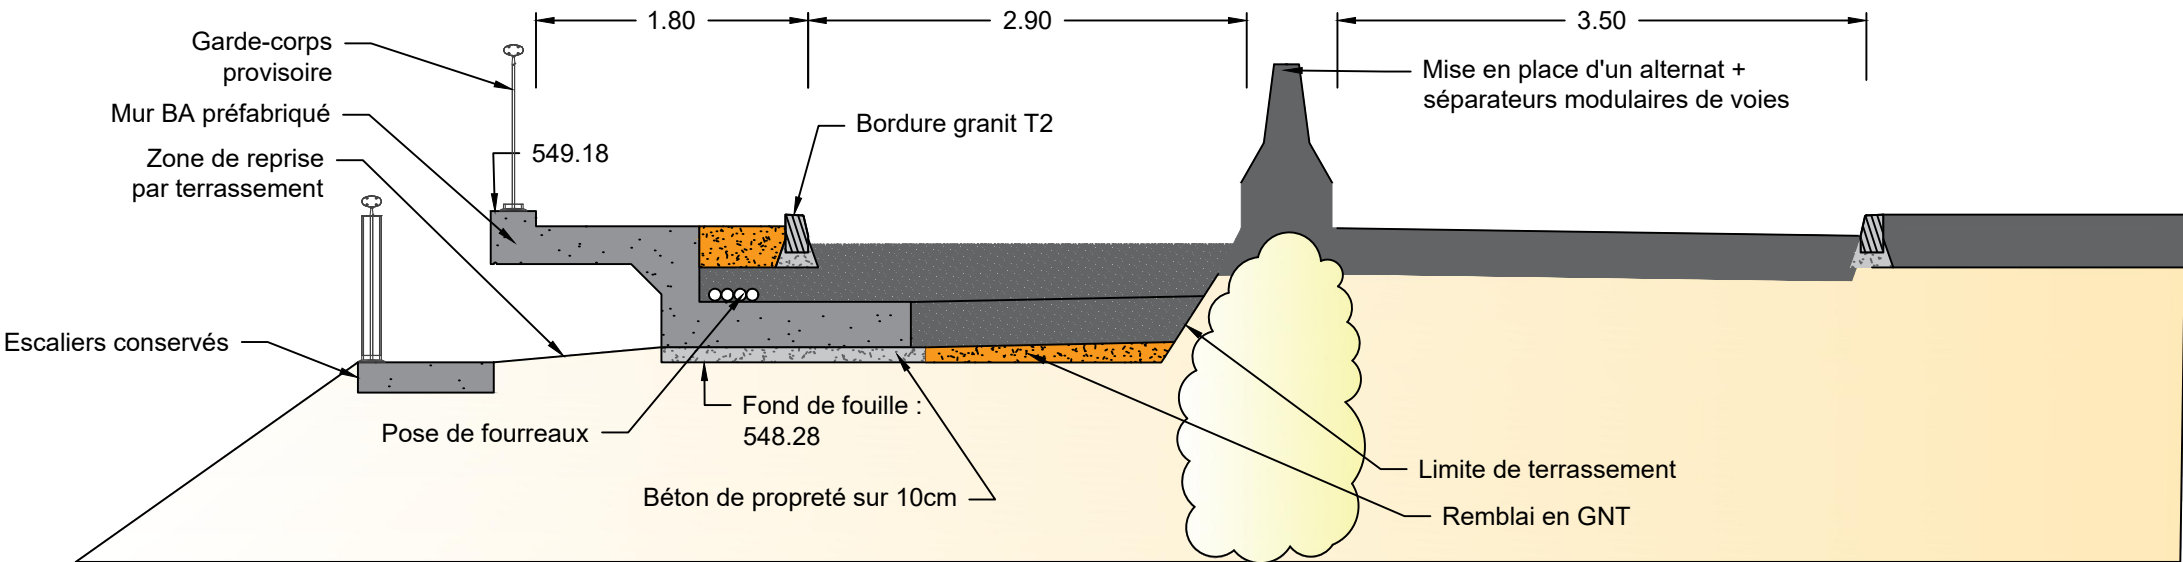- Mise en place du béton de propreté
- Pose du mur en béton armé
- Clavetage des murs
- Pose des bordures
- Remblaiement
- Pose des fourreaux
- Garde-corps provisoire




<div>MAITRE D'OUVRAGE :</div> <div>DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES EST / SERVICE OA / POLE OA</div>	<div><div>MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE</div><div>Liberté Égalité Fraternité</div></div>	Travaux de réhabilitation du pont de la feigne	N° Offre	463 4332	Etabli par : SPS	Vérifié par : OTN	N° Plan	Indice	Format
			Phase	PRO	Date : 27/02/25	Date : 27/02/25	8	C	A3
			Echelle	1/50	Fichier : 4332_RUISSEAU_FEIGNE_Phase Travaux_2025_02_26_OTN_v2.dwg				
<div>MAITRE D'OEUVRE / BUREAU D'ETUDES :</div> <div>AGENCE DE STRASBOURG Espace Européen de l'Entreprise 15 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM TEL: 03 88 04 04 00 - www.arteliagroup.com</div>		<div></div>		Phasage des Travaux - PHASE 3					

Coupe A - A

Phase 4 :


- Structure provisoire avec bi-couche
- Enlèvement de l'alternat
- Réouverture à la circulation

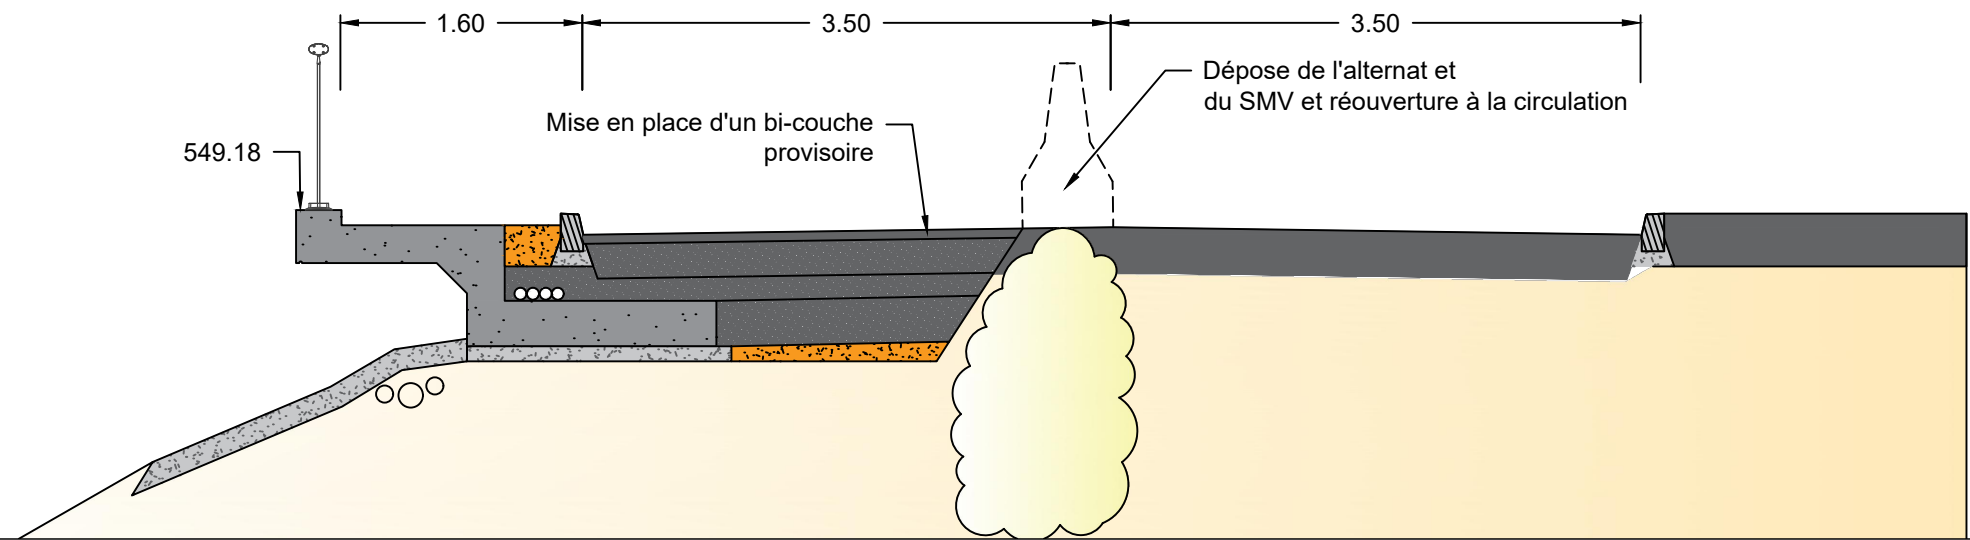

Coupe B - B

Phase 4 :


- Structure provisoire avec bi-couche
- Enlèvement de l'alternat
- Réouverture à la circulation

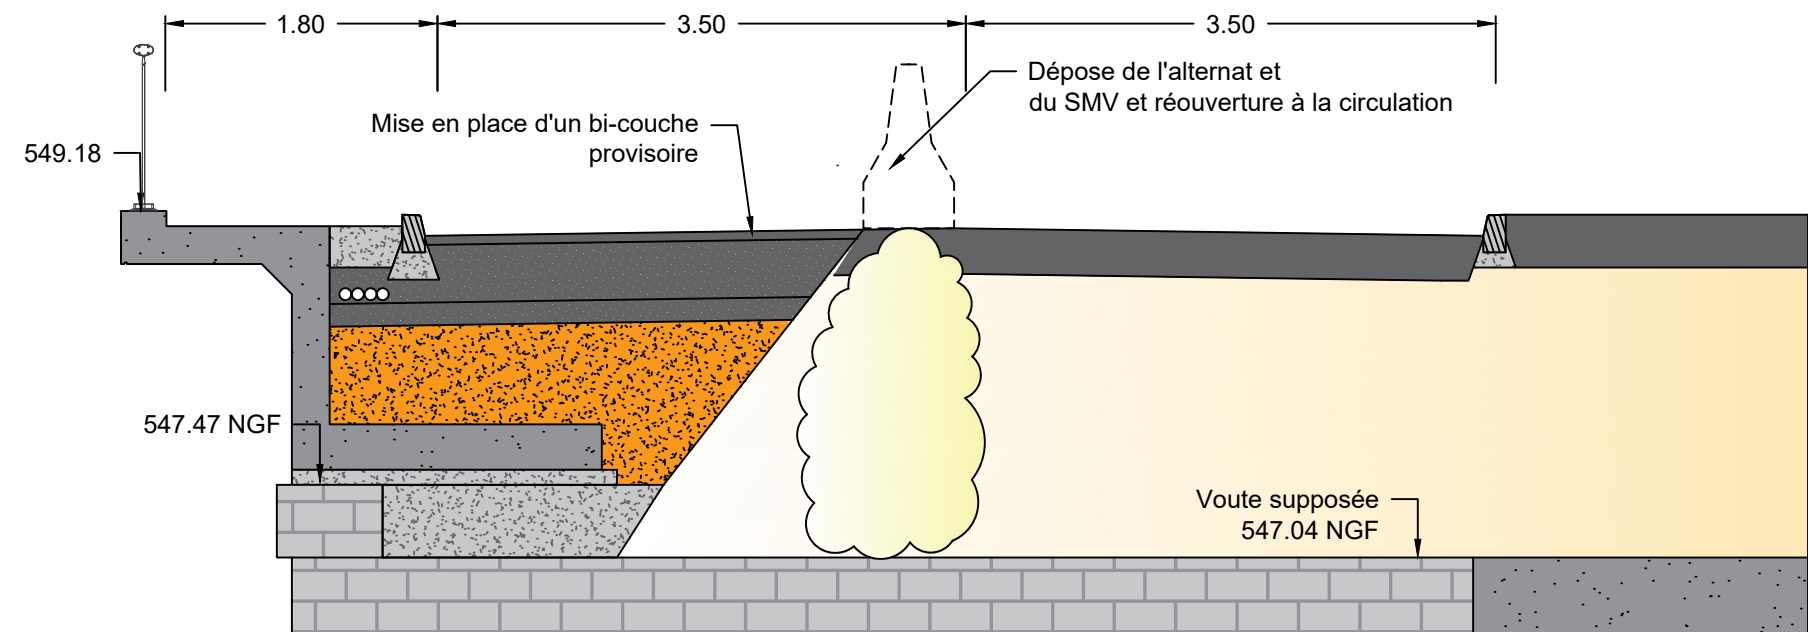

Coupe C - C

Phase 4 :

- Structure provisoire avec bi-couche
- Enlèvement de l'alternat
- Réouverture à la circulation

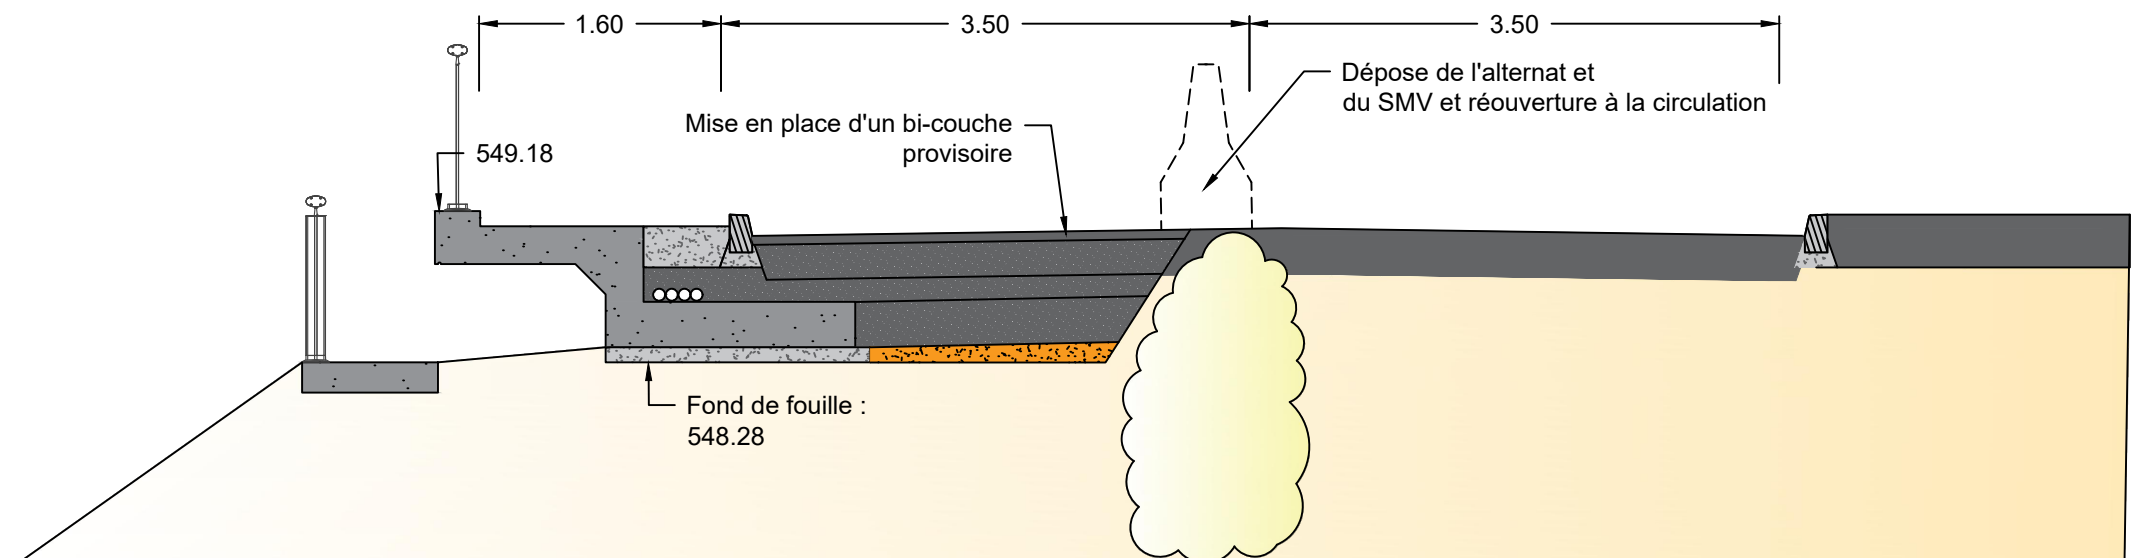

MAITRE D'OUVRAGE :
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES
ROUTES EST / SERVICE OA / POLE OA



Travaux de réhabilitation du pont de la feigne

N° Offre

463 4332

Etabli par : SPS

Vérifié par : OTN

N° Plan

Indice

Format

Phase

PRO

Date : 27/02/25

Date : 27/02/25

9

C

A3

Echelle

1/50

Fichier : 4332_RUISSEAU FEIGNE Phasage Travaux_2025_02_26_OTN v2.dwg

MAITRE D'OEUVRE / BUREAU D'ETUDES :
AGENCE DE STRASBOURG
 Espace Européen de l'Entreprise
 15 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM
 TEL: 03 88 04 04 00 - www.arteliagroup.com



Phasage des Travaux - PHASE 4

Coupe A - A

Phase 5 :

- Mise en place d'un alternat et SMV
- Démolition du bi-couche et de la structure provisoire
- Réalisation de l'étanchéité du trottoir
- Mise en place de la structure définitive
- Pose de l'enrobé coloré sur trottoir
- Pose de l'enrobé définitif sur chaussée
- Repose du garde-corps définitif

Coupe B - B




Phase 5 :

- Mise en place d'un alternat et SMV
- Démolition du bi-couche et de la structure provisoire
- Réalisation de l'étanchéité du trottoir
- Mise en place de la structure définitive
- Pose de l'enrobé coloré sur trottoir
- Pose de l'enrobé définitif sur chaussée
- Repose du garde-corps définitif

Coupe C - C

Phase 5 :

- Mise en place d'un alternat et SMV
- Démolition du bi-couche et de la structure provisoire
- Réalisation de l'étanchéité du trottoir
- Mise en place de la structure définitive
- Pose de l'enrobé coloré sur trottoir
- Pose de l'enrobé définitif sur chaussée
- Repose du garde-corps définitif

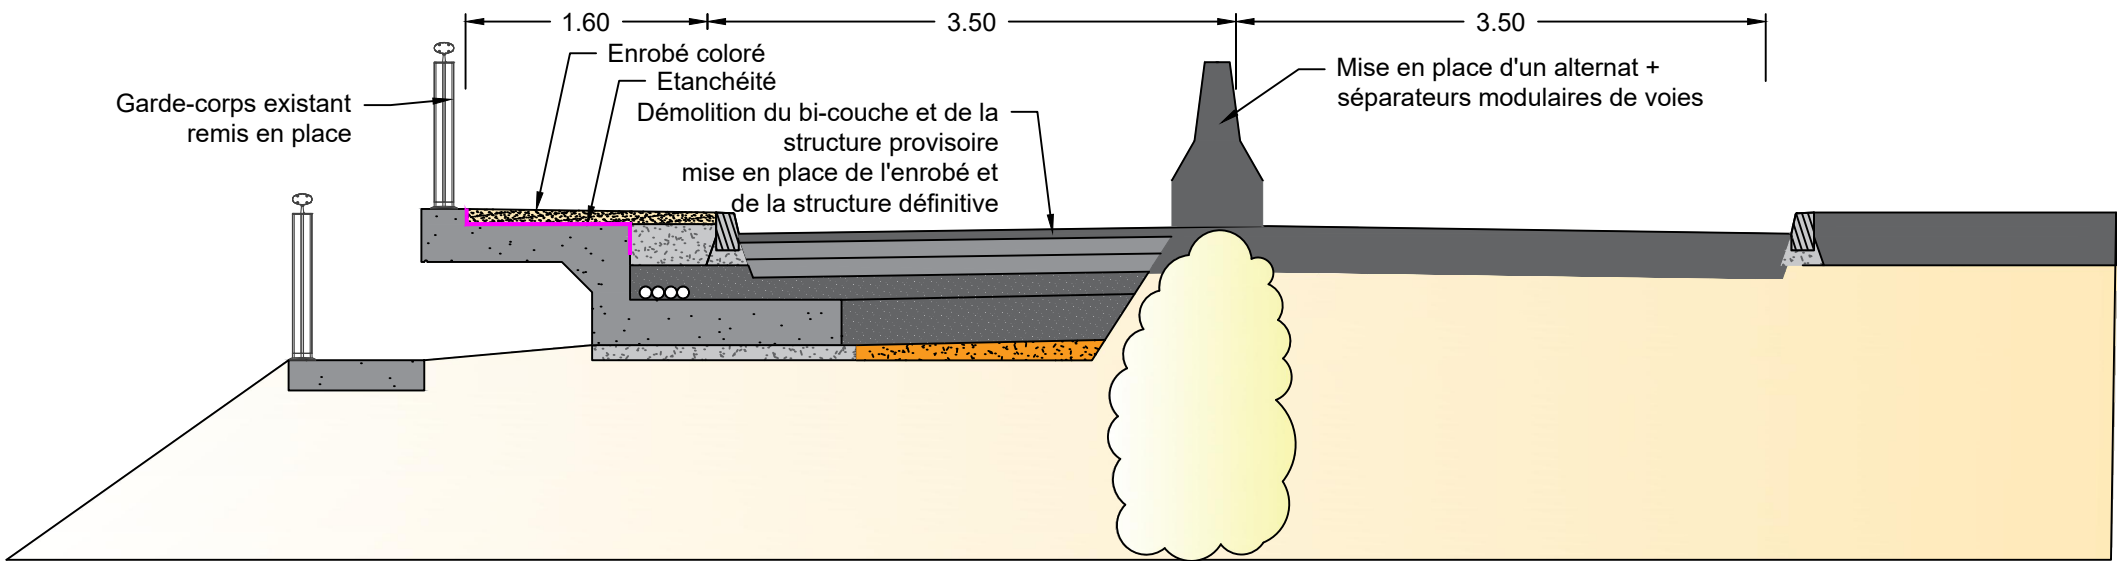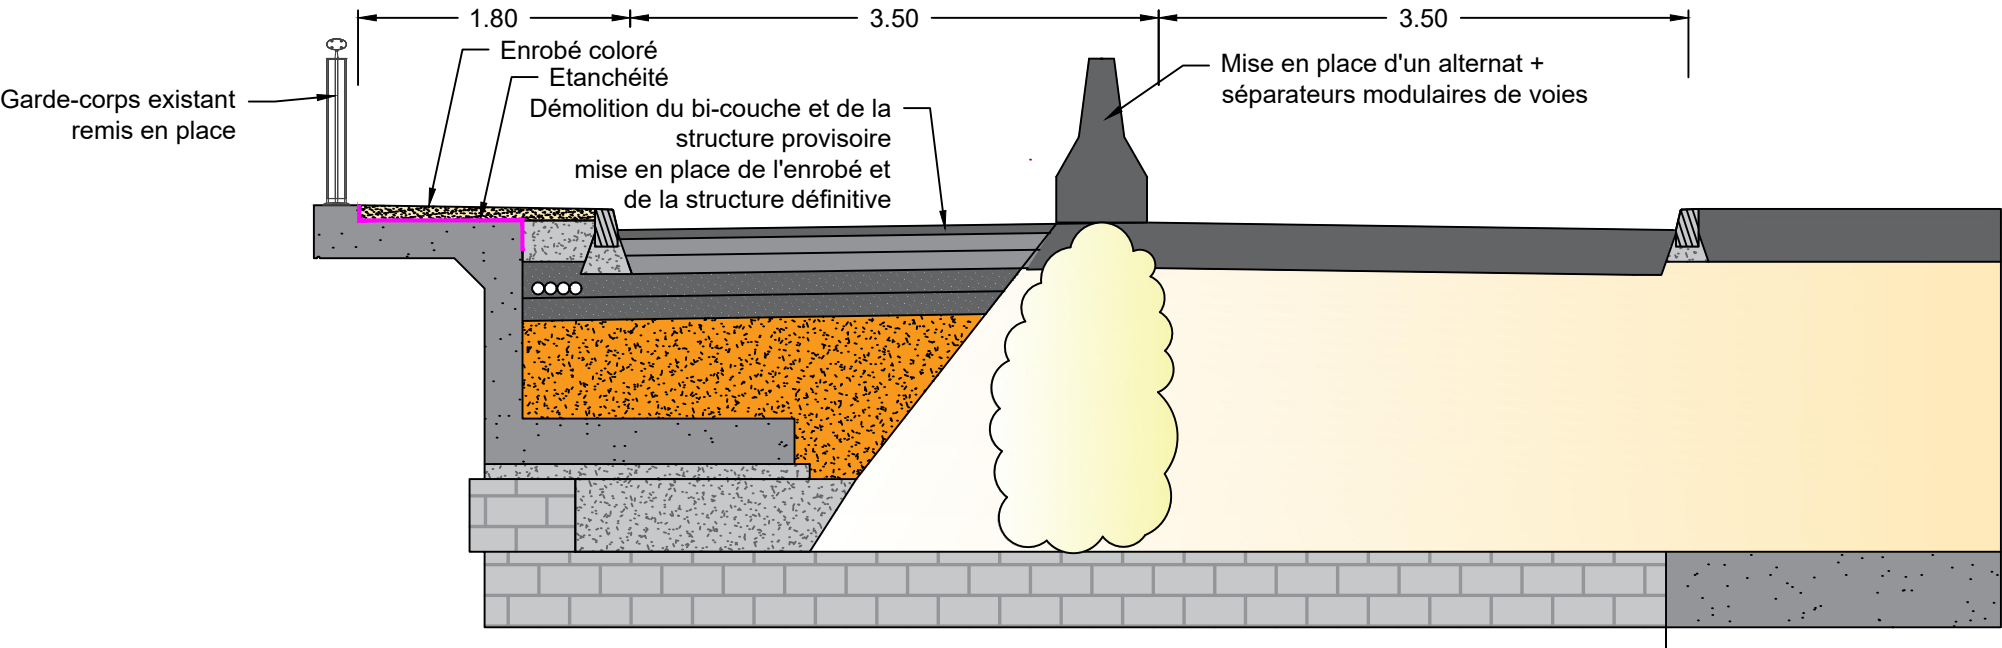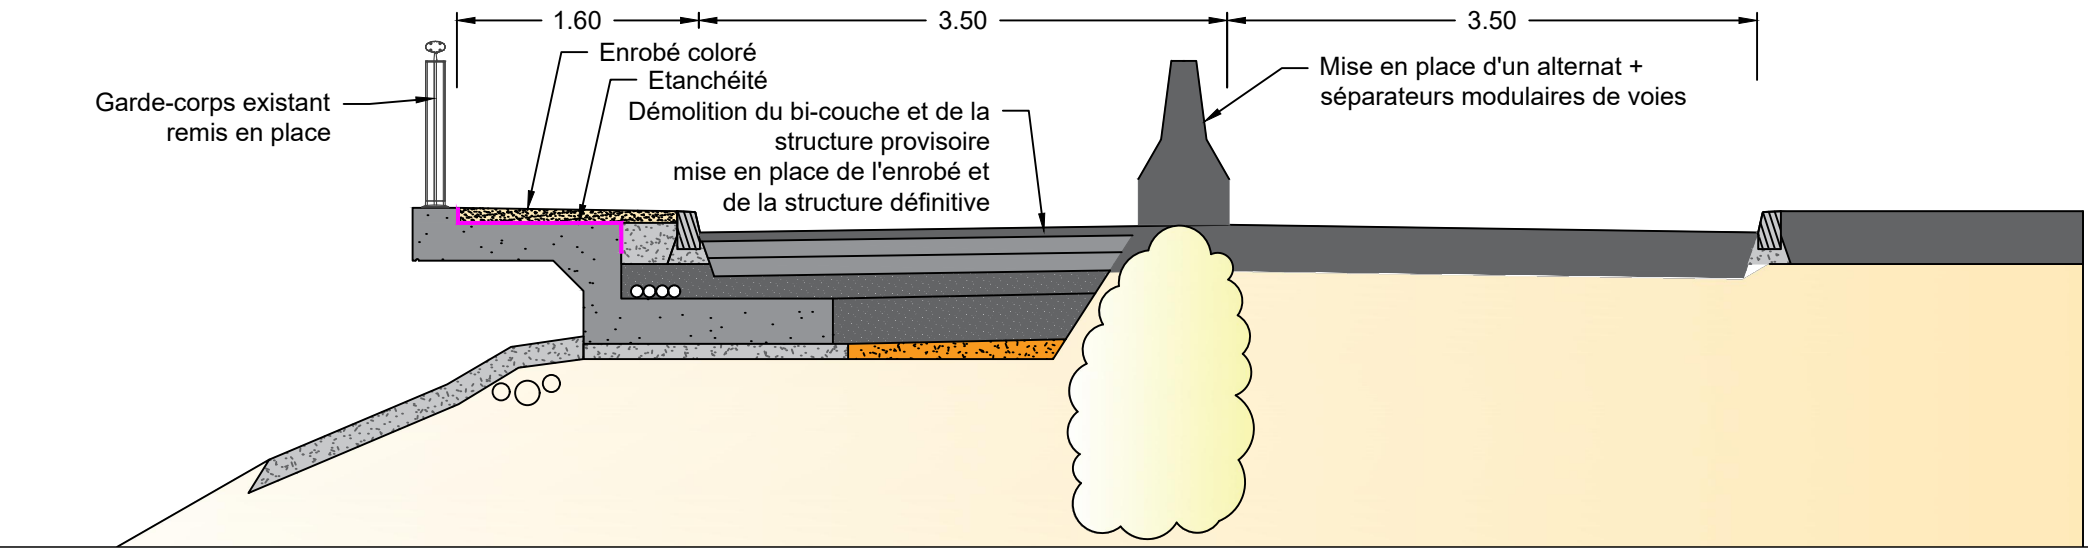

MAITRE D'OUVRAGE :
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES
ROUTES EST / SERVICE OA / POLE OA


**MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

MAITRE D'OEUVRE / BUREAU D'ETUDES :
AGENCE DE STRASBOURG
Espace Européen de l'Entreprise
15 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM
TEL: 03 88 04 04 00 - www.arteliagroup.com



Travaux de réhabilitation du pont de la feigne	N° Offre	463 4332	Etabli par : SPS	Vérifié par : OTN	N° Plan	Indice	Format
	Phase	PRO	Date : 27/02/25	Date : 27/02/25	10	C	A3
Phasage des Travaux - PHASE 5	Echelle	1/50		Fichier : 4332_RUISSEAU_FEIGNE_Phasage Travaux_2025_02_26_OTN_v2.dwg			

