



# **GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE HOPITAL EDOUARD HERRIOT**

## **AMELIORATION DES FLUX RENOVATION DES VOIRIES, GALERIES ET ABORDS**


### **ABORDS PAVILLONS A & G**

## **SYNTHESE**



L'hôpital Edouard HERRIOT constitue l'un des 4 principaux groupements hospitaliers des HCL et a la particularité d'être inscrit aux Monuments Historiques. A ce titre, un protocole a été conclu en juin 2022 entre la Préfecture de Région et la Direction Générale afin de définir les conditions d'intervention sur le site.

Sur la base de ce protocole, les HCL ont mandaté l'équipe de maîtrise d'œuvre menée par le cabinet SILT afin de travailler sur l'élaboration du **Cahier Guide du Schéma Directeur des Abords**.

Ce travail a été mis en pratique à 2 reprises avec cette même équipe pour les voiries aux abords du pavillon N d'une part, puis entre les pavillons C et D d'autre part (cf. plan ci-dessous).

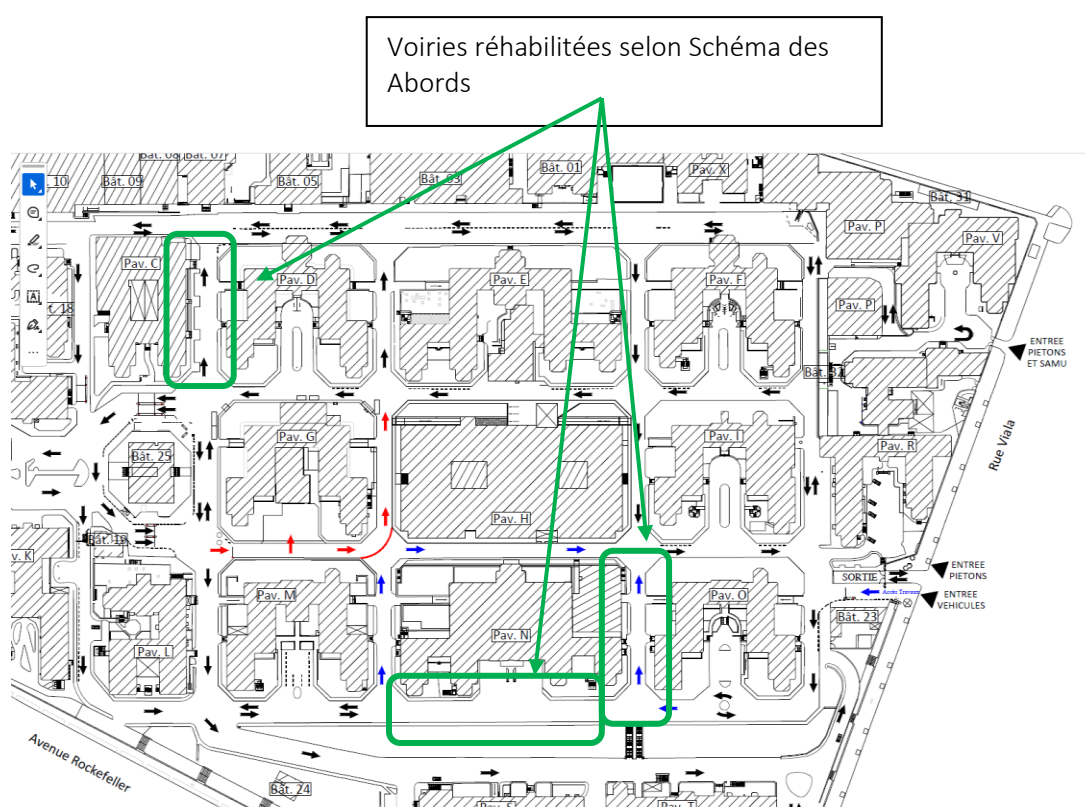

La restructuration du pavillon A et du RDC du pavillon G constituent les 1ères étapes du Schéma Directeur Immobilier du site HEH, présenté dans les plans ci-dessous :

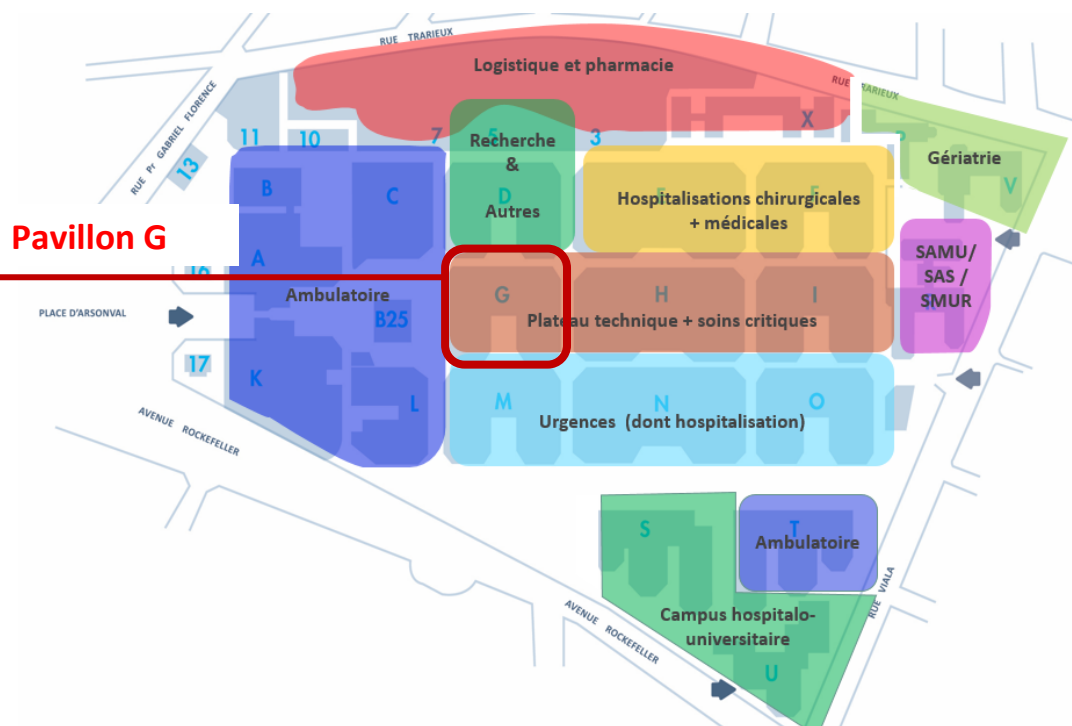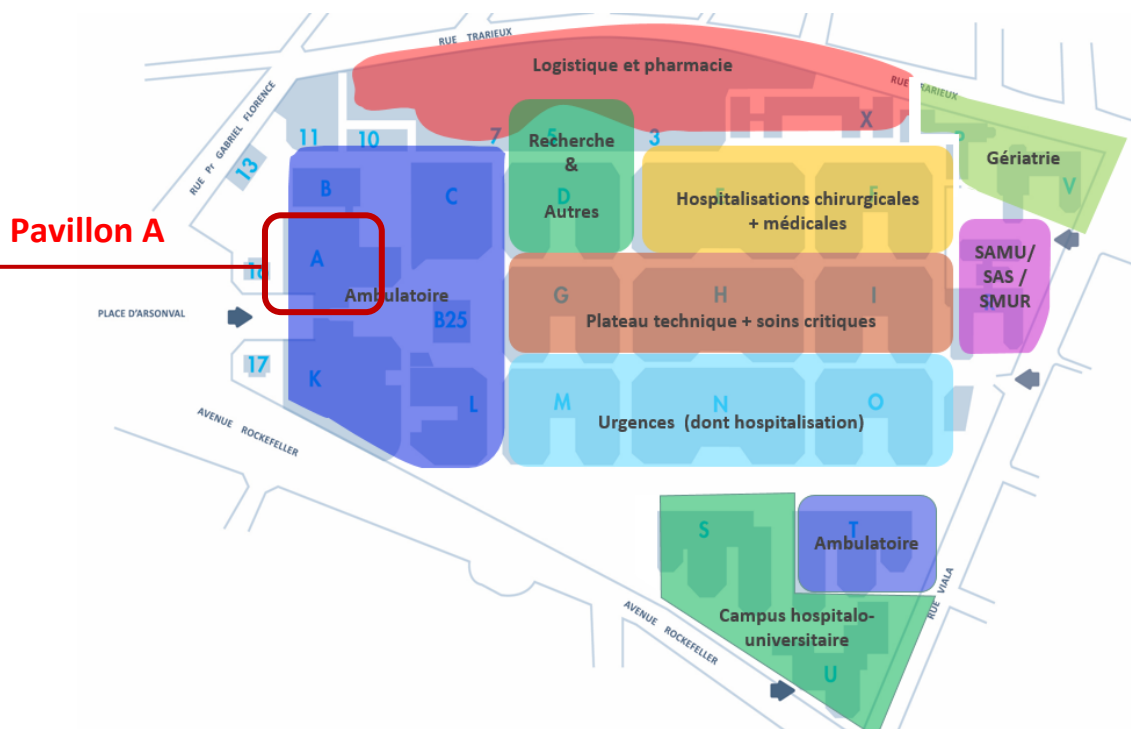

L'objet de la présente consultation est la désignation d'une équipe de maîtrise d'œuvre en vue des concevoir et diriger l'exécution des travaux de **réaménagement des abords** des **pavillons A-JK** (entrée ARSONVAL) d'une part et du **pavillon G** d'autre part.

Chacun de ces ouvrages est étroitement lié à une opération de travaux du pavillon concerné :

- **Pavillon A** : accueil d'activités ambulatoires
- **Pavillon G** : RDC définitif

Les zones concernées par les réaménagements sont proches mais non contigües. Par ailleurs, le bâtiment 25, regroupant l'accueil administratif de l'essentiel des unités, est amené à être démoli à moyen terme.

Ainsi, l'attention du maître d'œuvre est attirée sur le fait qu'il devra maintenir une cohérence globale de la zone centre-ouest du site dans la conception de certaines parties d'ouvrages dont notamment :

- l'éclairage
- la gestion des eaux pluviales
- Les niveaux finis de chaussée et raccordement aux existants

Ainsi, les éléments de mission DIA et AVP de chacune des zones **devront être menés en même temps**. Les éléments de missions postérieurs seront conduits indépendamment selon l'avancement des opérations des pavillons A et G
